

Приложение В

Паспорт испытания естественной

вентиляции

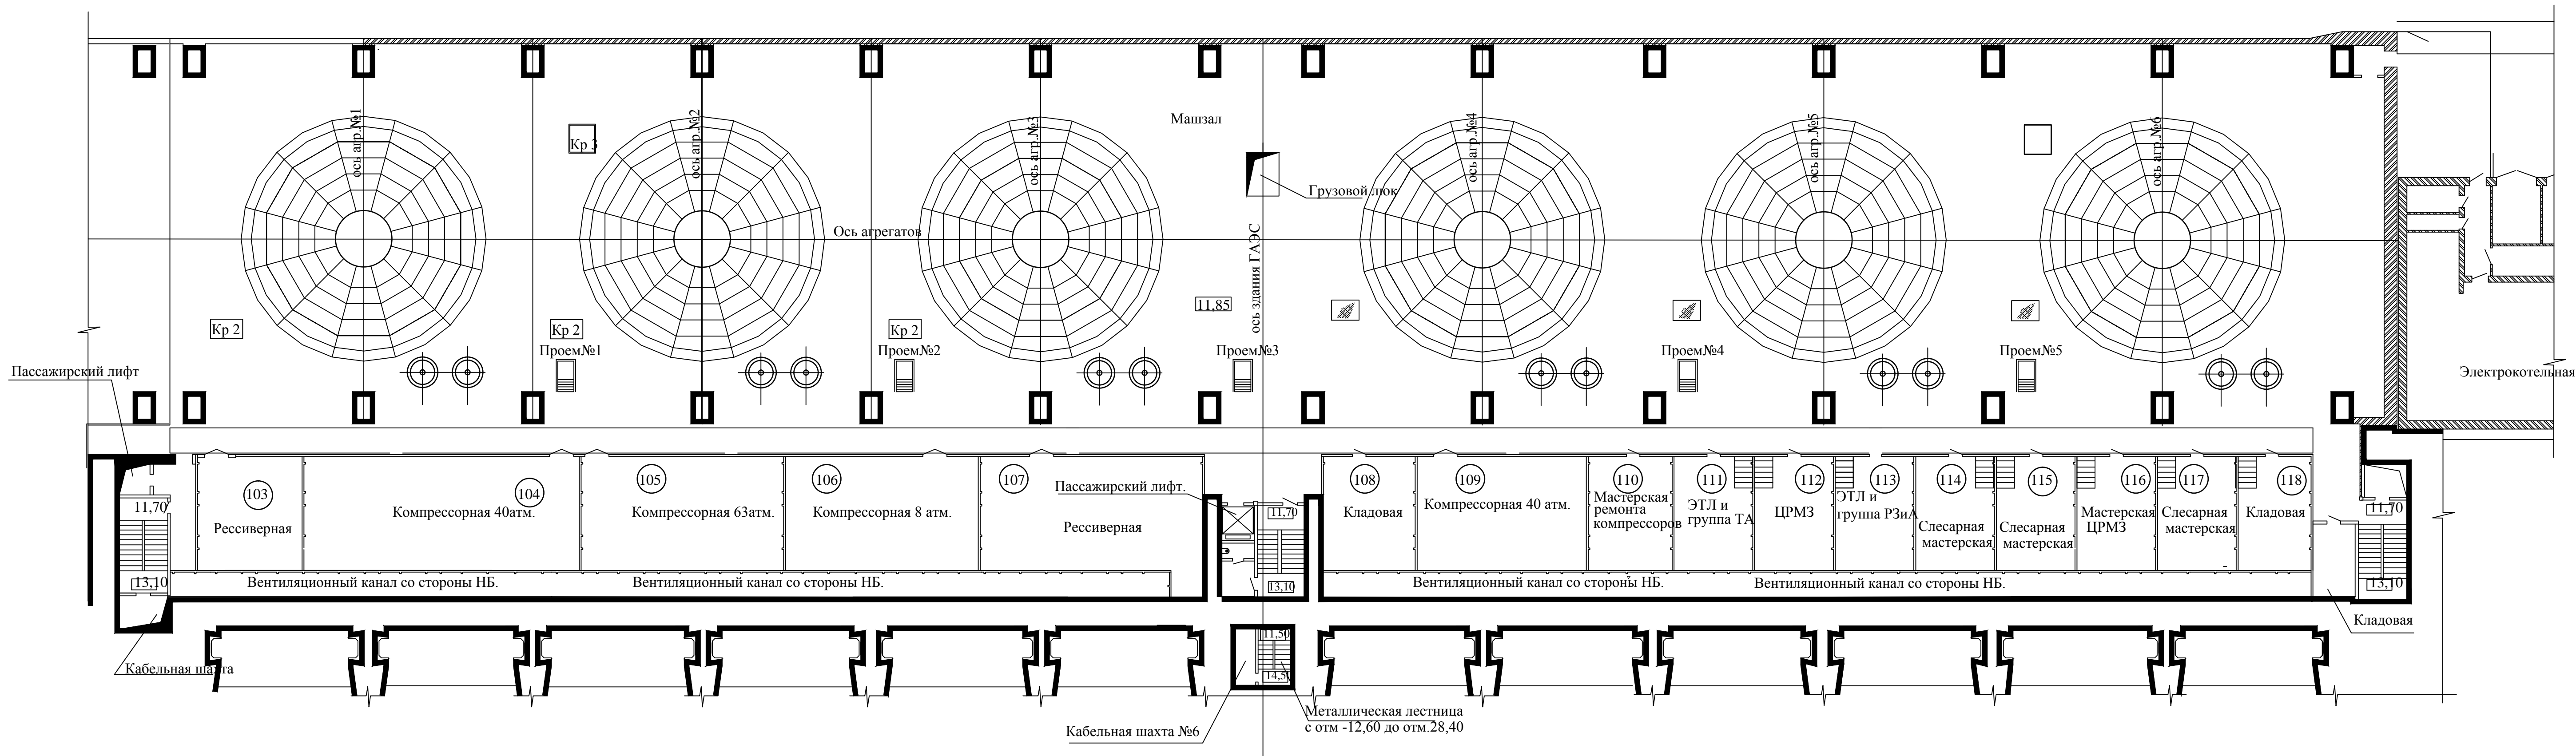
1975.06-24-001.ПЗ.В



Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Результаты испытания естественной вентиляции

№ п/п открытого проёма	№ помещения	Средняя температура наружного воздуха в период испытания, t _{нар} °С	Средняя температура в рабочей зоне в период испытания, t _{р.з.} °С	Расстояние от оси проёма до пола, l, м	Площадь отверстия, S, кв.м	Средняя скорость воздуха в отверстии, v, м/с	Средняя температура воздуха в отверстии, t _о °С	Плотность воздуха, ρ, кг/куб.м	Расход воздуха Лест		Приток/ Вытяжка (нужное указать)
									куб.м/с	кг/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
отм. 11,85											
Пр1	Сеция 2 г.а	+3	+21	0	2x1	0,7	+22,9	1,193	1,40	1,1735	П (от 6,1 на 11,85)
Пр2	Сеция 3 г.а	+3	+21	0	2x1	0,3	+24	1,189	0,60	0,5048	П (от 6,1 на 11,85)
Пр3	Сеция 4 г.а	+3	+21	0	2x1	1,0	+26	1,181	2,00	1,6941	П (от 6,1 на 11,85)
Пр4	Сеция 5 г.а	+3	+21	0	2x1	0,5	+24	1,189	1,00	0,8414	П (от 6,1 на 11,85)
Пр5	Сеция 6 г.а	+3	+21	0	2x1	0,5	+26	1,181	1,00	0,847	П (от 6,1 на 11,85)

ПЛАН на отм.11,85
М 1:200



						1975.06-24-001.ПЗ.В				
						Загорская ГАЭС. Проект реконструкции вентсистем здания ГАЭС, СПК, водоприемника. Предпроектное обследование.				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Основные гидротехнические сооружения и здания Загорской ГАЭС	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.			Егоров В.В.		15.11.15					
Пров.			Безбородов А.Д.		15.11.15			2	2	
Нач. отд.			Миненков А.В.		15.11.15					
						Приложение В. Результаты испытания естественной вентиляции. Здание ГАЭС. План на отм. 11,85		ООО "Северус" г.Санкт-Петербург		
Н. контр.						Безбородов А.Д.		
