

Акт осмотра Объекта

Кочубеевское с

28 мая 2026 г.

1. Комиссия в составе:

Заместитель директора, Якимов И.А.	(должность, фамилия, инициалы)
Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации, Колесников Е.А.	(должность, фамилия, инициалы)
Руководитель группы строительства и капитальных ремонтов ОКСиЭ, Островская С.П.	(должность, фамилия, инициалы)
Главный специалист отдела капитального строительства и эксплуатации, Лейченко В.А.	(должность, фамилия, инициалы)
Руководитель группы текущих ремонтов ОКСиЭ, Клундук И.С.	(должность, фамилия, инициалы)
Руководитель направления отдела экономической безопасности и антикоррупционной политики, Чернобай Л.К.	(должность, фамилия, инициалы)
Начальник Ставропольского почтамта, Гавриленкова Г.А.	(должность, фамилия, инициалы)
Секретарь комиссии Главный специалист отдела капитального строительства и эксплуатации, Ковбаса О.А.	(должность, фамилия, инициалы)
созданная распоряжением распоряжение № 67-р от 27.05.2026г., руководствуясь правилами СНиП, правилами технической эксплуатации инженерного оборудования, документами Ростехнадзора, провела плановый/внеплановый общий/частичный осмотр технического состояния зданий, сооружений, помещений, оборудования и прилегающей к зданию территории по адресу:	
Ставропольский край, р-н Кочубеевский, с Кочубеевское, ул Октябрьской Революции, д 66	
26:15:150731:527	(адрес объекта)
01012094	(кадастровый номер)
	(инвентарный номер)

2. Общие сведения о ремонтируемых помещениях ОПС и здании в котором они расположены

Тип объекта: Помещение;

Год постройки здания, в котором располагаются ремонтируемые помещения ОПС: 1 944;

Этажность здания: 3;

Этажи, на которых располагаются ремонтируемые помещения ОПС: Этаж 1;

Материал наружных стен здания: Кирпич,

их толщина: 510 мм;

Материал перекрытий здания:

этажи: Железобетон;

чердак: Отсутствует.

Система кровли здания (конструктивные особенности, покрытие):

Вид конструкции кровли: Наслонная;

Покрытие кровли: Металл (металлочерепица, профнастил).

Тип фундамента здания: Ленточный сборный.

3. Результаты осмотра с фотофиксацией по каждому из нижеследующих разделов**3.1. Конструктивные элементы****3.1.1 Фундамент**

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:


3.1.2 Цоколь

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:

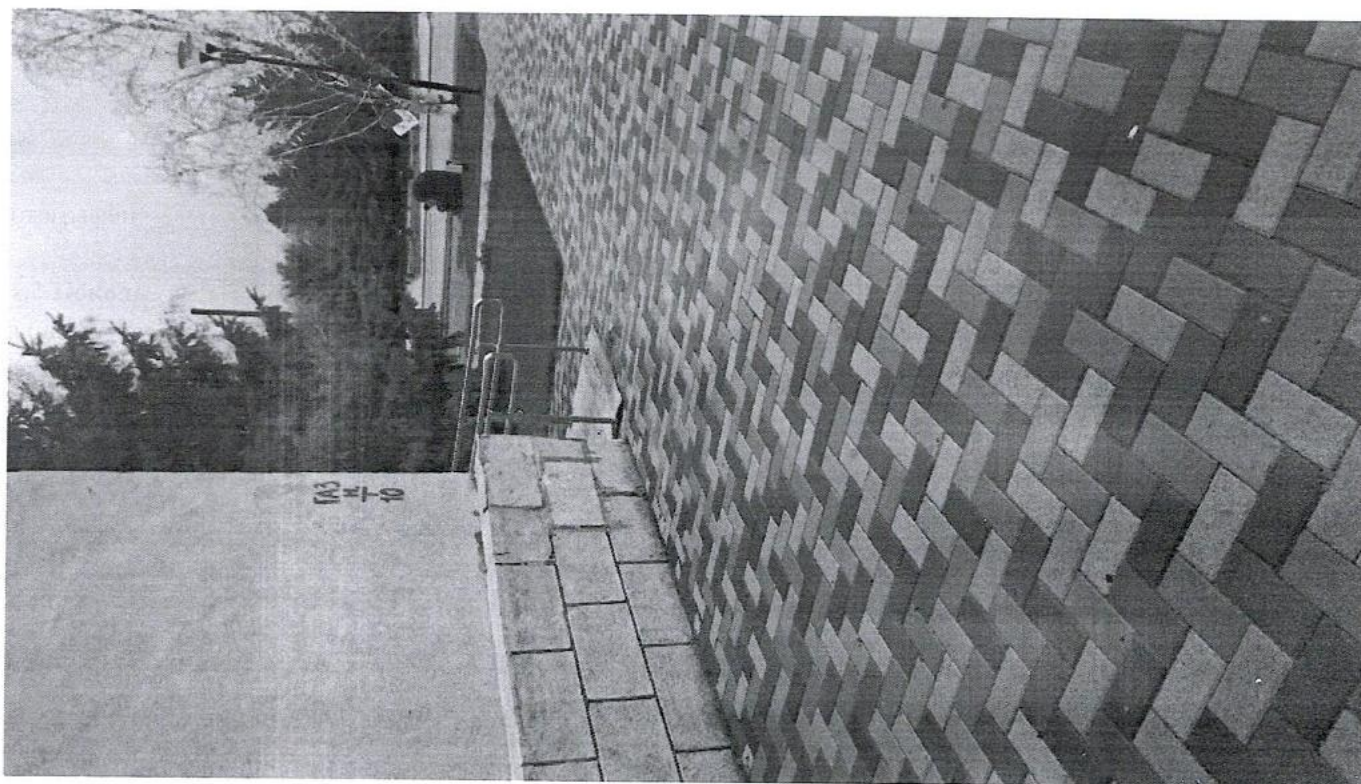

3.1.3 Отмостка

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:



3.1.4 Крыльцо главного входа в отделение почтовой связи

Крыльцо

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:





Козырек крыльца

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Отсутствует

Фотографии:

Ограждение крыльца

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Отсутствует

Фотографии:


3.1.5 Пандус

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:

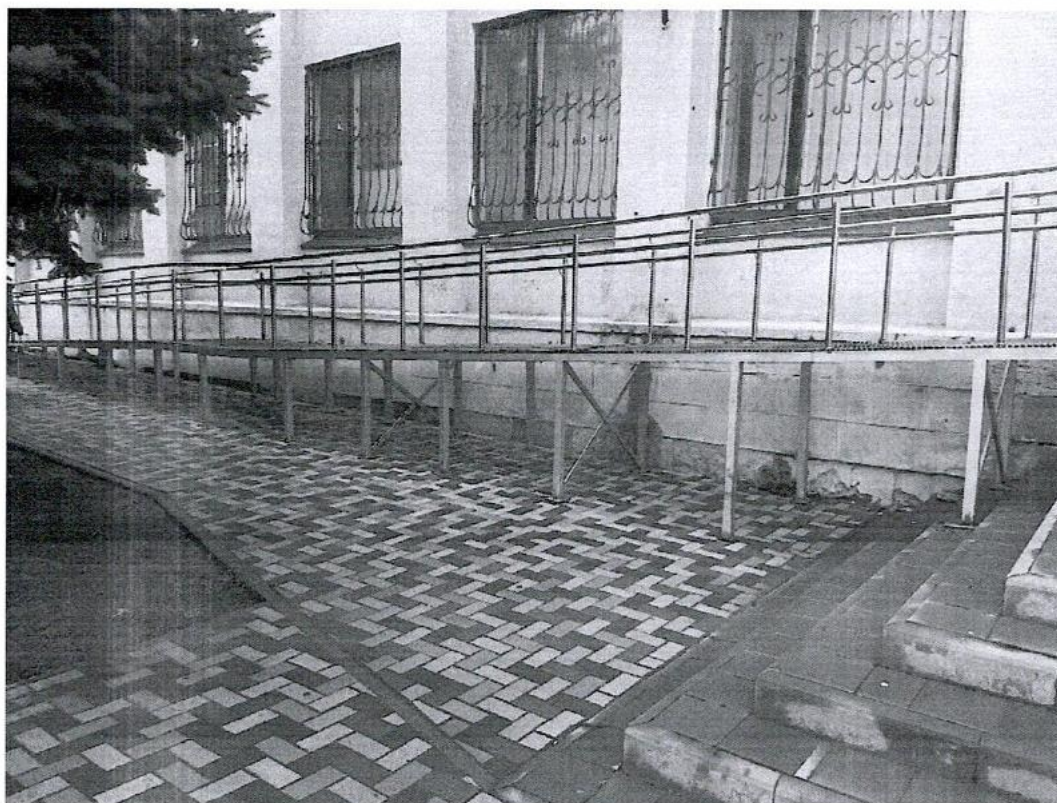

3.1.6 Наружные стены в створе размещения ремонтируемых помещений ОПС

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:

3.1.7 Фасад в створе размещения ремонтируемых помещений ОПС

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:



3.1.8 Перекрытия (межэтажные) за исключением кровли

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:

3.1.9 Кровля

Стропильная система

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Отсутствует

Фотографии:

Кровля (кровельный материал)

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:



Система водостока

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:



3.1.10 Окна и балконные двери


Окна


Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

Решение по ремонту: Выполнить работы по замене существующих окон, включая установку оконных отливов, подоконников, ремонт откосов со стороны помещения и со стороны улицы

Фотографии:

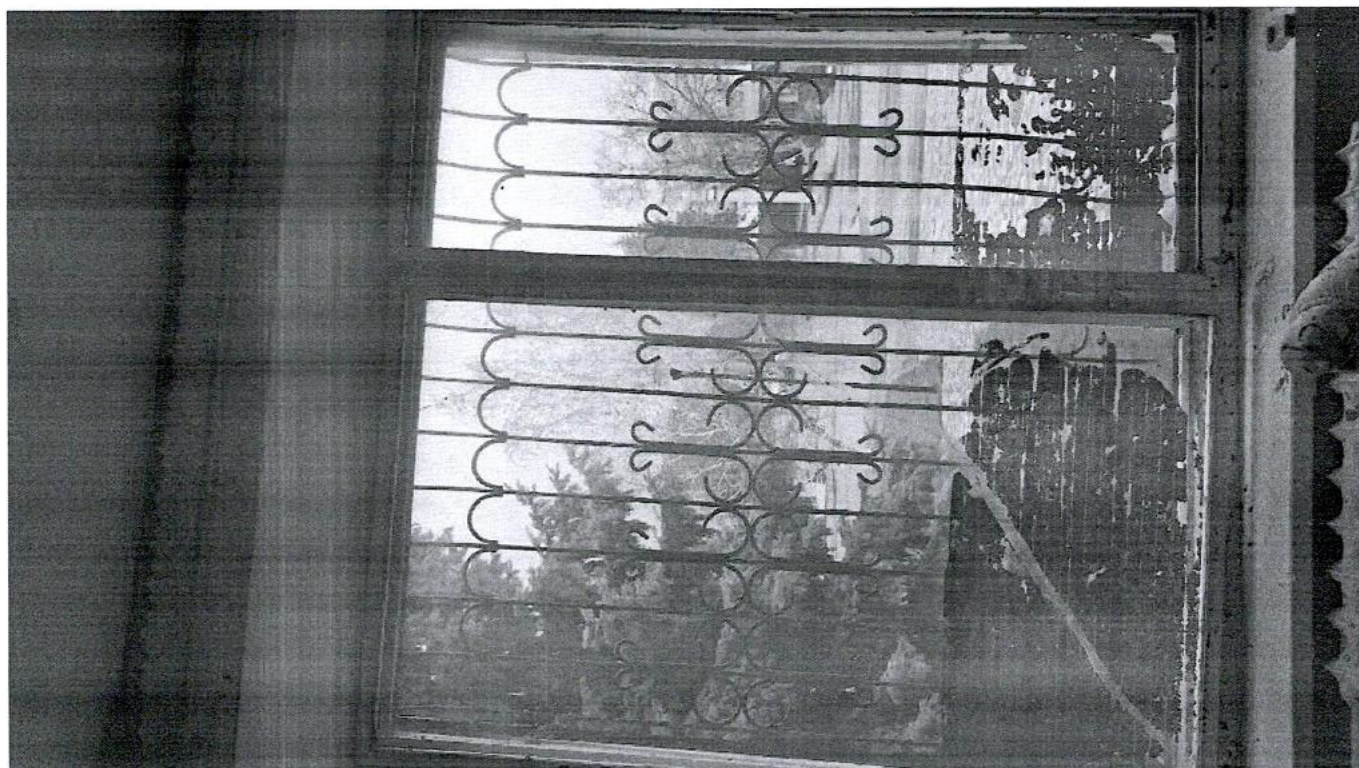

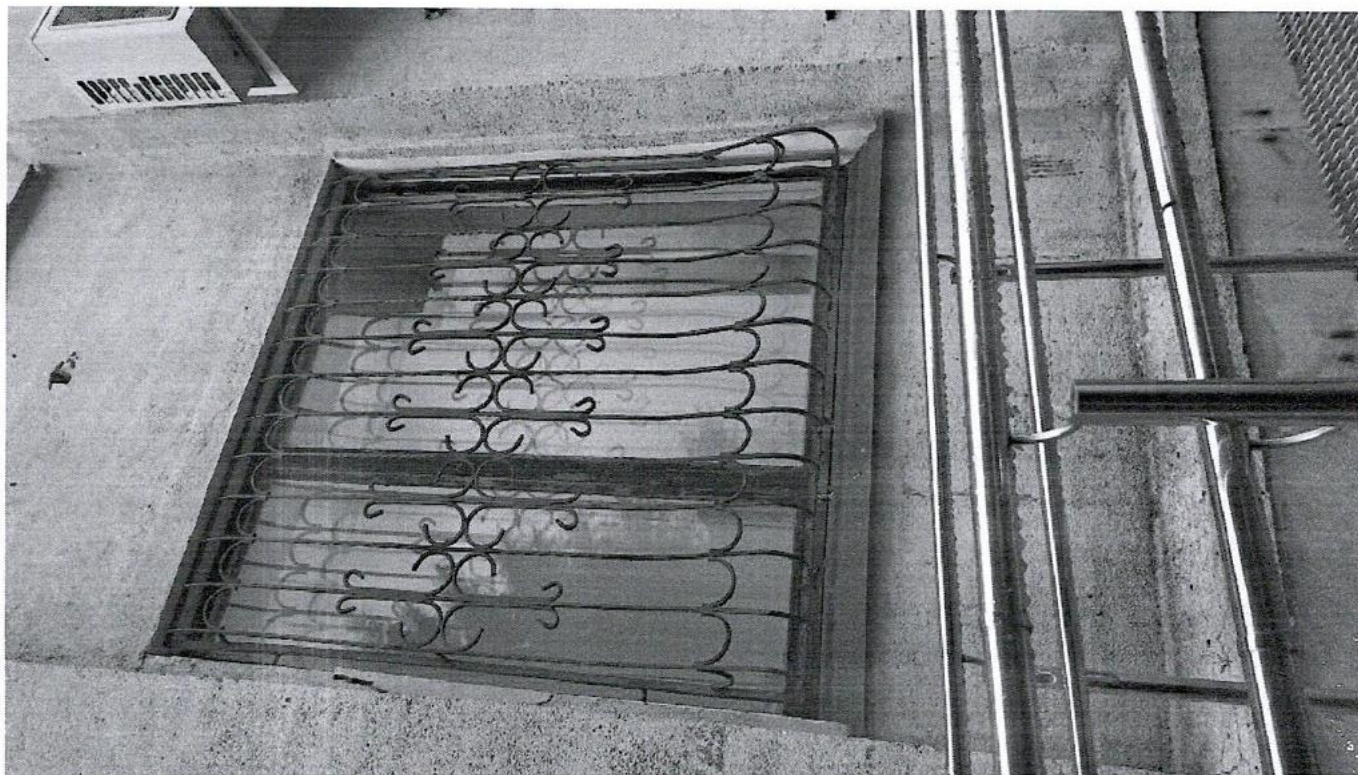

Решетки


Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы по исправлению локальных дефектов решеток

Фотографии:



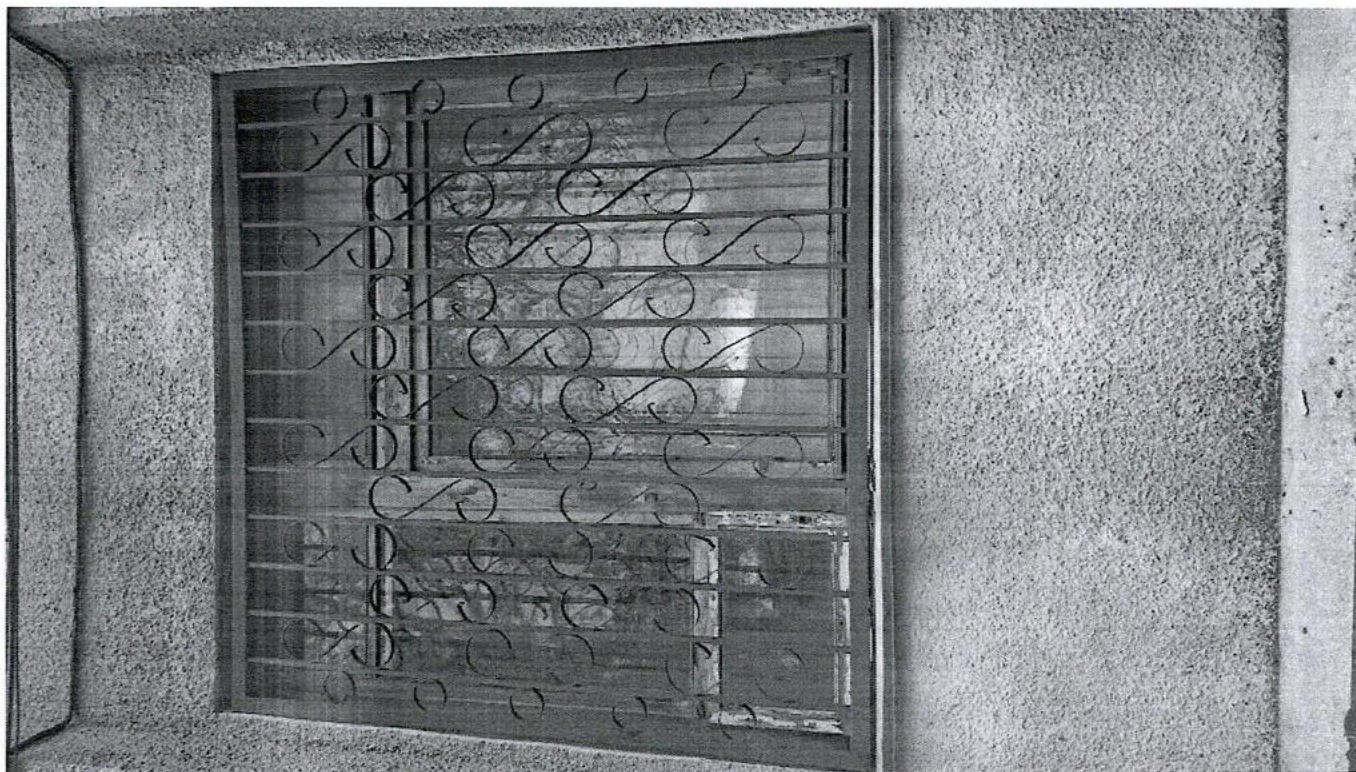

Рольставни

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Выполнить работы по устройству рольставней (с учетом требований, указанных в ТЗ)

Фотографии:



3.1.11 Наружные двери



Дверь центрального входа (в т.ч. тамбурная)

Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

Решение по ремонту: Выполнить работы по замене существующей двери центрального входа (с учетом требований, указанных в ТЗ)

Фотографии:

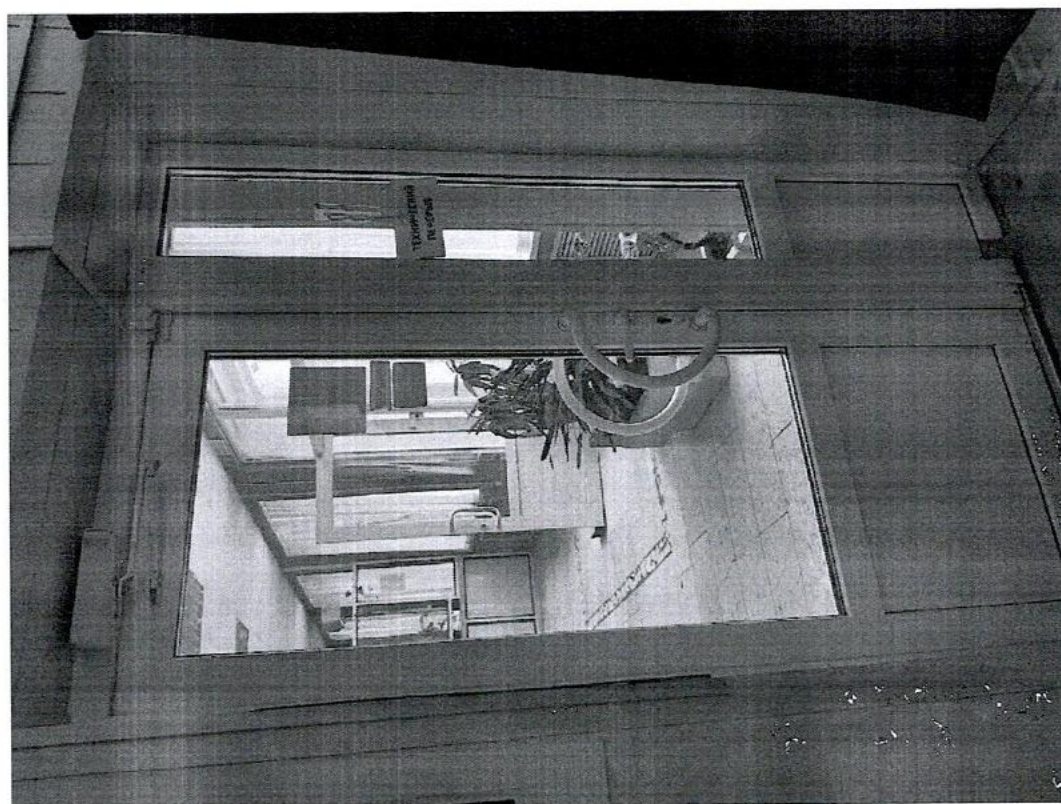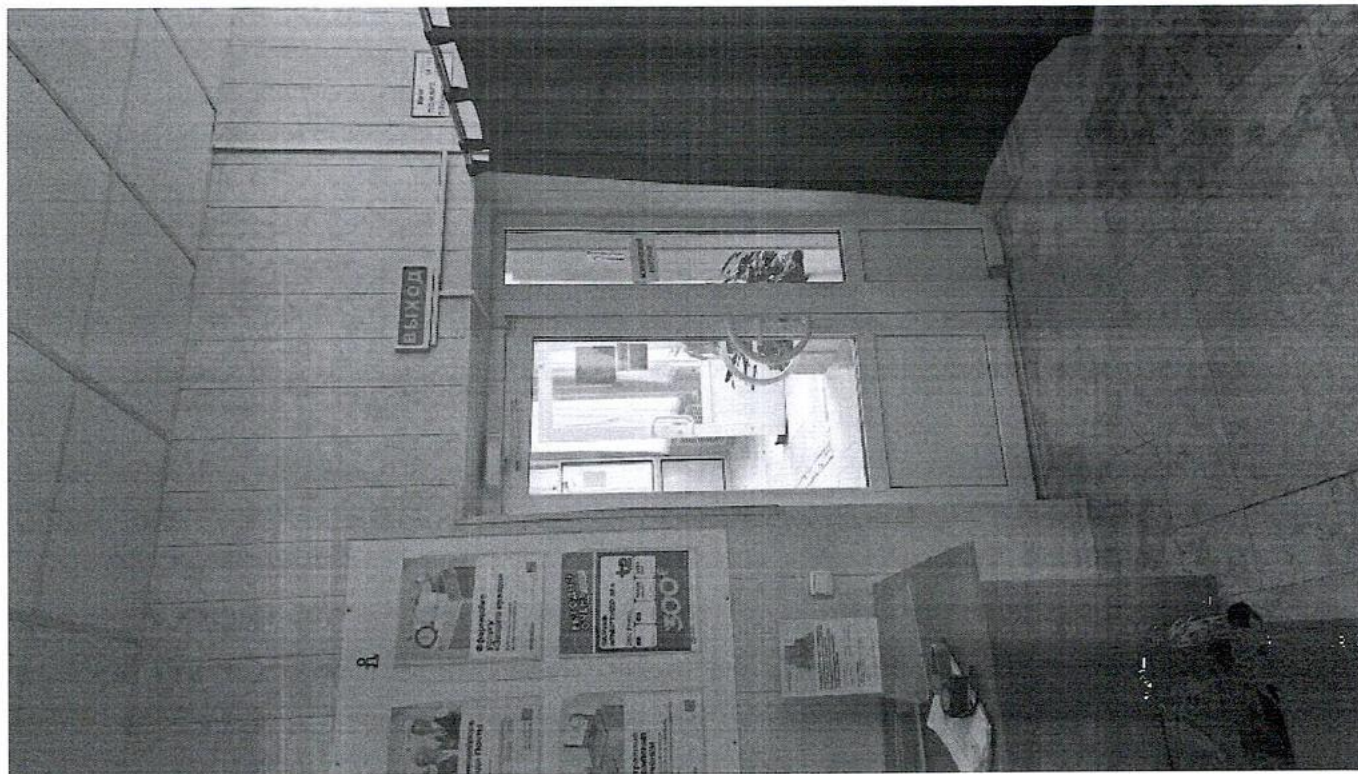

Наружные двери (кроме двери главного входа)

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Отсутствует

Фотографии:

3.1.12 Тамбуры

Тамбурные конструкции, пристроенные к главному входу

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Отсутствует

Фотографии:

Тамбуры внутри помещений

Наличие: Нет

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Отсутствует

Фотографии:


3.1.13 Элементы отделки

Полы (финишное покрытие полов)

Наличие дефектов: Да

Решение по ремонту: Выполнить работы по полной замене существующего финишного покрытия пола (с учетом требований, указанных в ТЗ)

Фотографии:

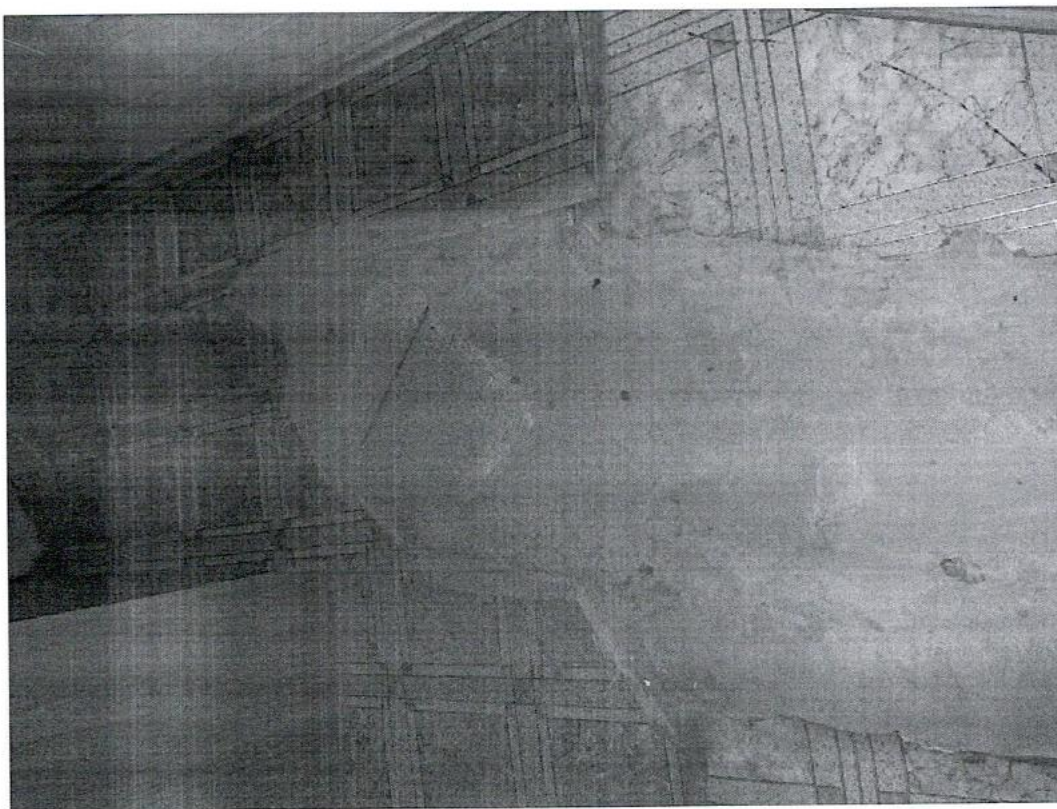





Отделка потолков

Наличие дефектов: Да

Решение по ремонту: Выполнить работы по полной замене существующей финишной отделке потолка (с учетом требований, указанных в ТЗ)

Фотографии:

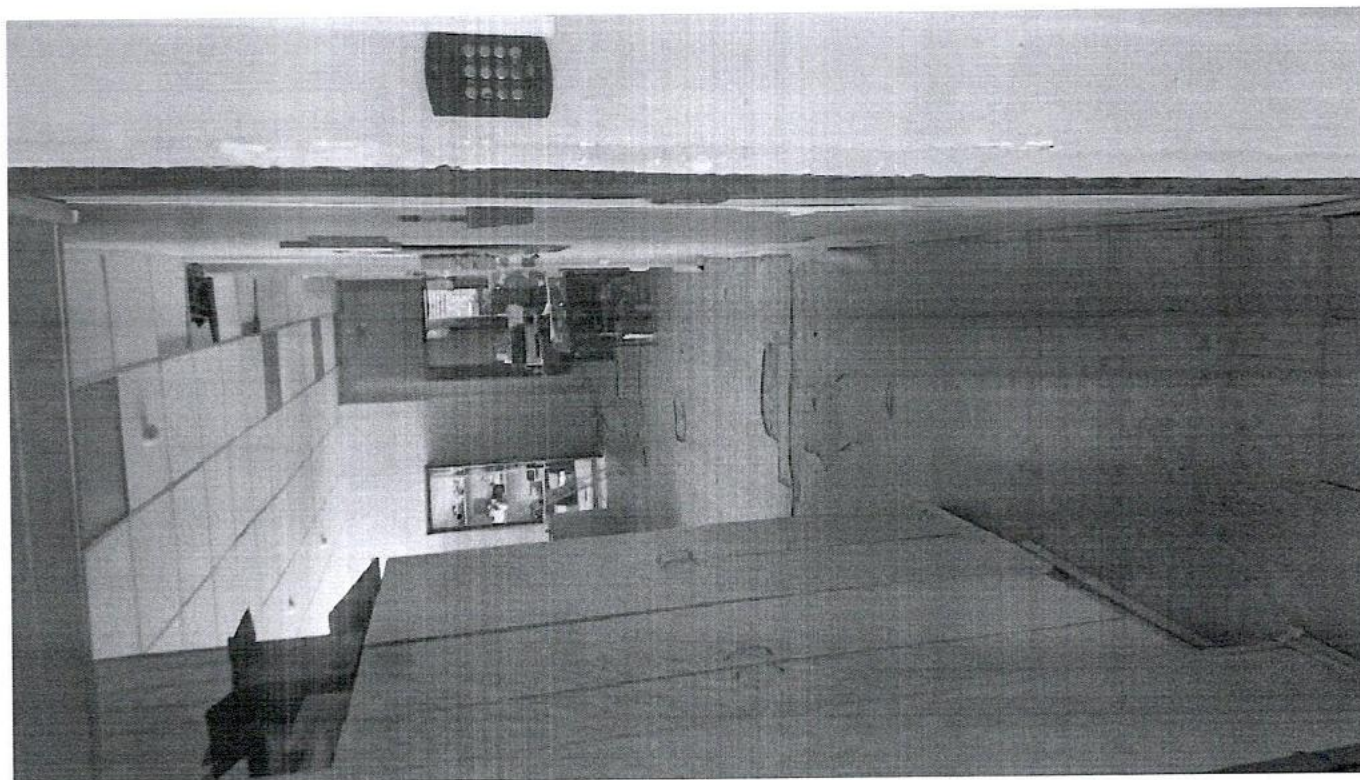

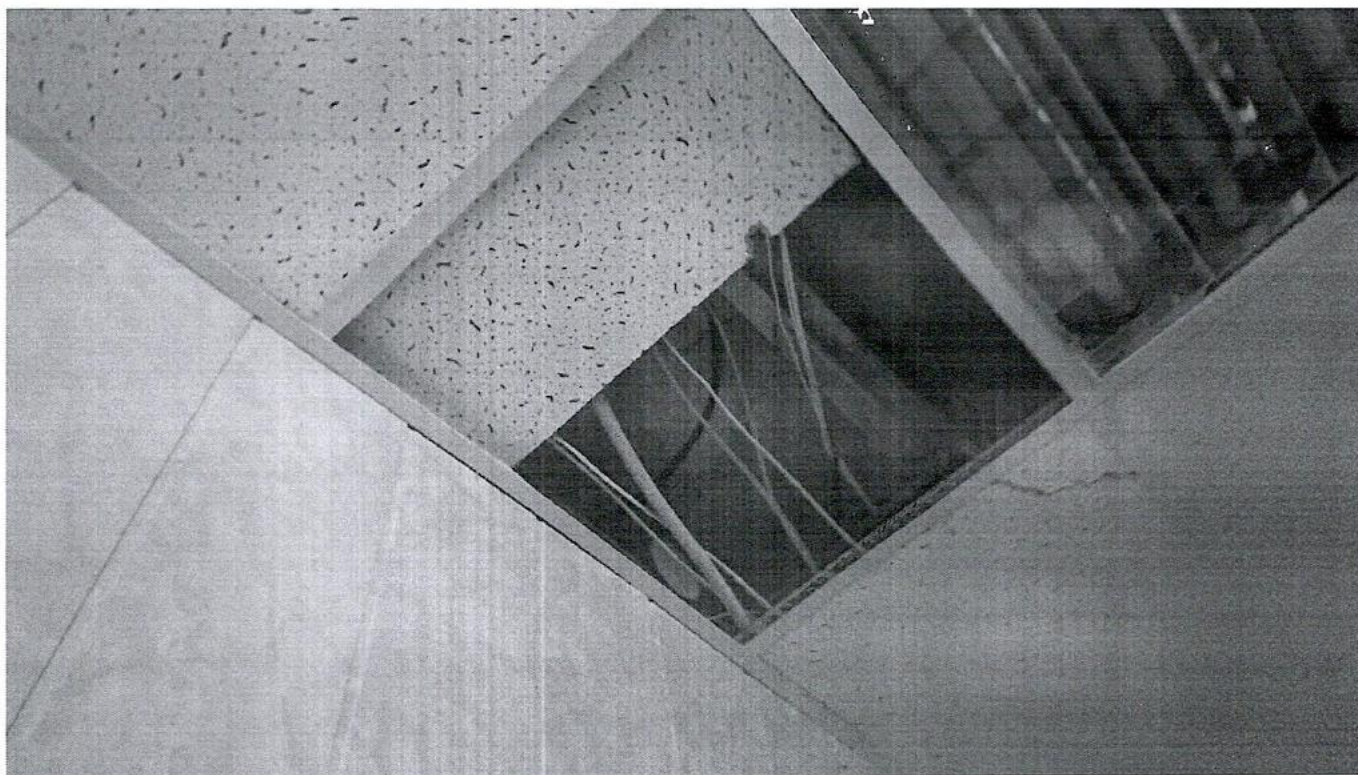


Внутренние двери


Наличие: Да

Наличие дефектов: Да

Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с полной заменой внутренних дверей (с учетом требований, указанных в ТЗ)

Фотографии:

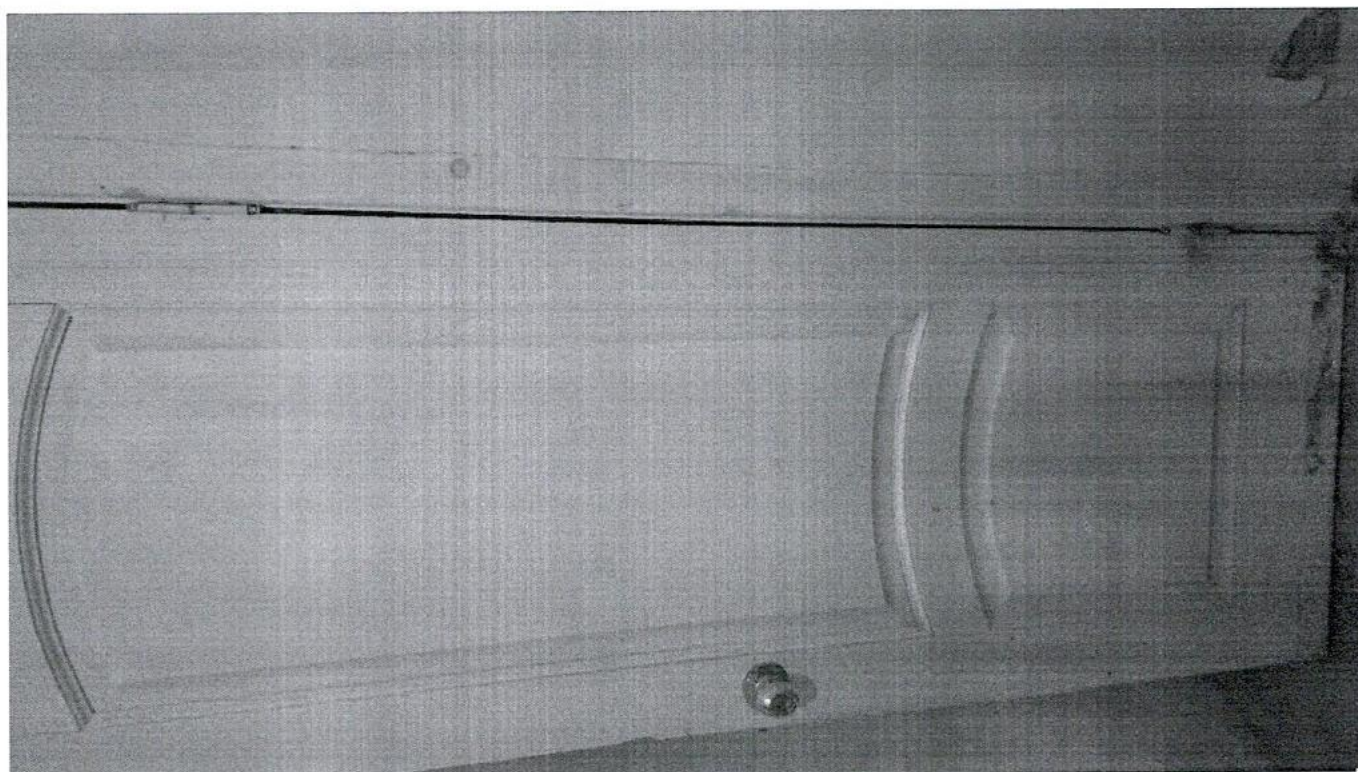

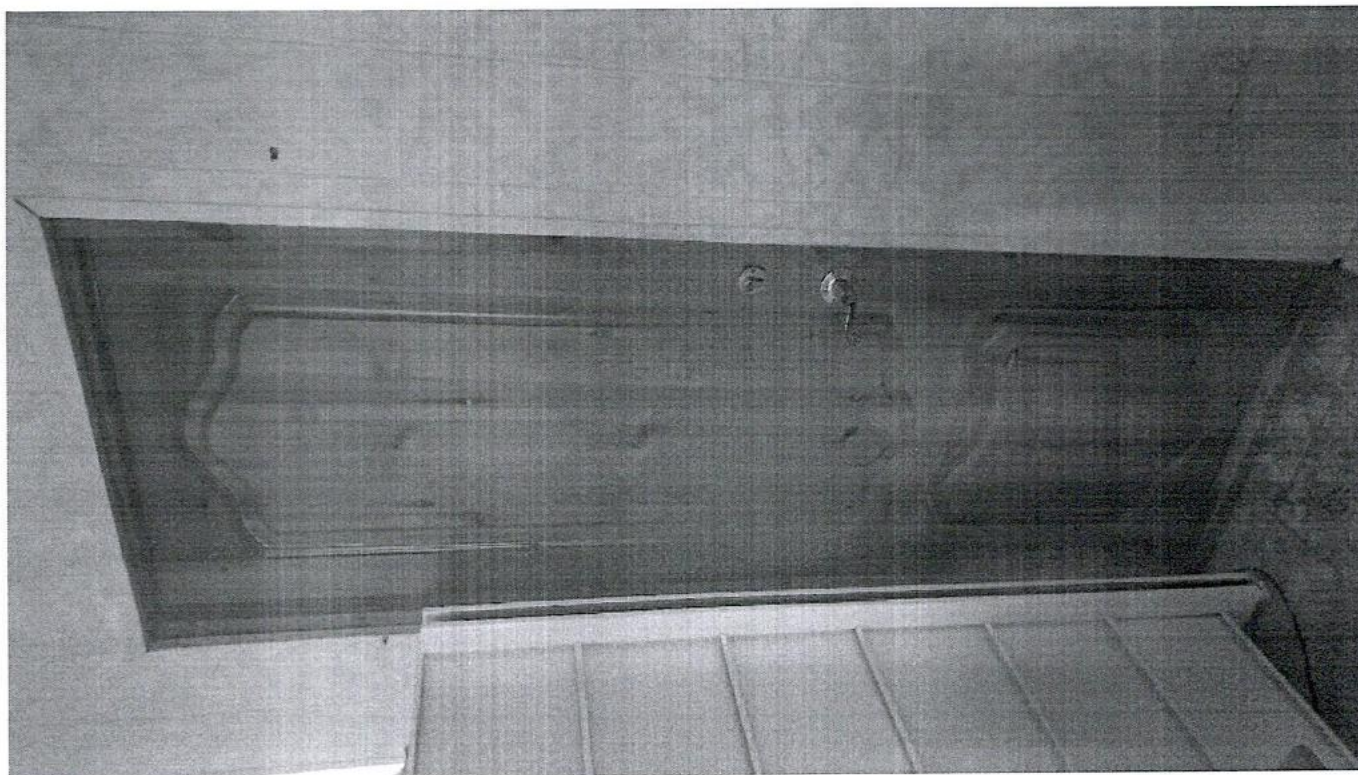

3.1.14 Благоустройство

Тротуары, проходы, площадка у входа в ОПС

Наличие: Да

Наличие дефектов: Нет

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:


3.2. Инженерные системы

3.2.1 Точка ввода сети электроснабжения

Выделенная мощность по электроэнергии, кВт: 15

Решение по ремонту: Не требуется выделение дополнительной мощности

Фотографии:

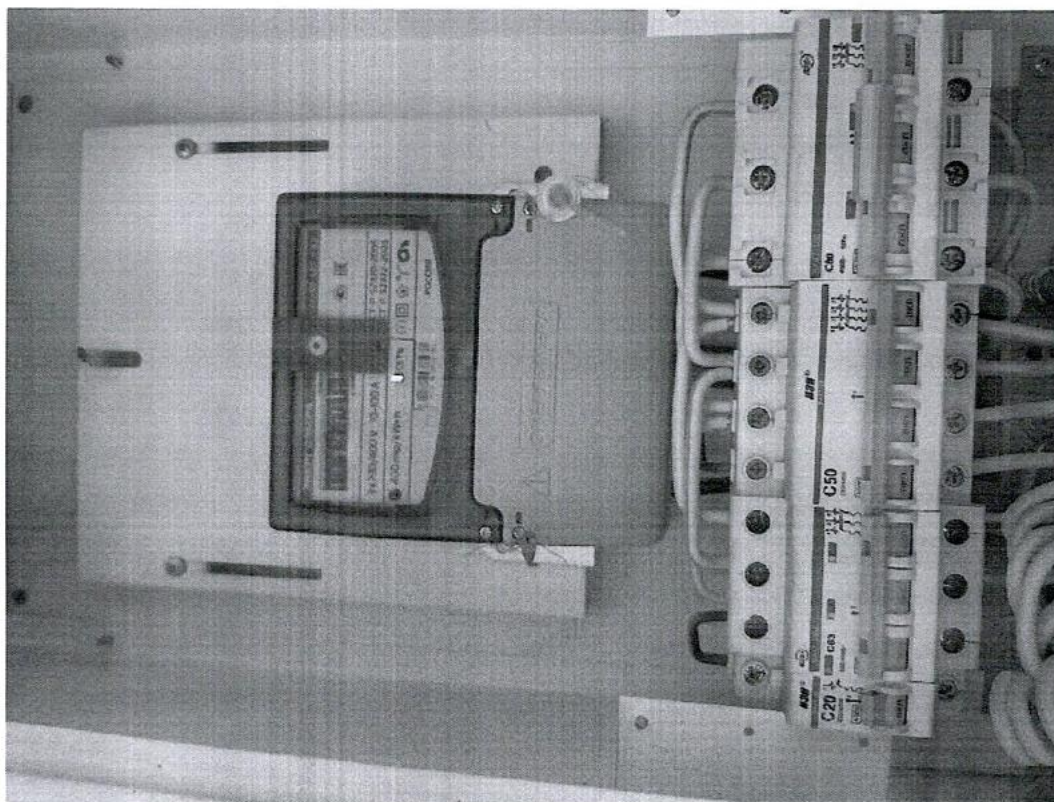

3.2.2 Точки ввода ХВС/ГВС (Внутренние сети водоснабжения)


ХВС


Наличие: Да

Тип подключения: Центральное

Решение по ремонту: Изменение существующего подключения не требуется: только ремонт/замена внутренних сетей

Фотографии:

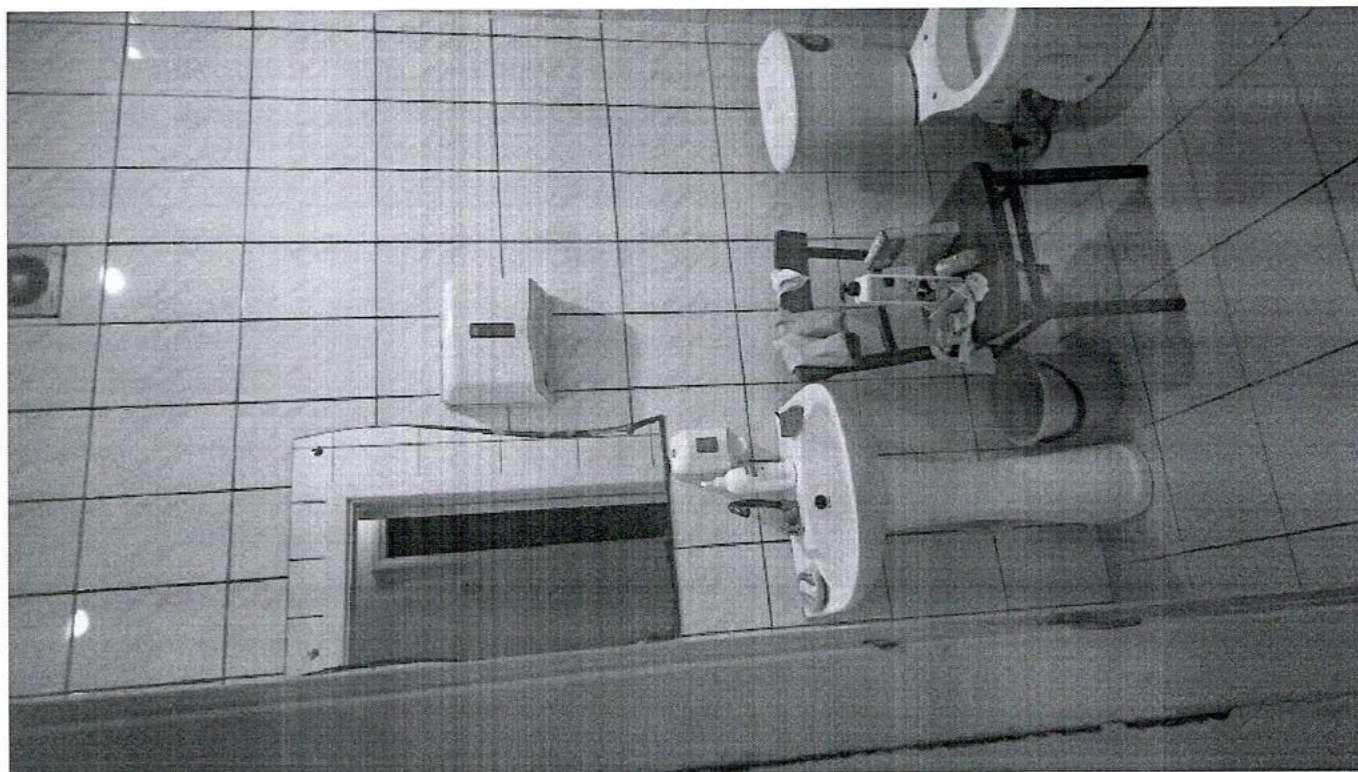

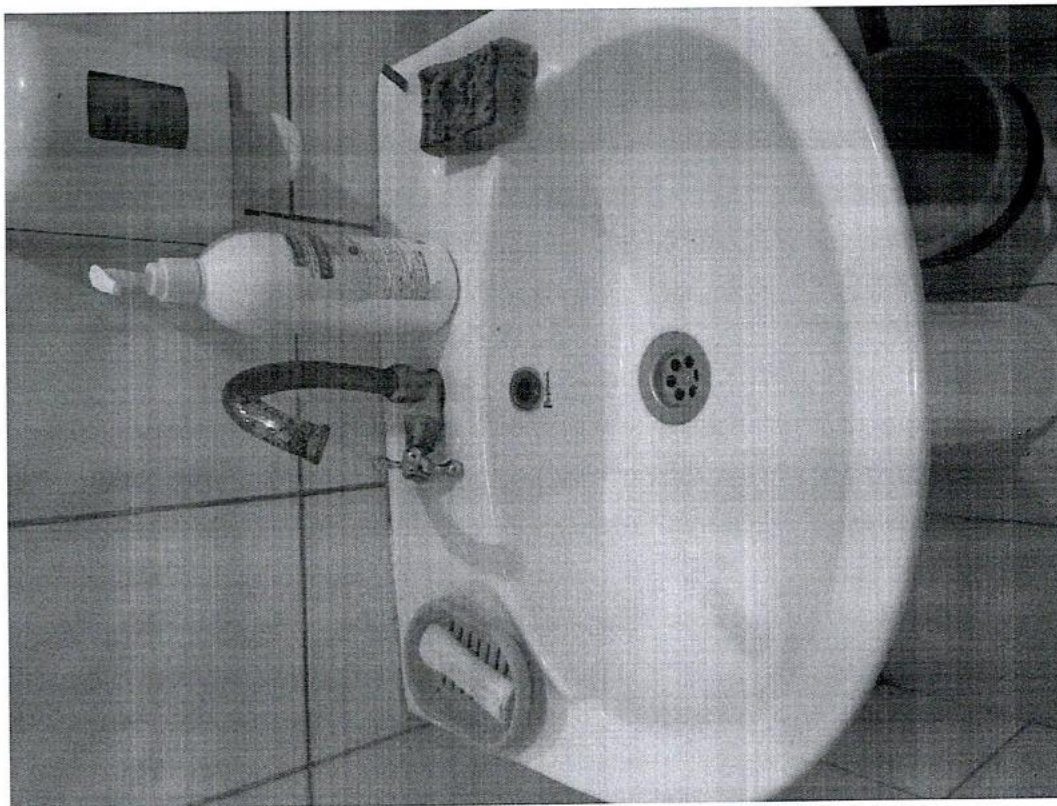


ГВС

Наличие: Нет

Возможность подключения к центральным сетям: Нет

Решение по ремонту: Требуется устройство накопительного водонагревателя

Фотографии:

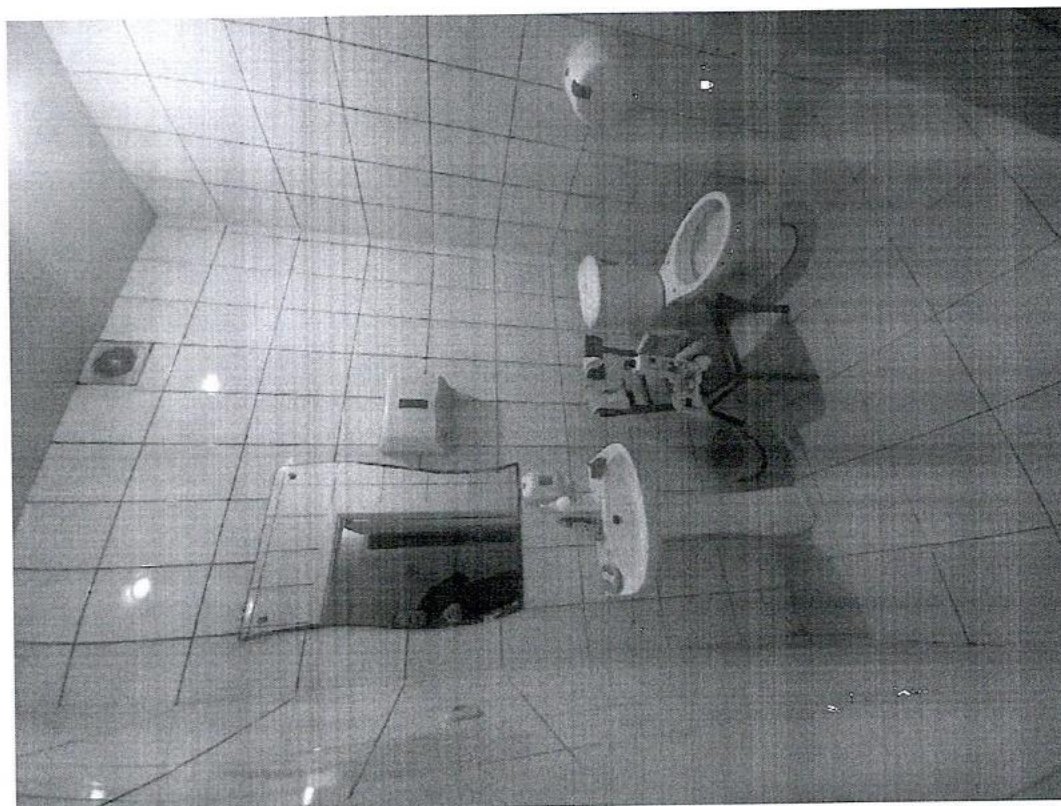



3.2.3 Теплоснабжение (отопление)

Тип теплоснабжения (отопления)

Тип подключения: Центральное

Решение по ремонту: Изменение существующего подключения не требуется: только ремонт/замена сетей и оборудования

Фотографии:

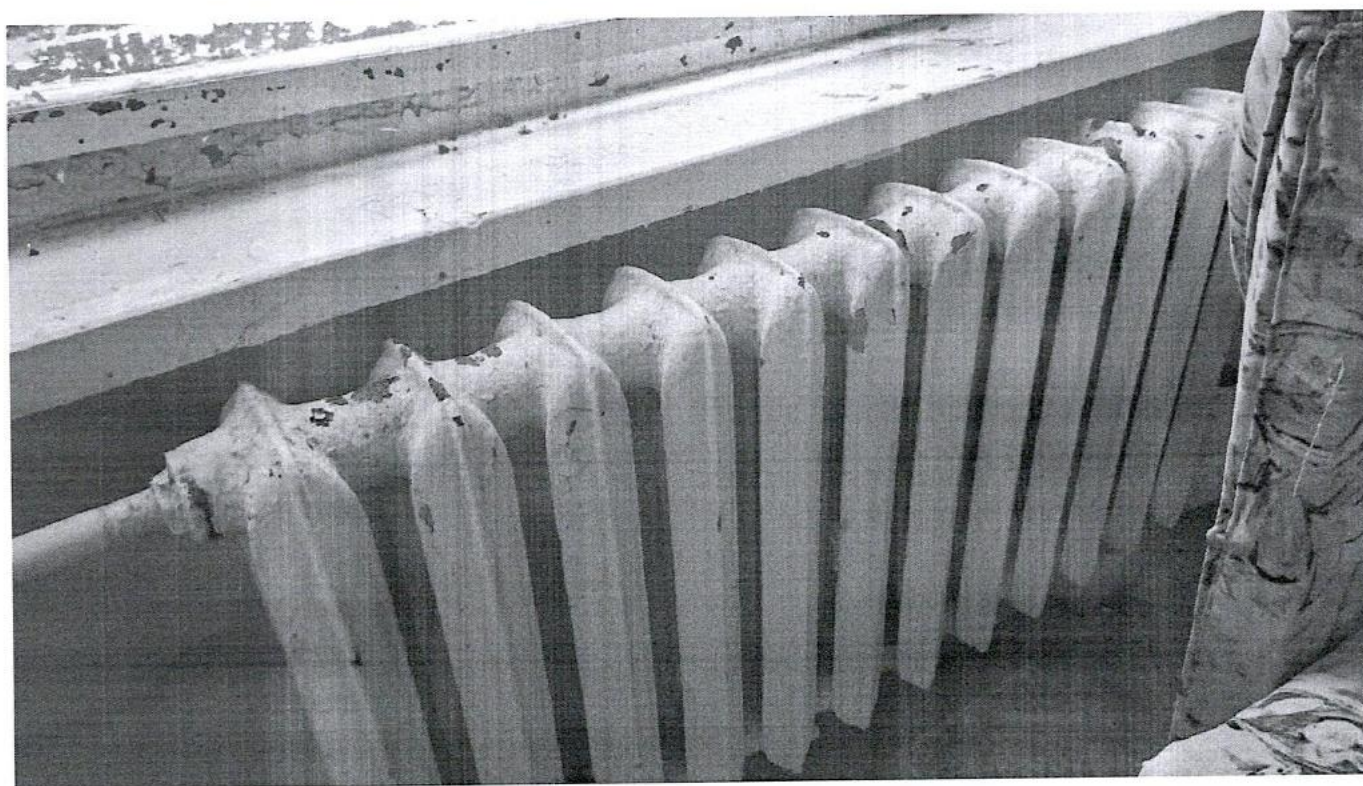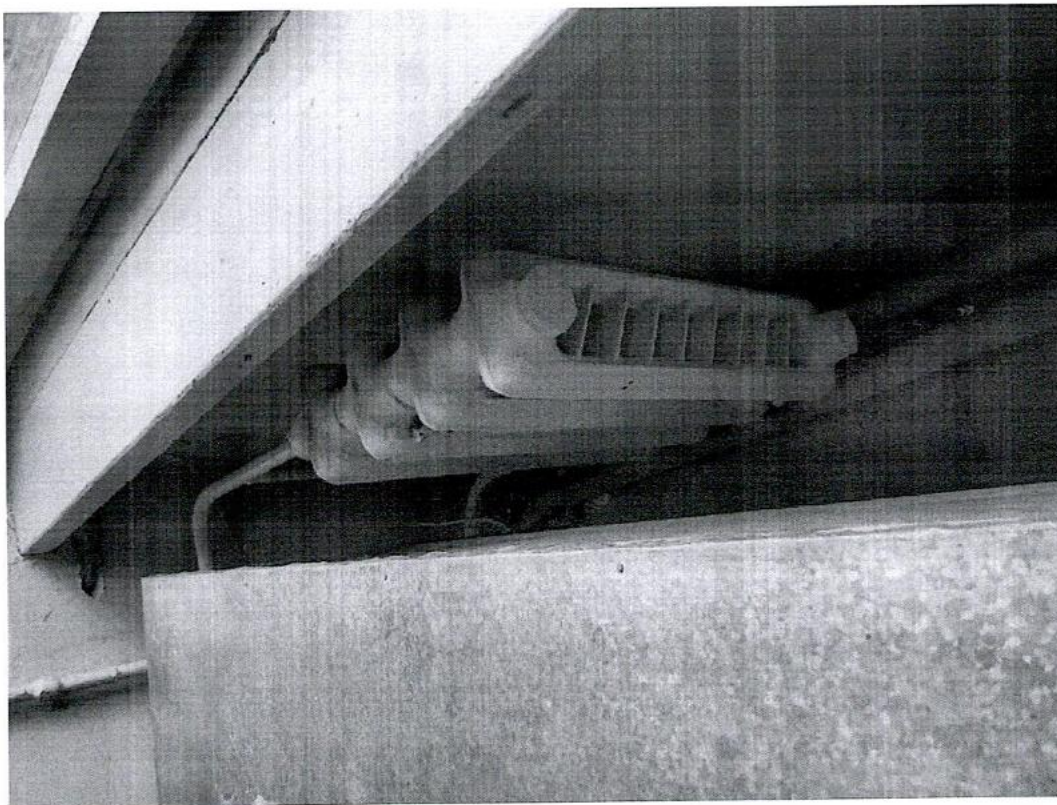


Приборы отопления

Наличие: Нет

Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с сохранением и локальным ремонтом существующих приборов отопления

Фотографии:

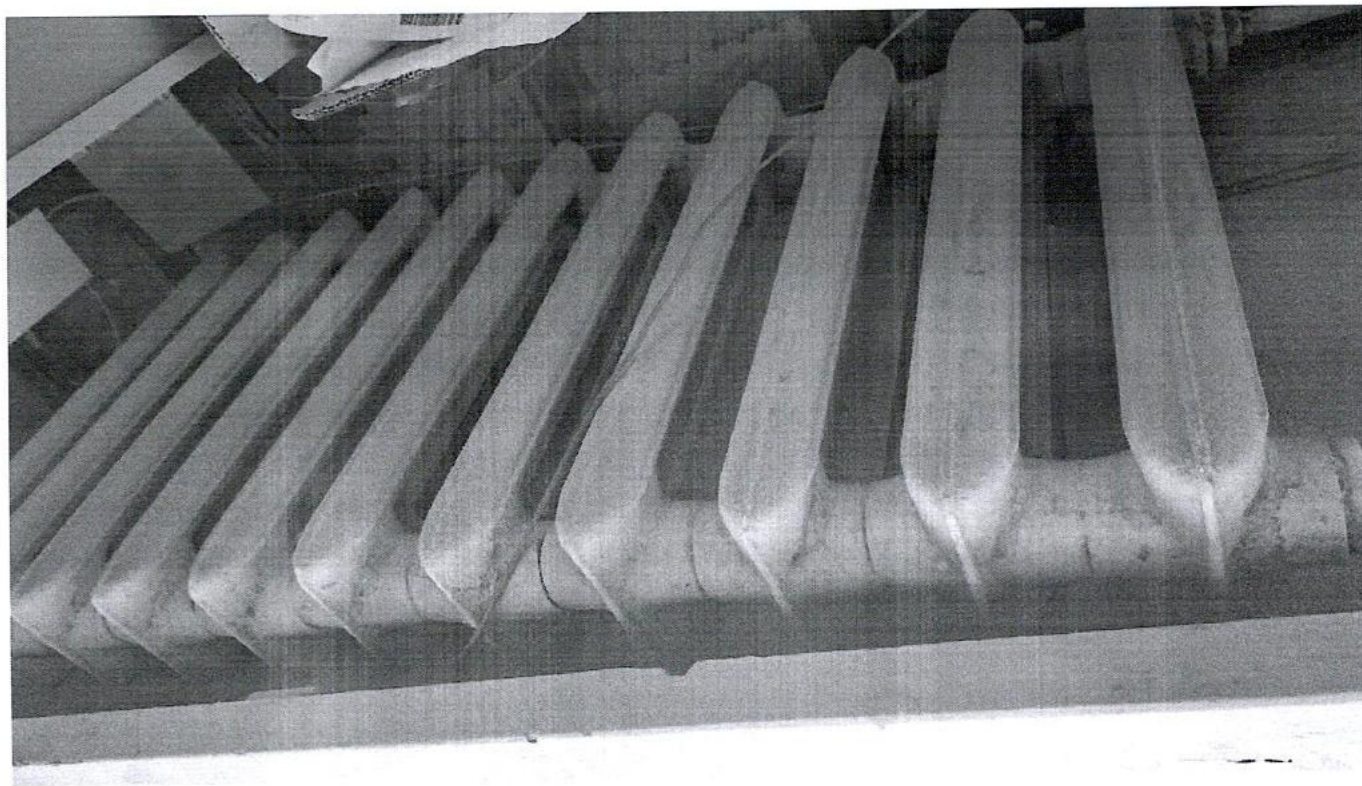

3.2.4 Хозяйственно-бытовая канализация


Система канализации

Наличие: Да

Тип подключения: Центральное

Решение по ремонту: Изменение существующего подключения не требуется: только ремонт/замена внутренних сетей

Фотографии:

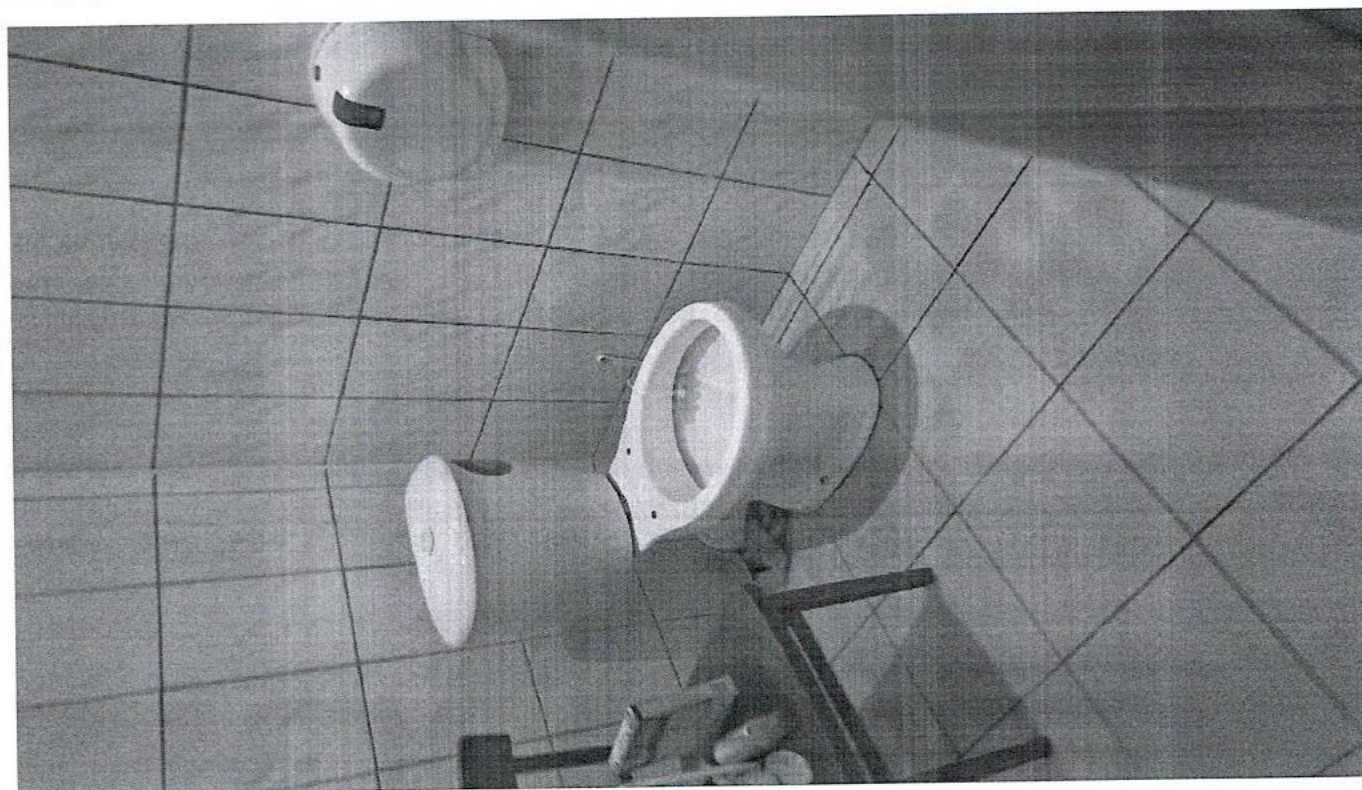


Сан. узел

Наличие: Да

Решение по ремонту: Ремонтные работы не требуются

Фотографии:

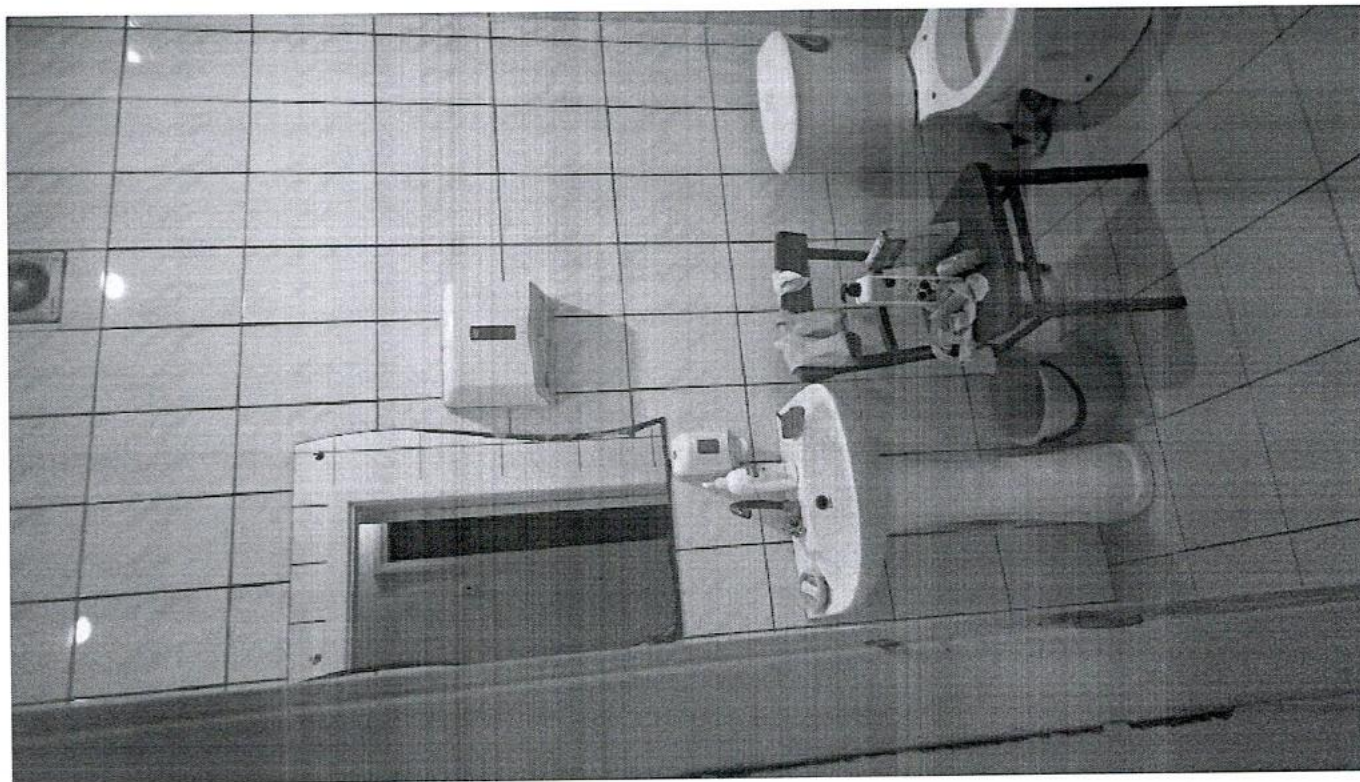


3.2.5 Кондиционирование


Наличие в ремонтируемых помещениях: Да

Наличие дефектов: Полностью или частично неисправно

Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с полной заменой (установкой новых) приборов кондиционирования (с учетом требований, указанных в ТЗ)

Фотографии:

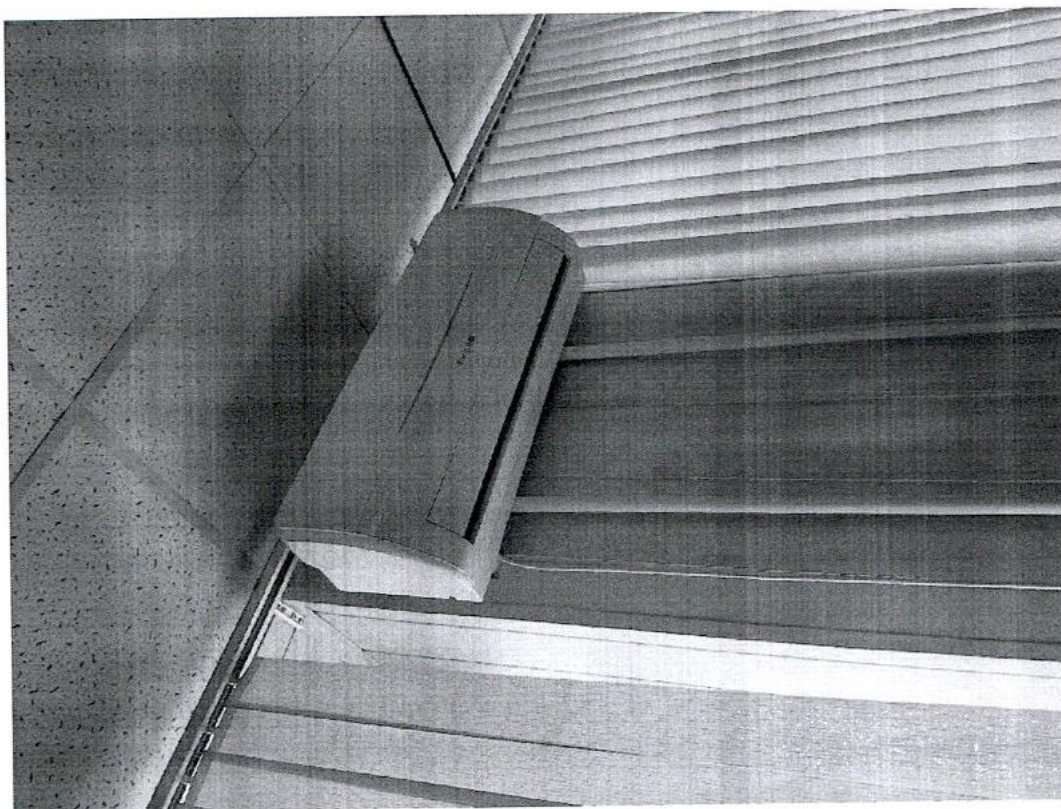

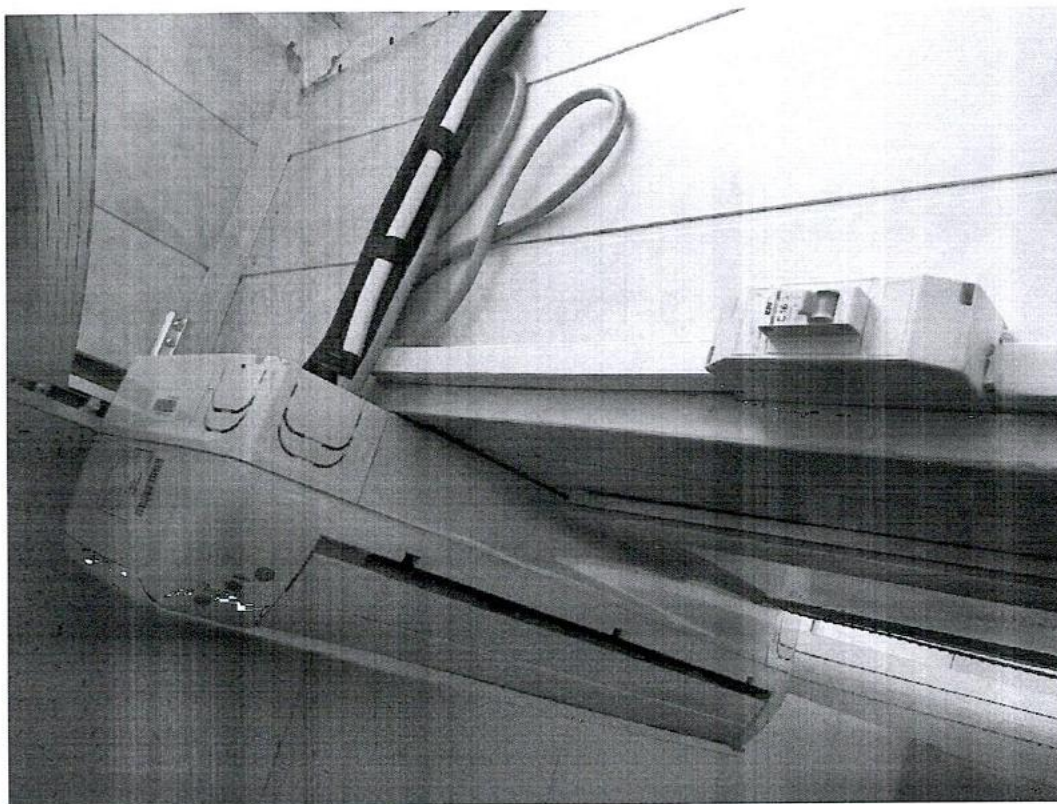


3.2.6 Тепловые завесы

Наличие в ремонтируемых помещениях: Нет

Решение по ремонту: Выполнить ремонтные работы с полной заменой (установкой новых) тепловых завес (с учетом требований, указанных в ТЗ)





Фотографии:

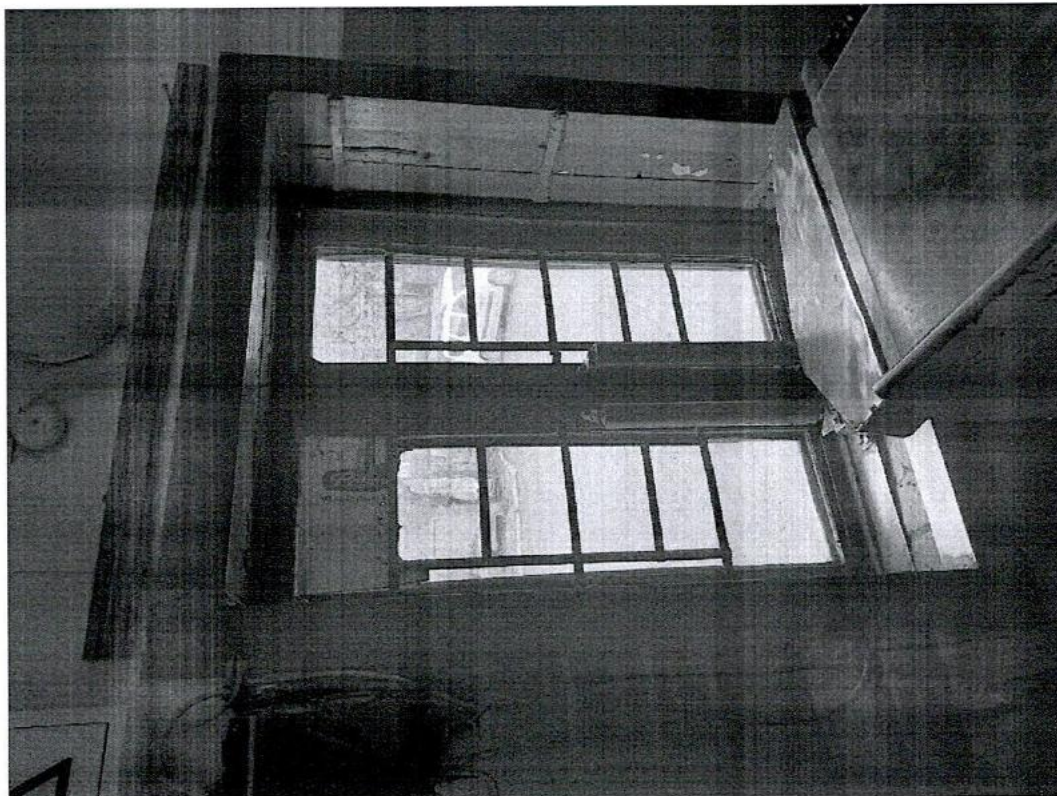

Заместитель директора
(должность)


(подпись)

Якимов И.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела капитального строительства и эксплуатации (должность)	 (подпись)	Колесников Е.А. (расшифровка подписи)
Руководитель группы строительства и капитальных ремонтов ОКСиЭ (должность)	 (подпись)	Островская С.П. (расшифровка подписи)
Главный специалист отдела капитального строительства и эксплуатации (должность)	 (подпись)	Лейченко В.А. (расшифровка подписи)
Руководитель группы текущих ремонтов ОКСиЭ (должность)	 (подпись)	Клундук И.С. (расшифровка подписи)
Руководитель направления отдела экономической безопасности и антикоррупционной политики (должность)	 (подпись)	Чернобай Л.К. (расшифровка подписи)
Начальник Ставропольского почтамта (должность)	 (подпись)	Гавриленкова Г.А. (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии Главный специалист отдела капитального строительства и эксплуатации (должность)	 (подпись)	Ковбаса О.А. (расшифровка подписи)
