

«Утверждаю»
Главный инженер СП ПЮЭС
А.А. Артемчук
" 10 " июня 2024 г.

Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3731/24 дата регистрации ДОУ 04.06.2024

1. Заявитель: Администрация Шкотовского муниципального района телефон: +79149768140
2. Наименование объекта: Индивидуальные жилые дома
- Фактический объект: _____
3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский р-н, п. Подъяпольский, в 102 м от ул. Зеленая, жилой дом № 2 по направлению на восток, кадастровый номер земельного участка 25:24:000000:2788
4. Заявленная мощность (кВт): 60
5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ
6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.
7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0
8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:
Первая точка присоединения: ПС- Подъяпольск_, №ф. 10 кВ « 7 », от опоры № 14, КТП проектируемое; № ф. 0,4 кВ, проектируемый

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _110 метров.


10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения			Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 10 кВ					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)			ВЛ	110
				КЛ	
1.2.	Установка опор (шт.)	х	ж/б	одноточечная	2
			деревянные	одноточечная с 1 уклоном	1
			на ж/б приставке	одноточечная с 2 уклонами	
				1 укос	1
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)			СИПЗ 1х50 в т.ч заход в ТП в т.ч ошиновка РЛК	370 15 9
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)			РЛК 6.IV\630	2
2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ					
2.1.	Длина ЛЭП, по трассе (м)			ВЛ	30
				КЛ	
2.2.	ж/б деревянные на ж/б приставке Установка опор(шт.)			одноточечная	
				одноточечная с 1 уклоном	1
				одноточечная с 2 уклонами	
				1 укос	
2.3.	Подвеска провода по трассе ВЛ (м)	кол. проводов ВЛ		СИП2 3х70+1[70 в т.ч заход в КТП	48
			2 провода		15
			4 провода		

Исп. Верто *И.Б.М.О.Р.*

№ пп		Тип, параметры	Колич
	3. Установка ТП <i>СТП 63 кВА</i>		ество
3.1.	Установка ТП10/0,4 кВ (1 ТП с транс.)	КТПН 250 кВА	1
3.2.	Установка силового трансформатора в ТП	ТМГ-250 кВА <i>63 кВА</i>	1
4. Установка дополнительного оборудования			
4.1.	Установка коммерческого учета электрической энергии	Счетчик электрической энергии трехфазный с отключением нагрузки	2
5. Вырубка зеленых насаждений			
5.1.	Чистка просеки (м)	ВЛ-10 кВ	110
5.2.	Чистка просеки (м)	ВЛ-6 кВ	30

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):

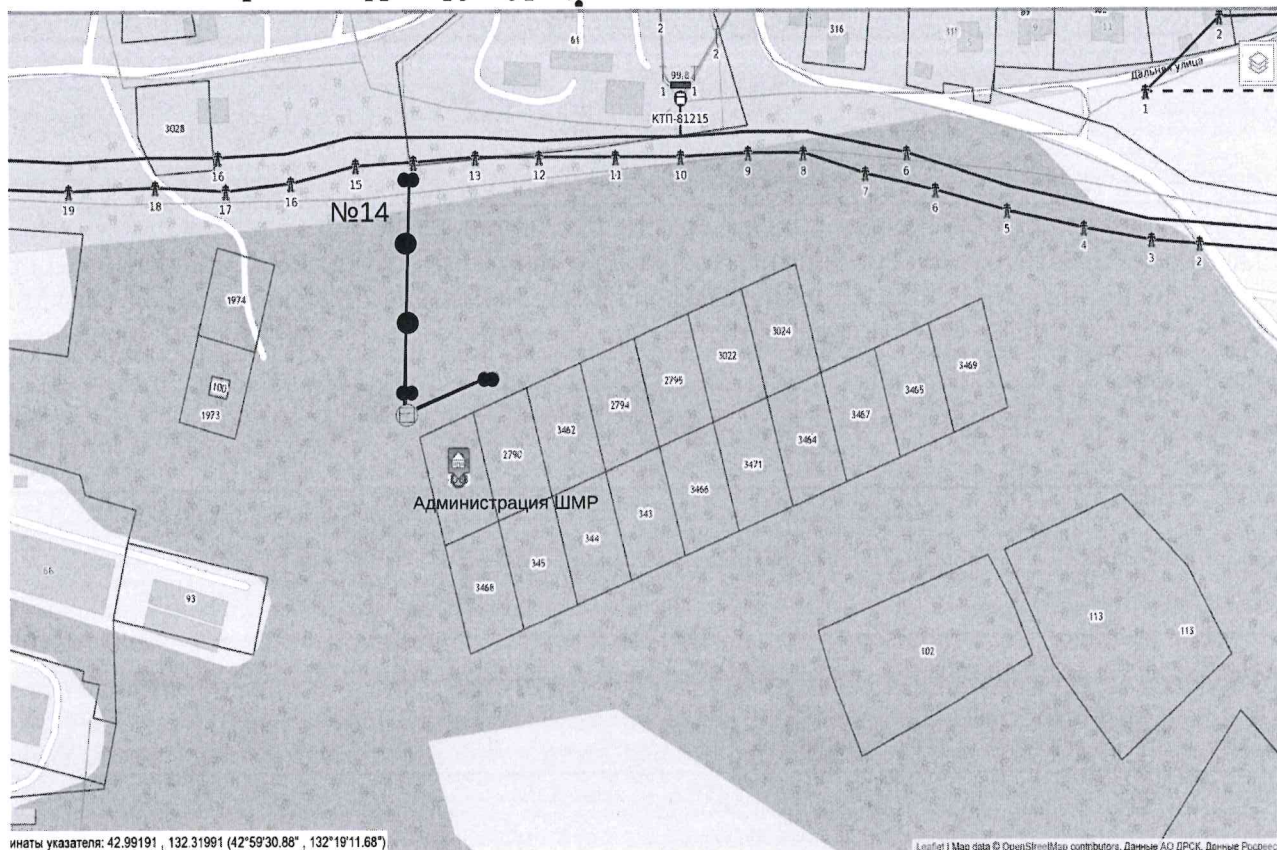

12. Примечания: Для подключения заявителя требуется строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 Ф-7 ПС «Подъяпольск» протяженностью 110 метров с установкой РЛК, строительство КТПН 250 кВА с ТМГ-250 кВА на фундаментных блоках с отсыпкой скальным грунтом и строительство ВЛ-0,4 кВ до заявителя, организацией коммерческого учета на проектируемой опоре. По пути прохождения ВЛИ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ требуется вырубка деревьев.

Начальник НРЭС

(Signature)

В.И. Сметанин

Исп. инженер СТП СП ПЮЭС
Дорофеева О.Б.
8(42335) 5-14-47
