

Дата 13.06.2023 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Дата _____ (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДОУ ТПр 3048/23 дата регистрации ДОУ 01.06.2023

1. Заявитель: Ермолаев Андрей Александрович телефон: +7(966)291-10-05

2. Наименование объекта: Производственно-складское помещение

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13, кадастровый номер земельного участка 25:28:040011:10767

4. Заявленная мощность (кВт): 1 000

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:


Первая точка присоединения: ПС-Стройиндустрия №ф. 6(10) кВ «2», конечная опора проектируемой КЛ 6 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 172

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство ЛЭП 6 кВ			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	КЛ 6 кВ	260 м
1,2	Длина провода	АПВПу2Г 3х240 В том числе ГНБ	260 м 160м
1.3.	Опоры	Одностоечная с 1 укосом Одностоечная с 2 укосом Одностоечная	1
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)	РЛК 10/600	1
1.5.	Установка разрядников (ОПН) (шт.)	ОПН 10	6
1.6.	муфты	Концевая промежуток	2 2
1.7.	Учет ЭЭ	ПКУ 6 кВ	1
2. Работы на ПС 110 кВ			
2.2.	Замена Трансформаторов тока в яч. № 14	ТВЛМ 10-0,2S/10 P-150/5	3

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

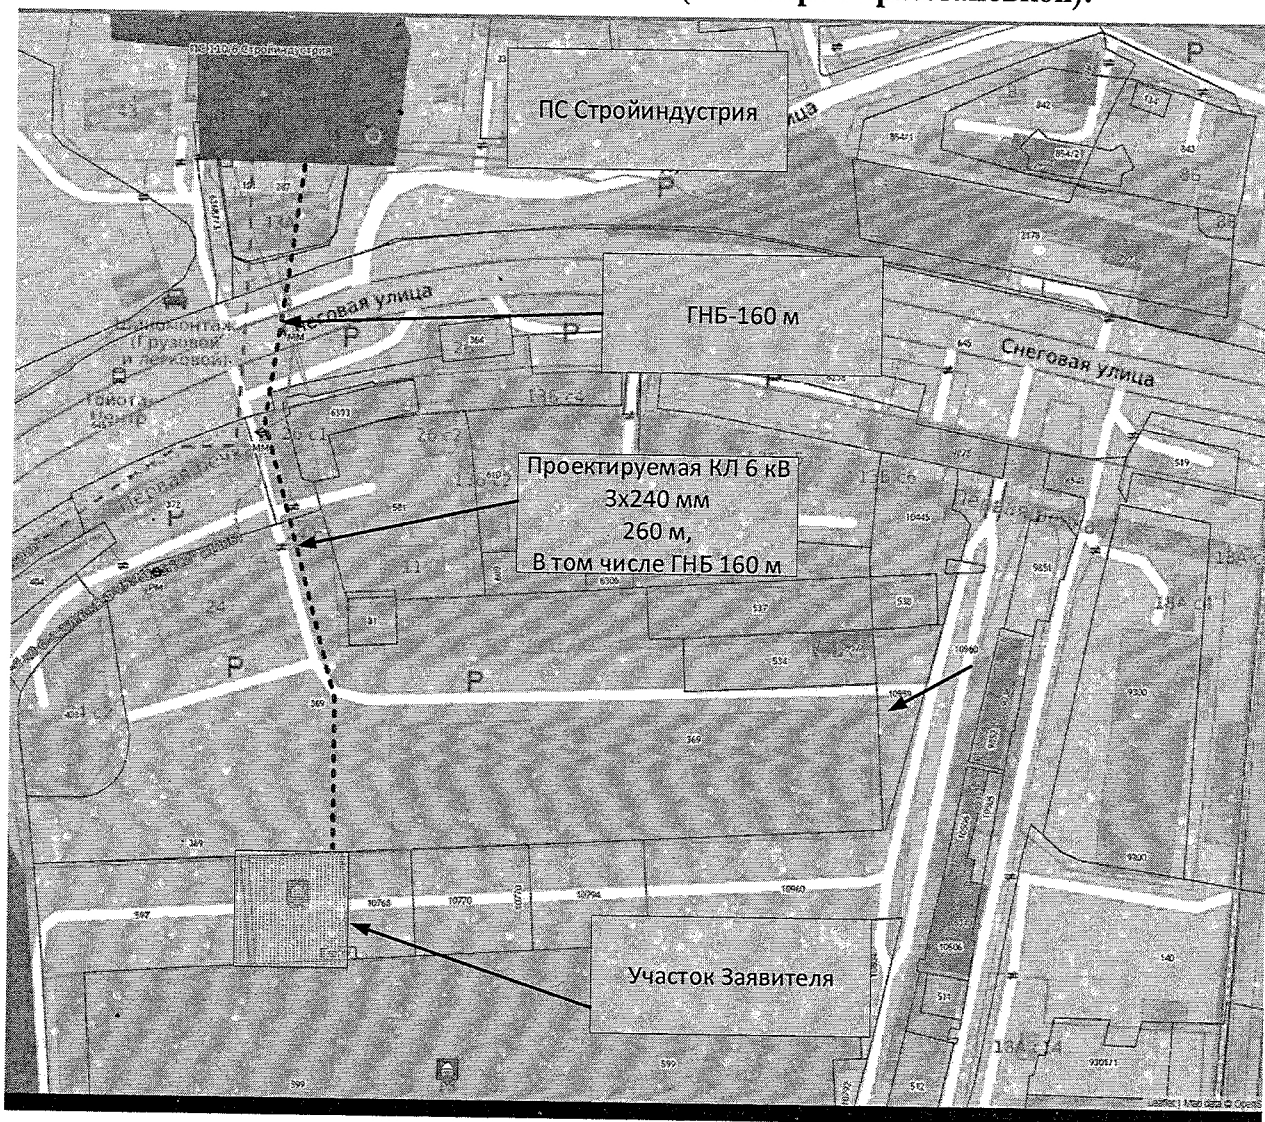

12. Примечания:

1. Строительство КЛ 6 кВ длиной 260 м кабелем 3х240 мм
2. переход через дорогу выполнить методом ГНБ-160 м,
3. замена ТТ номиналом 300/5 в ячейке 6 кВ № 14 ПС 110 кВ Стройиндустрия на трансформаторы тока 150/5
4. монтаж ПКУ 6 кВ -1 шт.
