

ПОЧТА РОССИИ	УФПС	УФПС_Р.Тыва
	ОПС	ИНДЕКС_668318
	Дата / версия	27.08.26_V2
	Подготовил	Костюченко С.В.
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)		48,6 м2
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)		35,0 м2
Неремонтируемые помещения (кв.м.) (кв.м.)		00 м2
1. План с расстановкой мебели и оборудования, демонтируемые элементы конструкций		

Условные обозначения			
0,8 кв.м	- Универсальные окна	0,3 кв.м	- Устройство площадок
0,8 кв.м	- Клиентская зона		- Фокусная стена, RAL 5010
0,8 кв.м	- Служебные помещения (БЭК-зона)		- Внутренняя облицовка стен в соответствии с ТЗ
0,8 кв.м	- Зона банка		
0,8 кв.м	- Неремонтируемые помещения	+0.000	- Высотная отметка потолка
Пом. совм. исп.	- Помещения совместного использования		- Урна уличная
Аренда	- Аренда		- Телекоммуникационный узел
	- Существующие стены и перегородки		- Шкаф СПС
	- Демонтируемые стены и перегородки		- Шкаф СОТС
	- Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ		- Разворотная площадка МГН 1500мм
	- Возводимые перегородки, кирпич		- Подъемник для МГН
	Раднаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		- Окна
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		- Проемы
	- Выпуск канализации + фановый стояк		- Двери
	- Ввод (-ы) воды + узлы учета расхода воды		
	- Металлическая решетка на окно со стороны фасада		
	- Рольставни на окно со стороны фасада		
0,2 кв.м	- Отмостка		

Примечание:* Размеры между перегородками/стенами, примыкающими к мебельным элементам -кассового барьера даны с запасом строго 10мм к фактическому суммарному размеру элементов мебели.

Согласовано
Главный специалист отдела
безопасности УФПС Р.Тыва

Наныкпан Саглана
Хургул-Ооловна
« » 2026 г.

Согласовано
Начальник почтамта, Кызылский
почтамт


Ооржак Марта
Алдын-Ооловна
« » 2026 г.

Согласовано
Руководитель отдела, ООО "Почта
Сервис"

Монгуш Алена
Степановна
« » 2026 г.

Согласовано
Главный специалист, Отдел охраны
труда и экологии (Кызыл)

Вяткина Алла
Николаевна
« » 2026 г.

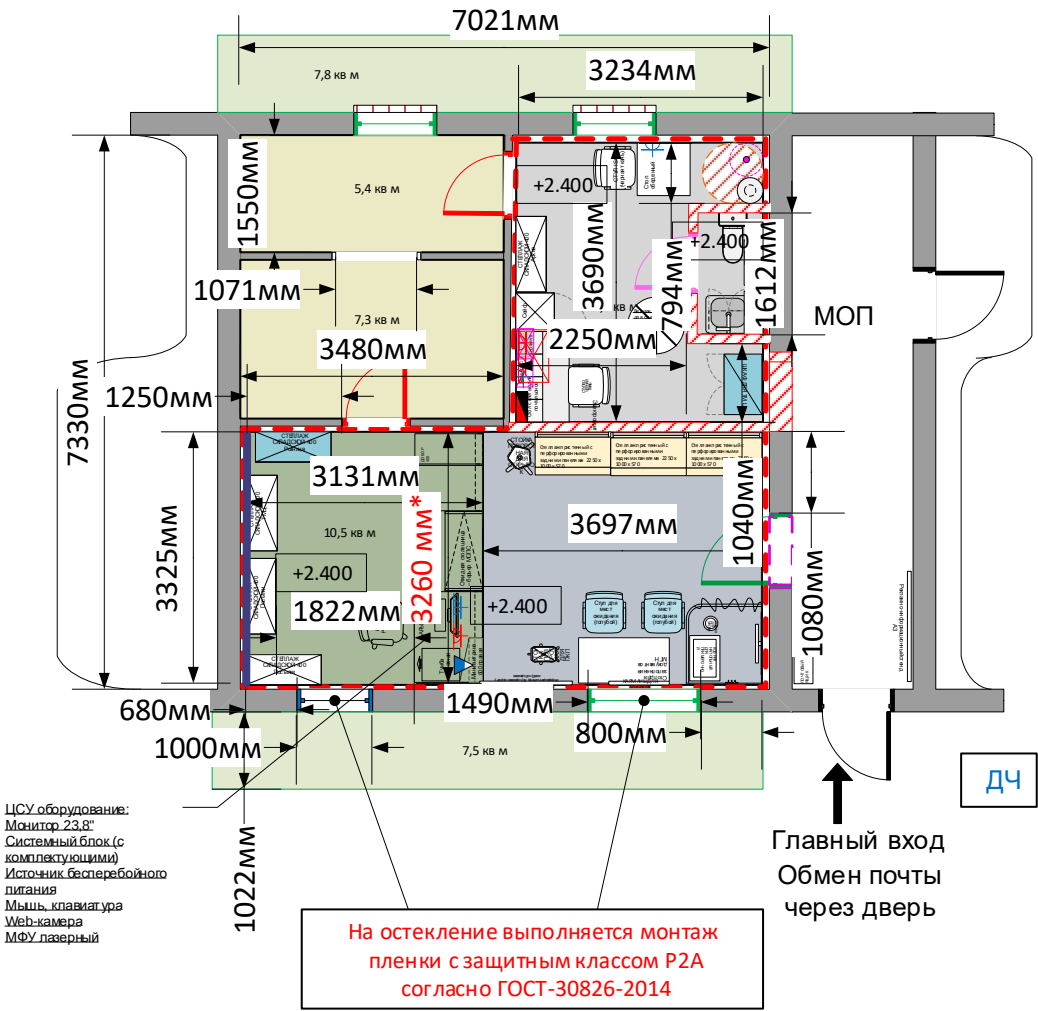

ПОЧТА РОССИИ	УФПС	УФПС_Р.Тыва
	ОПС	ИНДЕКС_668318
	ДАТА / ВЕРСИЯ	27.08.26_V2
	Подготовил	Костюченко С.В.
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)		48,6 м2
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)		35,0 м2
Неремонтируемые помещения (кв.м.) (кв.м.)		00 м2
2. План с расстановкой электрических розеток, слаботочных розеток СКС, камер СОТ, ЭОМ, оборудования отопления, вентиляции, кондиционирования (внутренние и наружные блоки), водоснабжения и канализации		

Условные обозначения			
	ВРЩ		Точка существующего ввода сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к,16А/250В, 2Р+РЕ, IP44. Скрытой установки. цвет-белый		Точка ввода новых сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к,16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-белый		Сущ. ХВС/ГВС
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-красный		Сущ. ХВС
	Сущ. Эл. сети		Нов. ХВС
	Нов. Эл. сети		Расстояние
	Камера в помещении		Теплосети
	Камера уличная		Сущ. Газ
	Телекоммуникационный узел		Нов. Газ
	Зона размещения СПС и СОТС		- Котел системы теплоснабжения электрический
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С сдвоенная		- Котел системы теплоснабжения газовый
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С одинарная		- Водонагреватель электрический
	Труба канализации в земле		- Бак для воды накопительный
	Зона размещения септика		- Бак для воды накопительный со скважиной
	Внутренний блок сплит-системы		
	Наружный блок сплит-системы		
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Электродонвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Завеса воздушная электрическая		

Согласовано
Главный специалист отдела
безопасности УФПС Р.Тыва

Наныкпан Саглана
Хургул-Ооловна
« » 2026 г.

Согласовано
Начальник почтамта, Кызылский
почтамт

Ооржак Марта
Алдын-Ооловна
« » 2026 г.

Согласовано
Руководитель отдела, ООО "Почта
Сервис"

Монгуш Алена
Степановна
« » 2026 г.

Согласовано
Главный специалист, Отдел охраны
труда и экологии (Кызыл)

Вяткина Алла
Николаевна
« » 2026 г.

