

Акт обследования № _____

Регистрационный номер ДОУ ТПр 7829/24 дата регистрации ДОУ 25.11.2024

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная Энергосетевая Компания" телефон: 89240015727

2. Наименование объекта: КТП-205 (точка присоединения опора 25 ВЛ-6кВ Ф-31 ПС Кролевцы)

Фактический объект: _____

3. Адрес объекта: Приморский край, г. Артем, в р-не ул. 70 лет Октября, 32

4. Заявленная мощность (кВт): 600

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 6 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 320

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Кролевцы, №ф. 6 кВ «Ф-11», строительство КЛ6кВ от ячейки №11 до опоры №1, строительство ВЛ6кВ от опоры №12 Ф-11 ПС Кролевцы до опоры №19 ВЛ6кВ Ф-31 ПС Кролевцы

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____ 1 _____ метров.


10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительство КЛ6 кВ от ячейки №11 ПС Кролевцы до опоры №1 Ф-11 ПС Кролевцы			
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)	ВЛ	
		КЛ	100
1.2.	Установка опор (шт.)	ж/б	одноточечная
		деревянные	одноточечная с 1 укосом
		на ж/б приставке	одноточечная с 2 укосами
			1 укос
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)	АПвПу2г (3х240)	156
		В т.ч. спуск и подъем по опоре	30
		В т.ч. заход в ПС	20
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)	РЛК	1
1.6.	Муфта для КЛ (шт.)	концевая	2


№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения		Тип, параметры	Количество	
1. Строительство ЛЭП 6 кВ от оп. №12 Ф-11 ПС Кролевцы до оп. №19 Ф-31 ПС Кролевцы					
1.1.	Длина ЛЭП по трассе (м)		ВЛ	90	
			КЛ		
1.2.	Установка опор (шт.)		ж/б	одностоечная	1
			деревянные	одностоечная с 1 укосом	
		на ж/б приставке		одностоечная с 2 укосами	
				1 укос	2
1.3.	Подвеска провода по трассе, в три провода (м)		СИПЗ 1х50	70	
			В т.ч ошиновка РЛК	9	
			В т.ч. заход в ПКУ	30	
1.4.	Установка разъединителей (1 компл.)		РЛК	1	
4. Установка дополнительного оборудования					
4.1.	Установка коммерческого учета электрической энергии		ПКУ 6кВ	1	

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой и сторонними объектами инженерной инфраструктуры):

Строительство КЛ 6кВ от ячейки №11 ПС Кролевцы до существующей опоры ВЛ6кВ №1 Ф-11 ПС Кролевцы кабелем АПвПу2г (3х240) протяженностью 70 метров

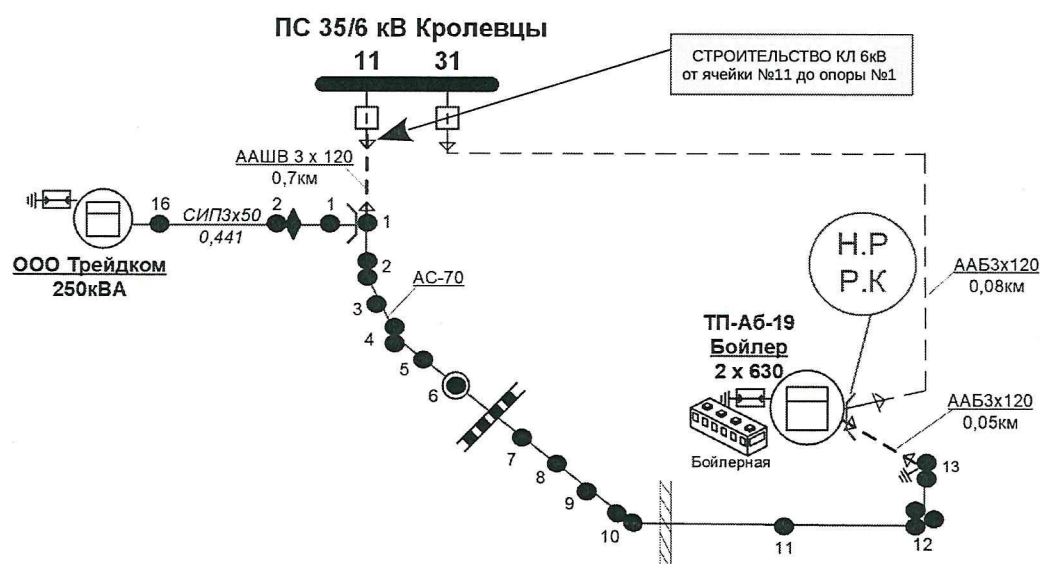

Строительство ВЛ 6кВ от опоры №12 Ф-11 ПС Кролевцы до существующей опоры ВЛ6кВ №19 Ф-31 ПС Кролевцы протяженностью 90 метров

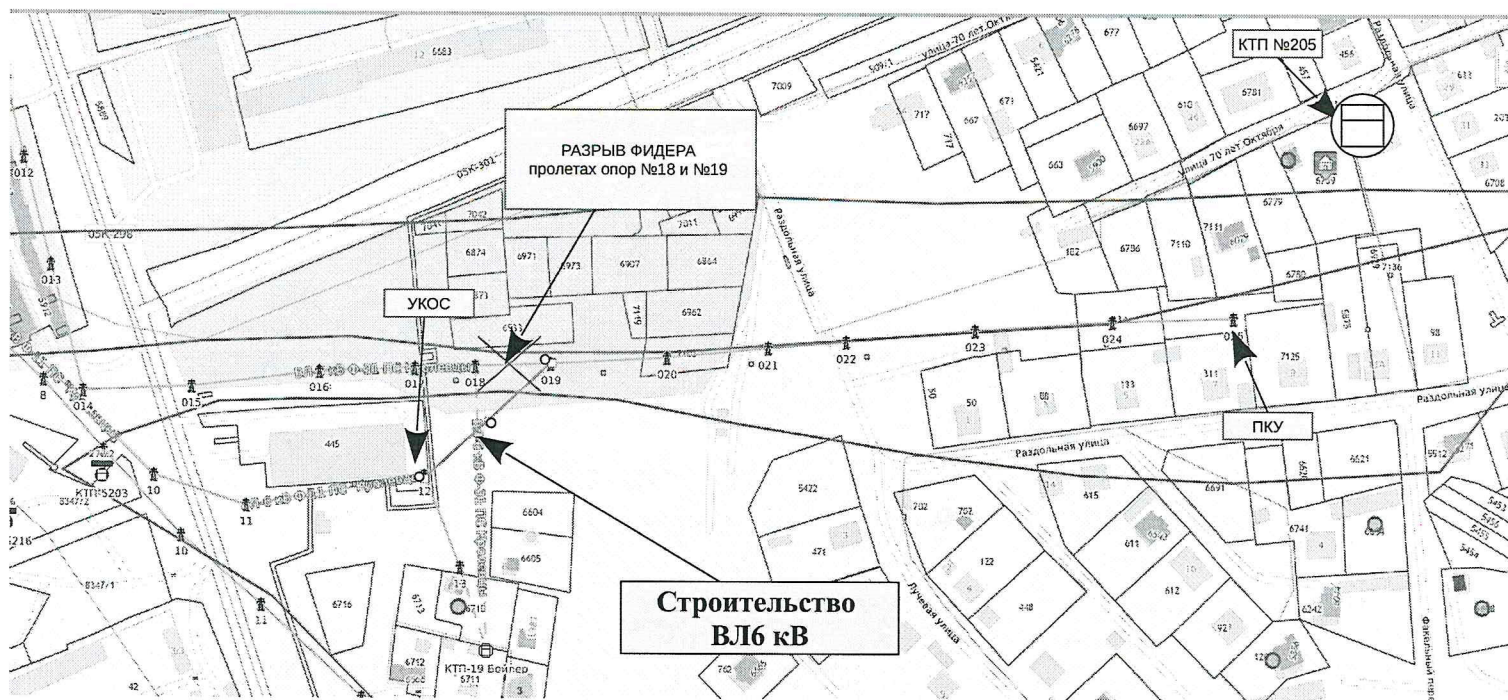

12. Примечания: Фидер №31 ВЛ 6кВ ПС Кролевцы загружен и имеет протяженность более 1100 метров. Для увеличения и обеспечения заявителя заявленной мощностью, требуется строительство КЛ6кВ от ячейки №11 ПС Кролевцы протяженностью 100 метров до первой существующей опоры ВЛ6кВ Ф-11 ПС Кролевцы, строительство ВЛ6кВ протяженностью 90 метров проводом СИПЗ 1х120 от существующей опоры №12 Ф-11 ПС Кролевцы до опоры № 19 ВЛ6кВ Ф-31 ПС Кролевцы для перевода существующей нагрузки, при проектировании и строительстве учесть стесненные условия жилой застройки и наличие коммуникаций.

Установка коммерческого учета ПКУ 6кВ на границе балансовой принадлежности на существующей опоре №25 ВЛ6кВ Ф-31 ПС Кролевцы.
