
ПОЧТА РОССИИ	УФПС_Тульской области
	ИНДЕКС_301056
	ДАТА_25.08.2026 / V3 /ЛИСТ_1/ ЛИСТОВ_2
Подготовил: Кириченко В.А.	
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)	198.9 м²
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)	40.6 м²
Площадь под аренду (кв.м.)	0 м²
1. План с расстановкой мебели и оборудования, демонтируемые элементы конструкций	

Условные обозначения

- Универсальные окна
- Клиентская зона
- Служебные помещения (БЭК-зона)
- Зона банка
- Неремонтируемые помещения
- Совм. исп. м² — Помещения совместного использования
- Аренда м² — Аренда
- Существующие стены и перегородки
- Демонтируемые стены и перегородки
- Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ
- Возводимые перегородки, кирпич
- Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)
- Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)
- Выпуск канализации + фановый стояк
- Ввод (ы) воды + узлы учета расхода воды
- Металлическая решетка на окно со стороны фасада
- Рольставни на окно со стороны фасада
- Отмостка
- Устройство площадок
- Фокусная стена, RAL 5010
- Внутренняя облицовка стен в соответствии с ТЗ
- 0.000 — Высотная отметка потолка
- Уличная урна
- Почтовый ящик Уличный
- Ø1500 — Разворотная площадка МГН 1500мм
- Подъемник для МГН
- Шкаф СПС
- Шкаф СОТС
- Телекоммуникационный узел
- Телекоммуникационный шкаф настенный

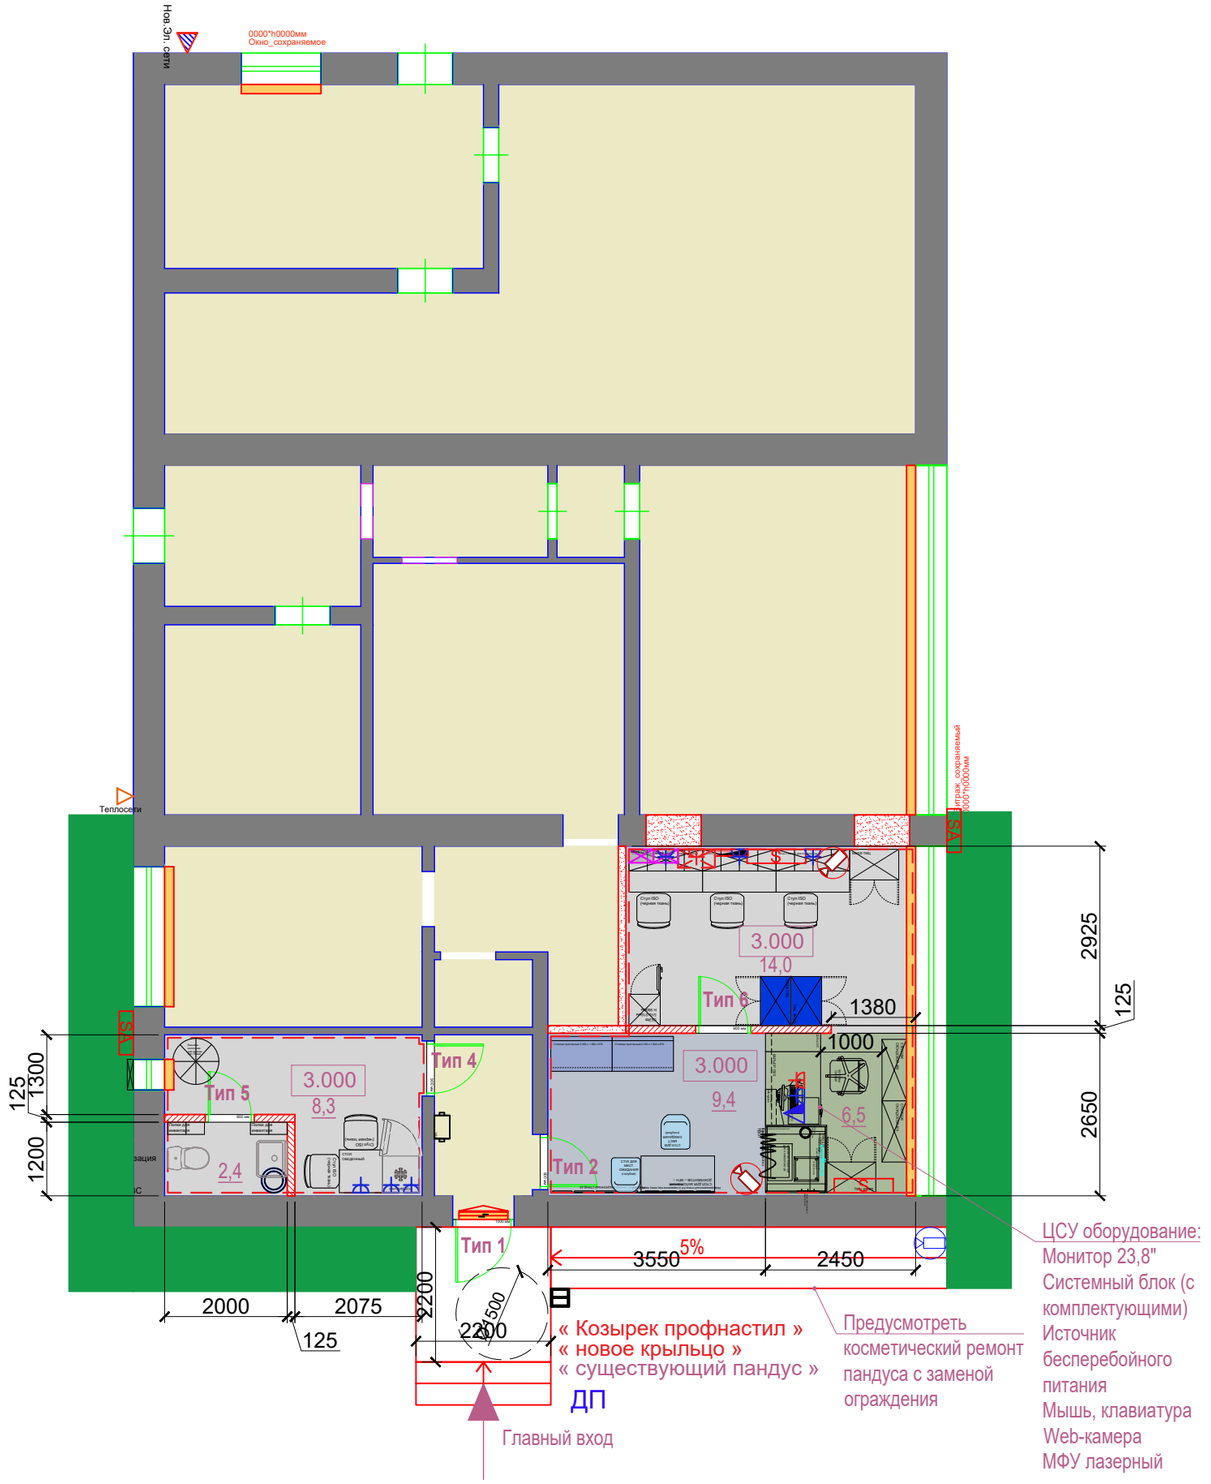

Примечание:* Размеры между перегородками/стенами, примыкающими к мебельным элементам -кассового барьера даны с запасом строго 10мм к фактическому суммарному размеруэлементов мебели.
