

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела договорной работы ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети
В.В. Шушув
2025г.

Закупка № 159

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки**

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети
Наименование титула инвест. программы: Выполнение СМР, ПНР: Выполнение работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям, являющимися неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям

Код SAP: 081-0026948

Характер строительства: Нов. строительство

Наличие ИРД на строительство: _____

Наличие проектно - сметной документации: отсутствует

Шифр и год ПСД: _____

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____

Местоположение объекта:

Московская область

Московская область

(субъект)

(район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР

(предмет закупки)

для / по:

Выполнение работ на стороне Заказчика согласно Техническим условиям, являющимися неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям

Объем работ (услуг) по лоту:

Согласно Техническим условиям

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
<input type="checkbox"/> Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/> Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/> Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/> Разработка Задания на проектирование	
<input type="checkbox"/> Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/> Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
<input type="checkbox"/> Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/> Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
<input type="checkbox"/> Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
<input type="checkbox"/> Выполнение авторского надзора	
<input checked="" type="checkbox"/> Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
<input checked="" type="checkbox"/> Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/> Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
<input type="checkbox"/> Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/> Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
<input type="checkbox"/> Регистрация объекта	

Объект технологического присоединения	<input checked="" type="checkbox"/>	нет
	<input type="checkbox"/>	ТП до 15 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 15 до 150 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП от 150 до 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	ТП свыше 670 кВт
	<input type="checkbox"/>	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:

Начальная цена лота: 406 557.38 руб.

без учета НДС _____ руб.

ПНР, СМР, ПНР, Оборудование, 406 557.38 руб.

Начальная цена лота: 496 000 руб.

с учетом НДС (22 %) _____ руб.

ПНР, СМР, ПНР, Оборудование, 496 000 руб.

Непредвиденные работы _____ руб.
и затраты, Прочее _____ руб.
_____ руб.
_____ руб.
_____ руб.

Непредвиденные работы _____ руб.
и затраты, Прочее _____ руб.
_____ руб.
_____ руб.
_____ руб.

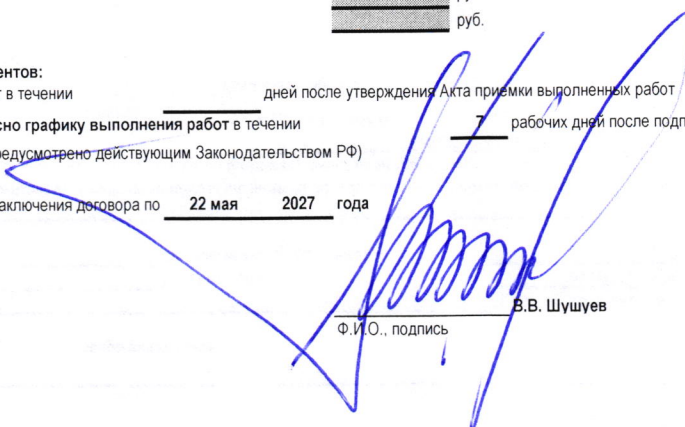
Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

- оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении _____ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): с момента заключения договора по 22 мая 2027 года

Начальник отдела договорной работы


Ф.И.О., подпись В.В. Шушурев
