

Номер закупки: 085-00 14270

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»  
С.Р. Кабиров  
"27" 03 2026г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-356278

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: нет  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:  
Москва 1 ЦАО г.Москва, ул.Берсеневская, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост"  
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование  
по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1000кВА, КП-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26128 (с.2) до ТП-10/0,4кВ № 29441 (луч Б) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КП-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берсеневская, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост"

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно ЗП

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации		
<input checked="" type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений		
<input checked="" type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ		
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений		
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования		
<input checked="" type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных,разработать согласовать с заинтересованными организациями,с заказчиком эскиз М1:2000,заказать геоподоснову в Мосгоргеотресте.Состав ИСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями . В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в в ТСН-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласовать ПСД со всеми заинтересованными организациями и МКС.Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора		
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы		
<input checked="" type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	поставка подрядчика по ценам согласованным с Заказчиком	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Подрядчик осуществляет поставку строительных материалов согласно проектно-сметной документации,а также обеспечивает складские площади, транспортные,таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества	
<input type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input type="checkbox"/>	да
	<input checked="" type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 97 321 075.32 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	<u>10 687 304.47 руб.</u>
СМР	<u>70 871 931.80 руб.</u>
Оборудование	<u>13 663 275.56 руб.</u>
ПНР	<u>550 245.65 руб.</u>
Прочие	<u>19 673.72 руб.</u>
Непредвиденные работы и затраты	<u>1 528 644.12 руб.</u>

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: \_\_\_\_\_ с даты подписания договора  
Окончание работ: \_\_\_\_\_ «09» декабря 2027г.

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ А.И. Челнаков

Директор департамента по капитальному строительству филиала  
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

  
\_\_\_\_\_ Д.С. Силаев

Главный специалист управления по сметному нормированию

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Сафонова

Начальник отдела договоров

  
\_\_\_\_\_ С.В. Гусев

Начальник управления инвестиционного планирования и экономики ТП

  
\_\_\_\_\_ И.В. Похлебкина

Начальник отдела торгово-закупочных процедур

  
\_\_\_\_\_ А.В. Хмарук







	год
Год соответствующий полуериоду выполнения ПИР:	2026
Год, соответствующий полуериоду строительства:	2027
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Нет

	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб. (без НДС):
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Генер. средств на непрокладочные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Не заэкспронованные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС:	57 788 327.35	11 140 910.38	448 665.29	9 130 985.93	3 096 990.63	1 485 034.04	2 492 884.97	16 04 .77	85 599 840.36
Не заэкспронованные объемы на начало года составления расчета в ценах освоения строительства, без НДС: (без затрат Заказчика)	57 788 327.35	11 140 910.38	448 665.29	9 130 985.93	0.00	0.00	1 246 442.48	16 04 .77	79 771 373.21

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб. (без НДС):
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Генер. средств на непрокладочные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кладовые работы, выполнение контрольно-испытательных геодезических съемок подорожных инженерных коммуникаций в границах участка, на подготовку технических планов зданий и сооружений, оформление границах зон с особыми условиями использования территории)	подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства не заэкспронованных объемов в текущих ценах сметного расчета	50 872 603.00	9 807 640.20	394 972.00	8 038 250.00	0.00	2 716 718.00	1 307 315.00	2 194 555.00	14 122.00	0.00	0.00	75 346 173.00
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2022/2021	114.631427330594	1.4631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2023/2022	109.096466260827	1.09096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827	109.096466260827
	2024/2023	108.140000000000	1.08140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000	108.140000000000
	2025/2024	107.400000000000	1.07400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000	107.400000000000
	2026/2025	105.500000000000	1.05500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000	105.500000000000
	2027/2026	104.100000000000	1.04100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2028/2027	104.100000000000	1.04100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2029/2028	104.100000000000	1.04100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
	2030/2029	104.100000000000	1.04100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000	104.100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						2 716 718.00	1 307 315.00	1 097 276.50	0.00	0.00	0.00	5 121 309.50
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства	58 823 885.80	11 340 553.88	456 705.31	8 870 490.21	0.00	0.00	0.00	1 268 778.55	16 329.24	0.00	0.00	80 776 742.99
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	8 870 490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 870 490.21
	2027	58 823 885.80	11 340 553.88	456 705.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1 268 778.55	16 329.24	0.00	0.00	71 906 252.77
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	0.987553722205	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	0.987553722203	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	58 091 747.37	11 199 406.20	451 021.03	8 760 085.63	0.00	0.00	0.00	1 252 986.98	16 126.00	0.00	0.00	79 771 373.21
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	8 760 085.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 760 085.63
	2027	58 091 747.37	11 199 406.20	451 021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1 252 986.98	16 126.00	0.00	0.00	71 011 287.58
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полуериода строительства с учетом НДС	70 871 931.80	13 662 275.36	550 245.65	10 687 304.47	0.00	0.00	0.00	1 528 644.12	19 673.72	0.00	0.00	97 321 075.32

Главный специалист ОТЗП Филлал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

Алиева В.Т. 25.03.2026



# СВОДКА ЗАТРАТ

по инвестиционному проекту: О326-048 НС М  
Государственное Казенное Учреждение - Центр Организации Дорожного Движения Правительства Москвы Объект транспортной инфраструктуры (зарядная станция для электротранспорта), 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост", кадастровый номер: 77:00:0000000:70369.  
(наименование стройки)

№ п/п	Наименование затрат	Объектов производственного назначения, тыс. руб.
1	2	3
1	Сметная стоимость:	
1,1	строительных и монтажных работ	50 872,603
1,2	оборудования	9 807,640
1,3	ПИР	8 038,250
1,4	прочих затрат	6 627,680
	в том числе:	
	ПНР	394,972
	Содержание службы заказчика	2 716,718
	Строительный контроль	1 307,315
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 194,553
	Прочие	14,122
	Справочные данные в прогнозном уровне цен на год окончания строительства без планирования по годам (без НДС):	
	Итого, сметная стоимость в ценах на 01.01.2025 года	75 346,173
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2025 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2026 год	75 346,173
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2027 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2028 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2029 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2030 год	-
	В том числе планируемый объем освоения капитальных вложений на 2031 год	-
	Индексы-дефляторы Минэкономразвития от года текущих цен в расчете (01.01 2025) до года реализации в т.ч.:	
	2025 год	107,40
	2026 год	105,50
	2027 год	104,10
	2028 год	104,10
	2029 год	104,10
	2030 год	104,10
	2031 год	104,10
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен	83 147,139
	в том числе:	
	строительных и монтажных работ	56 139,698
	оборудования	10 823,074
	ПИР	8 870,490
	ПНР	435,865
	Содержание службы заказчика	2 997,993
	Строительный контроль	1 442,668
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	2 421,766
	Прочие	15,584
	Сметная стоимость всего:	83 147,139
	НДС	18 292,371
	Итого, сметная стоимость в прогнозном уровне цен с учетом НДС	101 439,510

Ответственный исполнитель:

Семимова Е. О.

Заместитель директора департамента  
- начальник управления формирования стоимости

Д.М. Молодцов

Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)



Форма №1  
"Утверждаю"  
Заместитель директора  
по капитальному строительству  
филиала ПАО "Россети Московский регион"

Заказчик: ПАО "Россети Московский регион"  
(наименование организации)

Утвержден: «    » 20    г.

Сводный сметный расчет  
в сумме: 91 922,33 тыс. руб.

«    » 20    г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

государственное казенное учреждение - центр Организации дорожного движения правительства Москвы Объект транспортной инфраструктуры  
(зарядная станция для электротранспорта), 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный  
мост" кадастровый номер: 77-00-0000000-70360  
(наименование проекта)

Составлен в текущих ценах на 01.01.2025 г.

№ пп	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства.</b>							
1	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01	Строительство БКТП 0,4/10кВ 2х1000кВА + ТМ	454,06	294,00	9 807,64	0,00	10 555,69
2	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02	Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее, протяжённость трассы 1 км)	5 623,66	1 216,49	0,00	0,00	6 840,14
3	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03	Сооружение ГНБ (160мм, 2 трубы)	33 531,59	0,00	0,00	0,00	33 531,59
4	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04	Затягивание в ГНБ кабеля 10 кВ 240мм2 СПЭ (1 км)	0,00	3 780,15	0,00	0,00	3 780,15
5	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05	Сооружение КЛ-0,4 кВ кабелем АПвБШп (г) -1-4х240 (2 кабеля в траншее) Москва	639,44	112,60	0,00	14,12	766,16
6	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-06	Сооружение ГНБ (160мм, 3 трубы)	3 876,70	0,00	0,00	0,00	3 876,70
7	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-07	Затягивание в ГНБ кабеля 0,4 кВ 185мм2 (1 км)	0,00	393,49	0,00	0,00	393,49
		Итого по Главе 2	44 125,45	5 796,72	9 807,64	14,12	59 743,93
		Итого по Главам 1-2	44 125,45	5 796,72	9 807,64	14,12	59 743,93
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения.</b>							
8-14		Временные здания и сооружения	718,12	99,11	0,00	0,00	817,23
		Итого по Главе 8	718,12	99,11	0,00	0,00	817,23
		Итого по Главам 1-8	44843,56	5895,83	9807,64	14,12	60 561,16
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты.</b>							
20	Методика Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (Сооружение КЛ-10 кВ кабелем АПвПуг-10 -1х240/25 (1 кабель в траншее.	109,52	23,69	0,00	0,00	133,21
15-19		ПНР	0,00	0,00	0,00	394,97	394,97
		Итого по Главе 9	109,52	23,69	0,00	394,97	528,18
		Итого по Главам 1-9	44 953,08	5 919,52	9 807,64	409,09	61 089,34
<b>Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.</b>							
21-27		Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	1 307,32	1 307,32
28-34		Содержание службы заказчика-застройщика 3,93%	0,00	0,00	0,00	2 716,72	2 716,72
		Итого по Главе 10	0,00	0,00	0,00	4 024,03	4 024,03
		Итого по Главам 1-10	44 953,08	5 919,52	9 807,64	4 433,13	65 113,37
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.</b>							
35-41		ПИР	0,00	0,00	0,00	8 038,25	8 038,25
		Итого по Главе 12	0,00	0,00	0,00	8 038,25	8 038,25
		Итого по Главам 1-12	44 953,08	5 919,52	9 807,64	12 471,38	73 151,62
<b>Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.</b>							
42-48		Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	1 348,594	177,586	294,230	374,143	2 194,553
<b>Всего по сводному расчету г. без НДС.</b>			<b>46 301,68</b>	<b>6 097,11</b>	<b>10 101,87</b>	<b>12 845,52</b>	<b>75 346,17</b>
49	Налоговый кодекс РФ ст. 49	НДС 22%	10 186,37	1 341,36	2 222,41	2 826,01	16 576,16
		<b>Всего с НДС</b>	<b>56 488,04</b>	<b>7 438,47</b>	<b>12 324,28</b>	<b>15 671,53</b>	<b>91 922,33</b>

Ответственный исполнитель:



Семионова Е. О.

Заместитель директора департамента - начальник управления формирования стоимости



Д.М. Молодцов

О326-048 НС М 10.03.2026

Примечание:

Форма "Сводный сметный расчет стоимости строительства" и данные в столбцах 1-8 заполняются в текущем уровне цен в соответствии с Приложением 6 к приказу Минстроя России от 04.08.2020 №421.

Количество сводных сметных расчетов в соответствии с пунктом 40 приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421 разрабатывается на этап строительства, если проектной документации предусмотрено выделение этапов.





[illegible]





[illegible]

Расчет удельных показателей стоимости строите-льства (тыс.руб./МБА, тыс.руб./км)

Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, тыс. руб. (без учета НДС)

Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Оборудован	СМР	ПНР	Прочие	ПНР	Итого
ВЛ 0,4 кВ	0,10	0,00	753,22	0,67	136,51	0,00	900,50
ВЛ 6-20 кВ	0,90	0,00	7 644,35	11,93	1 925,50	0,00	8 181,18
Безусловно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВНГ	2,10	0,00	42 205,66	94,70	11 687,29	0,00	53 987,65
ВЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доп. работы при сооружении ВЛ	1,00	9 807,64	759,7	288,77	1 421,6	0,00	12 276,84
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	0,00	9 807,64	90,00	394,97	14 270,95	0,00	75 346,17
ВСЕГО по объекту							

Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, тыс. руб., (без учета НДС)

Наименование	Показатель (млн. МВА, шт.)	Оборудован не	СМР	ПНР	Прочие	Итого
ВЛ 0,4-в	0,10	8-22,35	9,24	150,64	0,00	997,73
ВЛ 6-20-в	0,90	7 884,04	1-50	1 134,67	0,00	9 028,22
Безопасность	0,20	9,20	9,00	9,00	0,00	0,00
ГНЕ	2,10	46 575,42	104-51	12 899,33	0,00	59 577,76
ВЛ 0,4-в	0,00	9,20	9,00	9,00	0,00	0,00
ВЛ 6-20-в	0,00	9,20	9,00	9,00	0,00	0,00
Доп. работы при сооружении ВЛ	1,00	10 822,07	8-7 888	314,11	1 568,86	13 547,92
ПП	0,00	9,20	9,00	9,00	0,00	0,00
Прочие	0,00	96 135,70	435,87	15 748,52	0,00	83 147,14
ВСЕГО по объекту	10 822,07	96 135,70	435,87	15 748,52	0,00	83 147,14

Экспертиза



1 Район

№ И-25-00-317058/102

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Технические условия  
на технологическое присоединение к электрическим сетям  
ПАО «Россети Московский регион»  
энергопринимающих устройств**

Государственное Казенное Учреждение - Центр Организации Дорожного Движения  
Правительства Москвы

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства **Объекта транспортной инфраструктуры (зарядной станции для электротранспорта).**
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Объект транспортной инфраструктуры (зарядная станция для электротранспорта), 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост", кадастровый номер: 77:00:0000000:70369.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **790 кВт.**
4. Категория надежности: **третья.**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **0,4 кВ.**
6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: **2 года.**
7. Точка(и) присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точке присоединения (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):  
**7.1. 1 точка - концевики 4-х вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № нов., в ВРУ-0,4 кВ Заявителя - 790 кВт**
8. Основной источник питания: **ПС 110 кВ Зубовская № 834 110/10 кВ.**
9. Резервный источник питания: **Отсутствует.**
10. ПАО «Россети Московский регион» выполнить:  
10.1. Мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» от существующих объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:  
10.1.1. Строительство блочной комплектной однострансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 1 шт. (ТП-10/0,4 кВ №нов.). Для присоединения ЭПУ Заявителя в ТП установить трансформатор мощностью 1000 кВА, комбинированную сборку в РУ 0,4 кВ. Размещение ТП выполнить на территории земельного участка Заявителя.  
10.1.2. Оборудовать ТП-10/0,4 кВ АИИС КУЭ, устройствами релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемом объекте, оборудованием по обеспечению защиты от однофазных замыканий на землю.  
10.1.3. Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт., от РТП-10/0,4 кВ № 26128 (с.2) до ТП-10/0,4 кВ № 29441 (луч Б) с заходом в ТП-10/0,4 кВ № нов. Протяженность одножильной КЛ с пластмассовой изоляцией сечением 240 кв. мм – 1,8 км, из которых:  
- протяженность КЛ в траншее – 0,9 км;



- протяженность КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых двумя трубами диаметром 160 мм – 0,9 км.

**10.1.4. Строительство КЛ 0,4 кВ, 4 шт., от РУ 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов. до ВРУ 0,4 кВ Заявителя. Применить вариант прокладки двух кабелей в одной траншее. Протяженность каждой многожильной КЛ сечением 240 кв.мм. – 0,1 км:**

- протяженность каждой КЛ в траншее – 0,05 км;

- протяженность каждой КЛ в закрытых переходах методом ГНБ, выполняемых тремя трубами диаметром 160 мм – 0,05 км.

**10.1.5. Установка и наладка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения, 1 шт. Точные параметры, место установки и конструктивное исполнение измерительного комплекса определить в соответствии с утвержденными ПАО «Россети Московский регион» типовыми техническими решениями.**

10.2. Мероприятия по развитию существующей инфраструктуры ПАО «Россети Московский регион» в целях создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства Заявителя:

**10.2.1. Выполнить оборудование и наладку 1 существующей ячейки на 2 секции РУ 10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 26128.**

10.3. Предусмотреть техническую возможность участия нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (АЧР).

10.4. До ввода объектов в работу, ПАО «Россети Московский регион» необходимо провести проверку выполнения технических условий (этапов технических условий), результатом которой является Акт о выполнении технических условий (этапов технических условий), подписываемый ПАО «Россети Московский регион» и Заявителем.

11. Заявителю выполнить:

11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления технологического присоединения:

**11.1.1. Выделить земельный участок, свободный от инженерных коммуникаций, для размещения сооружаемых сетевых объектов ПАО «Россети Московский регион».**

**11.1.2. Запроектировать и построить ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 1 шт. Параметры и конструктивное исполнение ВРУ-0,4 кВ с учетом требуемой категории надежности Заявителя определить проектом.**

**11.1.3. Запроектировать и построить электрическую сеть 0,4 кВ Заявителя с учетом требуемой категории надежности. Параметры и конструктивные особенности электрической сети 0,4 кВ Заявителя определить проектом.**

**11.1.4. В случае, если размещение приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, возможно только на объектах Заявителя, Заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.**

11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной.

11.3. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности, их вид, количество, номинальные данные и места подключения. Устройства компенсации реактивной мощности должны обеспечивать степень компенсации реактивной мощности в точках присоединения энергопринимающих устройств Заявителя напряжением 0,4 кВ не выше 0,35 (tg φ меньше или равно 0,35).

11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями, указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии проектирования технические решения, а также сам проект внутреннего электроснабжения Заявителя,



согласовать с филиалом(ами) ПАО "Россети Московский регион".

11.5. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013, а также средства измерения и регистрации качества электроэнергии и соотношения потребления активной и реактивной мощности с передачей указанной информации в ПАО "Россети Московский регион".

11.6. Для электроснабжения электроприемников, относящихся к первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания или резервирование вышеуказанных электроприемников по внутренней сети Заявителя. При установке автономных резервных источников питания Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внеплановых отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

12. Общие требования:

12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО "Россети Московский регион", с корректировкой утвержденных технических условий.

12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор при участии ПАО "Россети Московский регион" и Заявителя и после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор, разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.

12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или обязанностей.

12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет **2 года** со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

<p style="text-align: center;"><b><u>ПОДПИСАНО</u></b> <b><u>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</u></b> <b><u>4589588e</u></b> <b><u>Директор департамента перспективного</u></b> <b><u>развития сети и инженерного обеспечения</u></b> <b><u>технологического присоединения ПАО</u></b> <b><u>«Россети Московский регион»</u></b> <b><u>Ю.А. Любимов</u></b></p>
---



## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

**По титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1000кВА, КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26128 (с.2) до ТП-10/0,4кВ № 29441 (луч Б) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берсеновская, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост"**

№ п\п	Перечень основных требований	Содержание требований
<b>1. Общие данные</b>		
1.1	Объект	Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1000кВА, КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26128 (с.2) до ТП-10/0,4кВ № 29441 (луч Б) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берсеновская, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост"
1.2	Заказчик проектно-сметной документации	МКС - филиал ПАО «Россети Московский регион»
1.3	Генеральная проектная организация	
1.4	Вид строительства (новое стр., реконструкция капремонт)	Новое строительство
1.5	Стадия проектирования	Проектная и рабочая документация
1.6	Общие сведения об участке (трасса) строительства	г.Москва, ул.Берсеновская, у д.2, корп.1, Причал "Большой Каменный мост"
1.7	Дата начала проектирования	в соответствии с условиями договора
1.8	Дата окончания проектирования	в соответствии с условиями договора
<b>2.Исходные данные для проектирования</b>		
2.1	Техническое задание на право заключения договора на выполнение работ	Имеется
2.2	Техническое задание	Согласно пунктам 10.1, кроме п.10.1.5 ТУ № И-25-00-317058/102
2.3	Протокол о результатах конкурса	
2.4	Предпроектное обследование и ситуационный план М 1:2000	Требуется
2.5.	Геодезический план масштаба 1:500 с красными линиями и	Требуется

	подеревной съемкой выполненный ГБУ «Мосгоргеотрест»	
<b>3.Базовые значения технико-экономических показателей</b>		
3.1	Кол-во и технические характеристики	Согласно пунктам 10.1, кроме п.10.1.5 ТУ № И-25-00-317058/102
3.2	Предельная стоимость инвестиционного проекта в текущих ценах	85 599 840.36 руб. без НДС
<b>4. Основные требования к проектным решениям</b>		
4.1	Соответствие проектных решений действующим нормативным документам	<p>Постановление правительства Москвы, СНИП, МГЭСН в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Постановление правительства Москвы от 30 июля 2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г.Москве»;</li> <li>2. МГСН 1.01-99 Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы;</li> <li>3. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;</li> <li>4. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;</li> <li>5. Постановление Правительства №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;</li> <li>6. Методические указания по применению в ПАО «Россети Московский регион» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов. Приказ ПАО «МОЭСК» от 03.09.18 г. № 1009 (в действующей редакции).</li> </ol>
4.2.	При необходимости проектом предусмотреть:	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Раздел «Проект организации строительства»;</li> <li>– Раздел «Закрытые переходы»;</li> <li>– Раздел «Охрана окружающей среды» (в соответствии с МУ О 4.14-1-2015/1);</li> <li>– Раздел «Санитарно-экологическое обследование грунтов»;</li> <li>– Раздел «Дендроплан и перечетная ведомость»;</li> <li>– Раздел «Сохранность объекта культурного наследия»;</li> <li>– Раздел «Оценка влияния строительства на объект культурного наследия»;</li> <li>– Прохождение Историко-культурной экспертизы;</li> <li>– Задание на проектирование;</li> <li>– Разделение проекта на этапы (под этапы) (при необходимости);</li> </ul>
<b>5.Согласование проектной документации</b>		



5.1.	Согласования поручаются Проектной организации в соответствии с «Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г.Москве», утвержденном распоряжением Мэра Москвы 11.04.2000 № 378-РМ (с изменениями)	<p>До начала разработки проектной документации Проектировщик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком состав проекта, в соответствии с которым осуществляется дальнейшее проектирование и приемка выполненных работ. Провести согласование Проектной документации с следующими эксплуатирующими организациями и органами Государственного контроля и надзора:</p> <p>Основные согласования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сетевой район отделы и службы МКС;</li> <li>- ДЕЗ, Управа; владельцем территории;</li> <li>- Ростехнадзор (Мосэнергонадзор);</li> <li>- Отдел подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»;</li> <li>- при необходимости ДКН, ДППиООС, Департамент транспорта г.Москвы;</li> </ul> <p>Дополнительные согласования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по требованию отдела подземных сооружений ГБУ «Мосгоргеотрест»;</li> <li>- по требованию служб МКС;</li> <li>- по требованию балансодержателя территории;</li> <li>- - установление сервитута/заключение срочного сервитута и включение расходов по его установлению/заключению в сметную стоимость.</li> <li>- получение разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.</li> </ul>
<b>6. Порядок разработки и сдачи проектно-сметной документации</b>		
6.1.	Выполнение экземпляров проектно-сметной документации	<p>Сметную документацию составлять базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ТСН-2001 в базовом уровне цен 2000 г. и в текущем уровне цен в соответствии с графиком производства этапов работ.</p> <p>Расчет проектных работ производить по МРР, действующим на момент утверждения проектно-сметной документации.</p> <p>Расчет смет на строительно-монтажные работы составляется базово-индексным методом в сметно-нормативной базе ТСН-2001 (ред. МГЭ) с применением индексов пересчета, разработанных ГАУ «Мосгосэкспертиза».</p> <p>В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта.</p> <p>В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- норматив расходов на содержание службы заказчика- застройщика, за исключением строительного контроля – 5,68%;</li> <li>- норматив расходов на осуществление строительного контроля – 2,14%</li> </ul> <p>Проектно-сметная документация предоставляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2-х экземплярах и 1 (один) экземпляр проектно-сметной документации в электронном виде в формате программы Smeta.Ru или в сметной программе совместимой с единым форматом АРПС 1.10 pdf.</p> <p>Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.</p>
<b>7. Основные требования к строительно-монтажным работам</b>		
	Выполнение строительно-монтажных работ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с проектно-сметной документацией, в соответствии со СНиП и правилами производства работ и сдает их Заказчику.</li> <li>2. Подрядчик предоставляет оборудование и материалы в соответствии с проектной документацией.</li> <li>3. Подрядчик предоставляет Заказчику счета на оплату материалов и оборудования, не внесенных в ТСН 2001, лицензии ПО для согласования стоимости.</li> <li>4. Подрядчик поставляет на строительную площадку материалы, изделия, конструкции и оборудование, имеющие сертификаты соответствия системы «Мосстройсертификат» или других уполномоченных органов, а также строительную технику, необходимую для производства работ.</li> <li>5. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых</li> </ol>

	<p>мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.</p> <p>6. Подрядчик согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.</p> <p>7. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик готовит и передает в эксплуатационный район исполнительную документацию в установленном порядке.</p> <p>8. По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет и подписывает акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-34), акт приемки законченного строительством объекта (КС-11), акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания для комплексного опробования, акт комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования, акт рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления приемочной комиссии, акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ОС-1), акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (ОС-1б), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (ОС-1а), акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, акт модернизированных объектов основных средств (ОС-3) в ремонтно-эксплуатационном районе, Управлении кабельных сетей и службах МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», службах государственного надзора и проектной организации (в соответствии с приказом о назначении приемочной комиссии) и передает заказчику (ДКС МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион).</p> <p>9. Срок выполнения работ:</p> <p>Работы производятся в соответствии с графиком производства этапов работ.</p>
--	---

Заказчик:

И.о. заместителя директора по  
капитальному строительству МКС -  
филиала ПАО «Россети Московский регион»



  
А.И. Челнаков





**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

## ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ

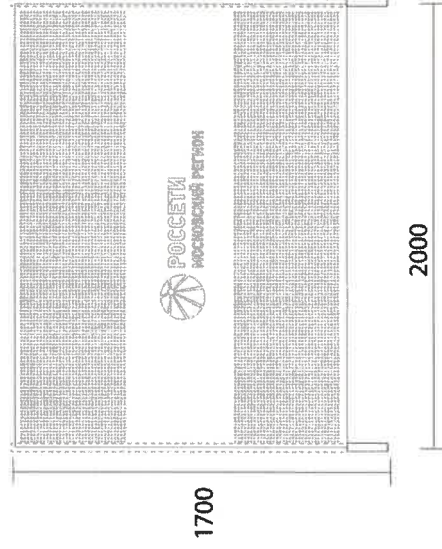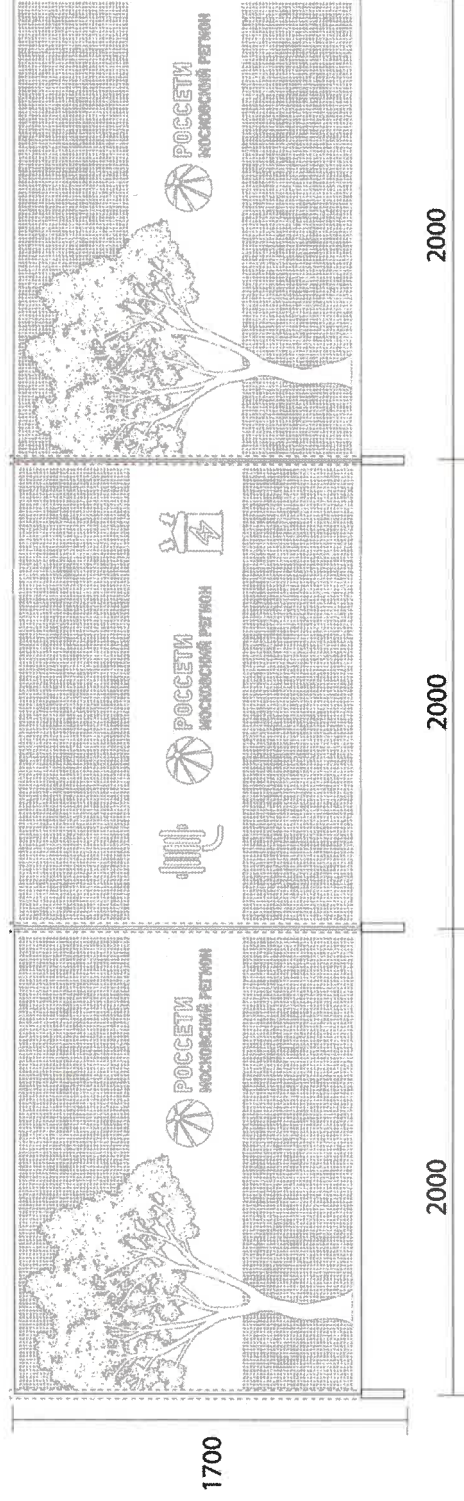

### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории Г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрытия для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

  
И.В. Душина



**РОССЕТИ**  
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

**ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:**

Фонарь светодиодный  
сигнальный вставной


Стабилизационная  
подпорка

Фонарь светодиодный  
сигнальный вставной


Сварная рама




Вариант 1

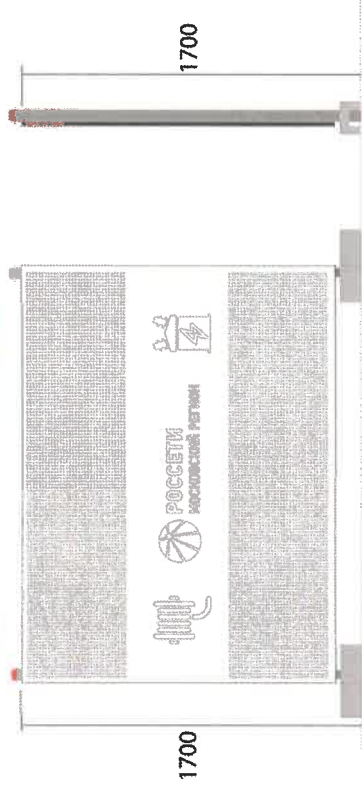

Вариант 2

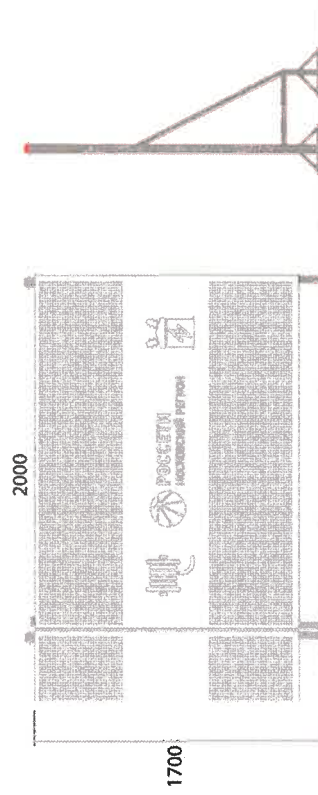

Вариант 3

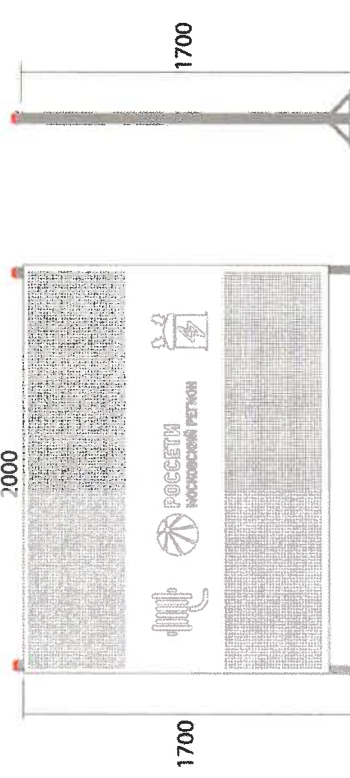


Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4



ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:

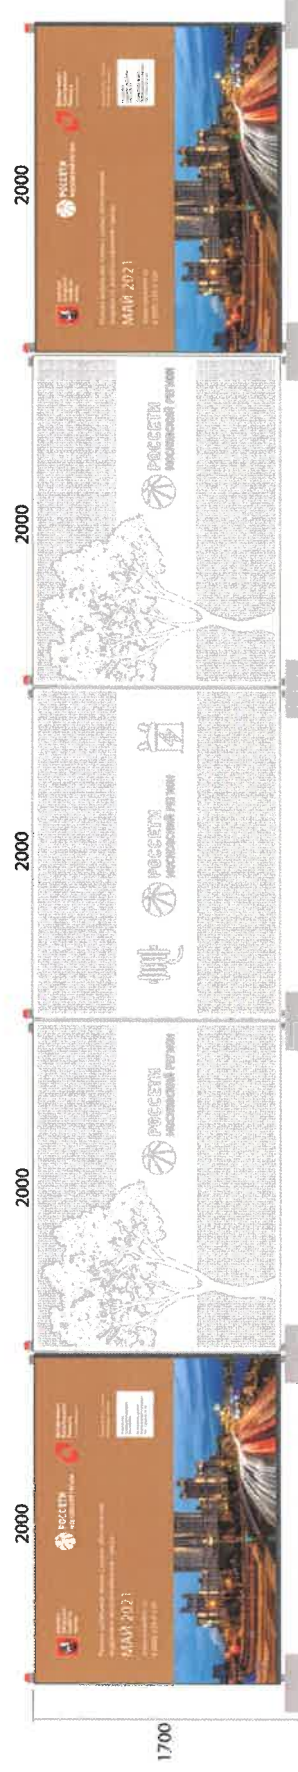

#### БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина
