

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

05.12.2025

Номер закупки: 084-0020264

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-292693
(код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: Утверждена
(утверждена/не утверждена/не требуется)

Приказ об утверждении проекта:

0519-12-КС от 19.05.2025
(номер и дата приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

МО, Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная
(район)

(услуг)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, оборудование

по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 155 Рядовицы с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная

Объем работ (услуг) по лоту:

в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены:

Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: **19 165 268,80 руб.** с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 19 162 191,96 руб.
Оборудование 390,40 руб.
ПНР 2 686,44 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:


<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника управления капитального строительства


_____ подпись

С.А. Кузнецов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

Н.Н. Косач
Ф.И.О.



Утверждаю

Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"


А.И.Иванов

04.12.2025

Расчет предельной стоимости лота Выплатение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 155 Радошцы с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПНР, МО, Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-292693

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ПС-110 кВ № 155 Радошцы с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПНР, МО, Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	Месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	Строительно-монтажные работы (условия сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (включением СКЭС, ПНР и ПНР)	Оборудование заемных средств (контингирование %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Сметы в базисном уровне цен	01.2001	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Сметы в текущем уровне цен	09.2024	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	100,00%	14 194 510,00	320,00	1 990,00	408 380,00	829 580,00	303 810,00	нд	15 738 590,00	
Сметы в текущем уровне цен	09.2024	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00	
Сметы в текущем уровне цен	09.2024	Итого	100%	14 194 510,00	320,00	1 990,00	408 380,00	829 580,00	303 810,00	нд	15 738 590,00	
Сметы в текущем уровне цен	09.2024	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3 147 718,00	
Сметы в текущем уровне цен	09.2024	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	18 886 308,00	
Затраты на реализацию	нд	Отгорованно сметы, стоимости	нд	0,00	0,00	0,00	408 380,00	0,00	0,00	нд	408 380,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	408 380,00	
Затраты на реализацию	нд	Заказанные объемы	нд	0,00	0,00	0,00	408 380,00	0,00	0,00	нд	408 380,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	408 380,00	
Затраты на реализацию	нд	Фактически объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	
Затраты на реализацию	нд	Неразработанный остаток по договорам	нд	0,00	0,00	0,00	408 380,00	0,00	0,00	нд	408 380,00	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	81 676,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	490 056,00	
Затраты на реализацию	нд	Незаказанные объемы сметы год	нд	14 194 510,00	320,00	1 990,00	0,00	829 580,00	303 810,00	нд	15 330 210,00	
Затраты на реализацию	нд	индекс директивного снижения	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Незаказанные объемы сметы в т.ч.	Индекс-дефлятор	14 194 510,00	320,00	1 990,00	0,00	829 580,00	303 810,00	нд	15 330 210,00	
Затраты на реализацию	нд	2024 год	109,113503262205	14 194 510,00	320,00	1 990,00	0,00	829 580,00	303 810,00	нд	15 330 210,00	
Затраты на реализацию	нд	2025 год	107,816317063964	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2026 год	105,262896868962	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2027 год	104,420897989339	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	2028 год	104,420897989339	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подпрет)	1,122467641349	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные)	1,511771149256	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
Затраты на реализацию	нд	Не заказанные объемы на начало года составлением расчеты в ценах освоения строительства, без НДС	нд	15 933 162,05	359,20	2 233,75	0,00	913 112,14	341 022,97	нд	17 189 890,11	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3 193 037,13	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	20 382 927,24	
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	15 933 162,05	359,20	2 233,75	408 375,00	1 254 135,11	0,00	0,00	17 598 265,11	
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3 268 826,00	
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	20 867 091,11	

	год		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочие"				Итого: руб.		
							Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):		
Год соответствующий полупериоду выполнения ПНР:	2024	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	15 933 162,05	359,20	2 233,75	0,00	913 112,14	341 022,97	0,00	0,00	17 189 890,11		
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	15 933 162,05	359,20	2 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 935 755,00		
Наличие ПНР, работной по отдельному договору на ПНР	Нет												
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочие"						Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты на материалы по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на эксплуатацию работ, выполняемых изнутри-использованные материалы, включая платежи за материалы, используемые в рамках участия в подготовке технического задания и согласовании, оформлении графиков (в т.ч. работы по созданию и эксплуатации оборудования))	затраты на эксплуатацию по техническим параметрам	
1	Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета	14 194 510,00	320,00	1 990,00	408 380,00	0,00	829 580,00	303 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738 590,00
2	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2023/2022	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827
	2024/2023	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205
	2025/2024	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964
	2026/2025	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962	105,262896868962
	2027/2026	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2028/2027	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
	2030/2027	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339	104,420897989339
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				408 380,00		829 580,00	303 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 770,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	15 706 714,72	354,09	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 270,82
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	15 706 714,72	354,09	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 270,82
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	15 706 714,72	320,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 236,72
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	15 706 714,72	320,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 236,72
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	15 706 714,72	320,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 236,72
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	19 162 191,96	390,40	2 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Оформление стоимости лота выполняется с использованием стоимости прогнозных цен инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат (Статьи, Статьи, Статьи). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапе формирования договорной цены стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС

А. А. Яриш

04.12.2025

Утверждаю:

Директор ВЭС филиала ПАО "Россети
Московский регион"

Ф.С.Гутнев

«__» ____ 20__ г.

Разделительная ведомость
по оборудованию и МТР поставляемого подрядчиком по титулу:

"Модернизация ПС-110 кВ № 155 Радовицы с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПНР, МО,
Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная" (код SAP: I-292693)

на сумму: 320,00 руб. без НДС

Приказ об утверждении ПСД №0519-12-КС от 19.05.2025г.

№.№ п/п	Наименование оборудования, тип	Ед. изм.	Кол-во	Сметная цена за ед. в руб. без учета НДС по состоянию на 2024г.	Сметная стоимость в руб. без учета НДС по состоянию на 2024г.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	OptiDin BM63-1C10-УХЛЗ (BM63), 1р, In=10 А, кривая С	шт	1	320,00	320,00	
	ИТОГО, без учета НДС:				320,00	
	НДС:				64,00	
	ВСЕГО, в т.ч.НДС:				384,00	

Согласовано:

Заместитель директора филиала по капитальному строительству-Начальник управления
капитального строительства



С.А.Кузнецов


(подпись)

«__» ____ 20__ г.

(подпись)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству
филиала «Восточные электрические сети» ПАО «Россети Московский регион»


С.А. Кузнецов
2025г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ Радовицы № 155 с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский г.о.
пос. Рязановка, ул. Молодежная (528 п.м.; 1 шт.(прочие))
(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2024.09


№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтаж инженерно-технических средств защиты территории (ИТСЗ)	1 243,68				1 243,68
2	01-02-01	Демонтаж инженерно-технических средств защиты территории (ИТСЗ) ОРУ	161,49				161,49
3							
Итого: по главе 1			1 405,17				
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ЛС-02-01-01	Устройство инженерно-технических средств защиты территории (ИТСЗ)	10 801,13				10 801,13
5	ЛС-02-02-01	Устройство инженерно-технических средств защиты территории (ИТСЗ) ОРУ	1 569,43				1 569,43
6	ЛС-02-03-01	Электроснабжение ИТСЗ	32,41	108,05	0,32		140,78
Итого: по главе 2			12 402,97	108,05	0,32		12 511,34
Итого: по главам 1-2			13 808,14	108,05	0,32		13 916,51
Итого: по главам 1-7			13 808,14	108,05	0,32		13 916,51
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	Методика по приказу Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, прил.1, п.23	Временные здания и сооружения, необходимые для осуществления строительства 2,5%*0,8	276,16	2,16			278,32
8							
9							
Итого: по главе 8			276,16	2,16			278,32
Итого: по главам 1-8			14 084,30	110,21	0,32		14 194,83
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ЛС-09-01-01	Пусконаладочные работы электроснабжения ИТСЗ				1,99	1,99
11							
12							
Итого: по главе 9						1,99	1,99
Итого: по главам 1-9			14 084,30	110,21	0,32	1,99	14 196,82
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
13	Приказ ПАО "МОЭСК" от 13.09.2017 №1050.	Содержание службы заказчика- застройщика - 5,68% от итога гл. 1- 9+гл.12				829,58	829,58
14	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				303,81	303,81
15							
Итого: по главе 10							
Итого: по главам 1-10			14 084,30	110,21	0,32	1 133,39	1 133,39
						1 135,38	15 330,21

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
16	Договор № 14-ТЭР от 10.04.2024 г.	Проектные работы				408,38	408,38
17							
18							
Итого: по главе 12							
Итого: по главам 1-12			14 084,30	110,21	0,32	1 543,76	15 738,59
Непредвиденные затраты							
19	МДС 81-35.2004, раздел IV, п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 0%					
20							
21							
Итого: Непредвиденные затраты							
Итого с непредвиденными			14 084,30	110,21	0,32	1 543,76	15 738,59
НДС							
22		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	2 816,86	22,04	0,06	308,75	3 147,71
Итого НДС			2 816,86	22,04	0,06	308,75	3 147,71
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			16 901,16	132,25	0,38	1 852,51	18 886,30

м.п.



Управляющий ООО "Техноэйр" -
индивидуальный предприниматель

 И.А. Катков

ПРИКАЗ

от 19.05.2025

№ 0519-12-КС

Об утверждении проектной документации

На основании экспертного заключения технических служб Восточных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион" и заключения по превышению стоимости ВЭС

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу:

I-292693

Реконструкция ПС 110 кВ Радовицы № 155 с заменой ограждения подстанции. в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная (528 п.м.; 1 шт.(прочие))

разработанную генеральным подрядчиком ООО "Техноэйр" по договору № 14-ТЭР от

10.04.2024 со следующими технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

1.1.	Протяженность ограждения ПС 110/35/6кВ №155 "Радовицы" из металлических панелей на метал столбах на винтовых сваях, м.п.	594,0
	Протяженность ограждения ОРУ на ПС из металлических решетчатых панелей на метал столбах на винтовых сваях, м.п.	132,0
1.1.1.		
1.1.2.	Ворота металлические с калиткой, компл	1,0

2. Общая сметная стоимость:

2.2.	Стоимость строительства в текущих ценах на сентябрь 2024 года, тыс. руб.	15 738,59
2.2.1.	СМР	14 194,51
2.2.2.	Оборудование	0,32
2.2.3.	Прочие	1 543,76
	в том числе:	
2.2.3.1.	ПИР	408,38
2.2.3.2.	ПНР	1,99
2.2.3.3.	Содержание дирекции заказчика	1 133,39

Заместитель директора по кап. строительству



С.А.Кузнецов

Начальник производственно-технической службы - А.А.Скворцов

Зам.начальника УКС - А.Е. Иванов

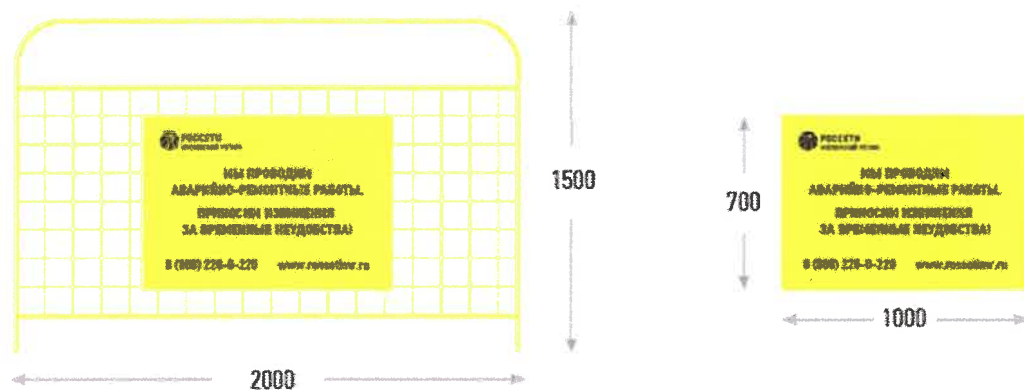
Начальник отдела ИПиЭТП - О.Г.Глухова

Исполнитель - глав специалист УКС Е.В.Петрова

Тел. 22-78

Рассылается: Дело, сл.РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.

Директор по внешним коммуникациям

 Л.В. Душеина

ПРИЛОЖЕНИЕ №5. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина
