

Номер закупки: 082-0032997

УТВЕРЖДАЮ  
Директор филиала ПАБ "Россети Московский регион"  
Южные электрические сети  
И.А. Пиналов  
20 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-332851  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 1179 от 23.04.2026  
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект)      Ступинский (район)      (опруг)      рп. Малино, Донская ул, д.2/1 (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика  
по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 от оп. №1 до оп. №50, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Малино рп, Донская ул, д.2/1 Ю8-24-302-221305(429670)  
(2,892 км; 3 шт. (прочие))

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
<input type="checkbox"/>	Разработка исходно-разрешительной документации	
<input type="checkbox"/>	Оформление земельно-правовых отношений	
<input type="checkbox"/>	Получение ТУ от сторонних организаций	
<input type="checkbox"/>	Выполнение изыскательских работ	
<input type="checkbox"/>	Разработка вариантов основных технических решений	
<input type="checkbox"/>	Разработка технико - экономического обоснования	
<input type="checkbox"/>	Разработка проектной документации	
<input type="checkbox"/>	Выполнение авторского надзора	
<input type="checkbox"/>	Проведение государственной экспертизы	
<input type="checkbox"/>	Строительство на условиях "под ключ"	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение подготовительных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений, «Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Предоставление материалов	по ценам, согласованным с заказчиком
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение шеф-монтажных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение пуско-наладочных работ	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
<input checked="" type="checkbox"/>	Сдача объекта приемочной комиссии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	<input checked="" type="checkbox"/>	да
	<input type="checkbox"/>	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 11 961 388,95 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	9 906 495,70 руб.
Оборудование	1 478 306,31 руб.
ПНР	377 808,20 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	198 778,73 руб.

Условия финансирования:

<input checked="" type="checkbox"/>	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен <u>30</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
<input type="checkbox"/>	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение <u>30*</u> дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
<input type="checkbox"/>	Авансирование предусмотрено в размере: <u>      </u> % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31.12.2026

И.о. заместителя директора по КС - начальник управления

Начальник отдела комплектации оборудованием и материалами

Начальник сметно-договорного отдела УКС

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики

подпись

С.А. Дмитренко

подпись

Е.И. Суханова

подпись

О.В. Кучаева

подпись

О.В. Демушкина

Утверждаю  
Генеральный директор по капитальным  
Филиала ПАО «Россети Мос  
«Южные э  
распределительной сети 0,4

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).  
ПНР выполнены по отдельному договору, ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-332851

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта: Приказ ПСД №1179 от 23.04.23026;

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 от оп. №1 до оп. №50, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПНР, МО, Ступинно го, Малино рп, Донская ул, д.2/1 Ю8-24-302-221305(429670) (2,892 км; 3 шт. (прочие))

СПРАВЧОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР												
Группа затрат	месяц и год составлен сметы	Наименование затрат	Индекс-дефлятор	План Стоимость, рублей								
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие услуги сторонних организаций	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	<b>Итого</b>	н.д.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	7 902 752,74	1 179 295,85	301 390,61	595 107,67	592 962,49	0,00	н.д.	10 571 509,36	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 145,28	317 145,28	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	<b>Итого</b>	н.д.	<b>7 902 752,74</b>	<b>1 179 295,85</b>	<b>301 390,61</b>	<b>595 107,67</b>	<b>592 962,49</b>	<b>317 145,28</b>	н.д.	<b>10 888 654,64</b>	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2 395 504,02	
Смета в текущем уровне цен	12.2025	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>13 284 158,66</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Отдельные сметы, стоимости</b>	н.д.	н.д.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 107,67</b>	н.д.	<b>0,00</b>	<b>595 107,67</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>595 107,67</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Заказываемые объемы</b>	н.д.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	н.д.	<b>595 107,67</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>595 107,67</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Фактические объемы на начало года раскрытия</b>	н.д.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>0,00</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Незаказываемый остаток по договорам</b>	н.д.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 107,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	н.д.	<b>595 107,67</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	130 923,69	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>726 031,36</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Незаказываемый объем сметы год</b>	н.д.	<b>7 902 752,74</b>	<b>1 179 295,85</b>	<b>301 390,61</b>	<b>0,00</b>	<b>592 962,49</b>	<b>317 145,28</b>	н.д.	<b>10 293 546,97</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	н.д.	1,000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Незаказываемые объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС</b>	н.д.	<b>7 902 752,74</b>	<b>1 179 295,85</b>	<b>301 390,61</b>	<b>0,00</b>	<b>592 962,49</b>	<b>317 145,28</b>	н.д.	<b>10 293 546,97</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	2025 год	н.д.	107,400000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	н.д.	105,500000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	н.д.	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	н.д.	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	2029 год	н.д.	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд) год	н.д.	1,031454595547	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	н.д.	1,027500002572	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>Не заказываемые объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС</b>	н.д.	<b>8 151 330,63</b>	<b>1 216 390,12</b>	<b>310 870,73</b>	<b>0,00</b>	<b>609 268,96</b>	<b>327 120,96</b>	н.д.	<b>10 614 981,40</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2 201 256,74	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ВСЕГО с НДС</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>12 816 238,14</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС</b>	н.д.	<b>8 151 330,63</b>	<b>1 216 390,12</b>	<b>310 870,73</b>	<b>595 107,67</b>	<b>609 268,96</b>	<b>327 120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11 210 089,07</b>	
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2 332 180,43	
Затраты на реализацию	н.д.	<b>ВСЕГО с учетом налогов</b>	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	<b>13 542 269,50</b>	

[illegible]

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПНР		Расшифровка "прочих"						Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1.9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы,	Подготовка документации по планировке территории	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	7 902 752,74	1 179 295,85	301 390,61	595 107,67	0,00	392 156,89	200 805,60	317 145,28	0,00	0,00	0,00	10 888 654,64
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"												
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						392 156,89	200 805,60	158 572,64	0,00	0,00	0,00	751 535,13
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	8 120 078,44	1 211 726,49	309 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 933,39	0,00	0,00	0,00	9 804 417,17
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	8 120 078,44	1 211 726,49	309 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 933,39	0,00	0,00	0,00	9 804 417,17
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0,00										0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	8 120 078,44	1 211 726,49	309 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 933,39	0,00	0,00	0,00	9 804 417,17
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	8 120 078,44	1 211 726,49	309 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 933,39	0,00	0,00	0,00	9 804 417,17
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	8 120 078,44	1 211 726,49	309 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	162 933,39	0,00	0,00	0,00	9 804 417,17
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	9 906 495,70	1 478 306,31	377 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	198 778,73	0,00	0,00	0,00	11 961 388,95

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 от оп. №1 до оп. №50, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Малино рп, Донская ул, д.2/1 Ю8-24-302-221305(429670) (2,892 км; 3 шт. (прочие))

Лот: 082-0032997

(указывается предмет закупки)

Начальная (максимальная) цена договора	11 961 388,95	руб., в том числе НДС 22%
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) <a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a>	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



на основании проекта результатов

А. О. Трощенко

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 от оп. №1 до оп. №50, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Малино рп, Донская ул, д.2/1 Ю8-24-302-221305(429670)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 62-Ф-ЮЭС-ПИР от 26.08.2021

Составлен в ценах по состоянию на			2025.12				I-332851
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Реконструкция ВЛЗ	7 158,20971	597,19043	1 179,29585		8 934,69599
Итого: по главе 2			7 158,20971	597,19043	1 179,29585	-	8 934,69599
Итого: по главам 1-2			7 158,20971	597,19043	1 179,29585	-	8 934,69599
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	-			-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			7 158,20971	597,19043	1 179,29585	-	8 934,69599
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1.9%	136,00598	11,34662			147,35260
4	09-01-01	ПНР ВЛЗ				301,39061	301,39061
Итого: по главе 9			136,00598	11,34662	-	301,39061	448,74321
Итого: по главам 1-9			7 294,21569	608,53705	1 179,29585	301,39061	9 383,43920
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				200,80560	200,80560
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				392,15689	392,15689
Итого: по главе 10			-	-	-	592,96249	592,96249
Итого: по главам 1-10			7 294,21569	608,53705	1 179,29585	894,35310	9 976,40169
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 62-Ф-ЮЭС-ПИР от 26.08.2025	Проектные работы				595,10767	595,10767
Итого: по главе 12			-	-	-	595,10767	595,10767
Итого: по главам 1-12			7 294,21569	608,53705	1 179,29585	1 489,46077	10 571,50936
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	218,82647	18,25611	35,37888	44,68382	317,14528
		Итого: Непредвиденные затраты	218,82647	18,25611	35,37888	44,68382	317,14528
		Итого с непредвиденными	7 513,04216	626,79316	1 214,67473	1 534,14459	10 888,65464
	НДС						
9		НДС - 22 %	1 652,86928	137,89450	267,22844	337,51181	2 395,50403
		Итого НДС	1 652,86928	137,89450	267,22844	337,51181	2 395,50403
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	9 165,91144	764,68766	1 481,90317	1 871,65640	13 284,15867

Генеральный директор ООО "Фарад"

м.п.

О.Е. Родионов



## ПРИКАЗ

от

23 04 2026

№

7179

## Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 от оп. №1 до оп. №50, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Малино рп, Донская ул, д.2/1 Ю8-24-302-221305(429670)» (I-332851) по договору № 62-Ф-ЮЭС-ПИР от 26.08.25 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО "Фарад"

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить документацию проекта: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 от оп. №1 до оп. №50, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Малино рп, Донская ул, д.2/1 Ю8-24-302-221305(429670)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-10 кВ	-	2,892 км
Марка провода	-	СИП-3 1х95
Количество опор	-	58 шт. (в т.ч. сложные – 15 шт.)
Стойки	-	СВ110-5, ПТ-45
Разъединитель	-	РЛР Тесла-1-10/630 УХЛ1 (2 шт.)
ИКЗ-В34-МРЗ	-	1 компл.

Общая сметная стоимость в ценах 12.2025 - 10 888,655 тыс. руб.

В том числе:

СМР - 8 139,835 тыс. руб.

Оборудование - 1 214,675 тыс. руб.

Прочие затраты - 1 534,145 тыс. руб.

из них:

ПИР - 612,961 тыс. руб.

Содержание службы заказчика застройки - 610,751 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель директора по капитальному  
строительству начальник управления  
(в соответствии с требованиями  
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)



А.Ю. Трощенко


Рассылается: в дело, УКС, СтРЭС, СРС, ОИПиЭТП, УМКиОЭ

0 614064 442432

О.В. Егорова  
8 (4967) 65-25-28



## МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

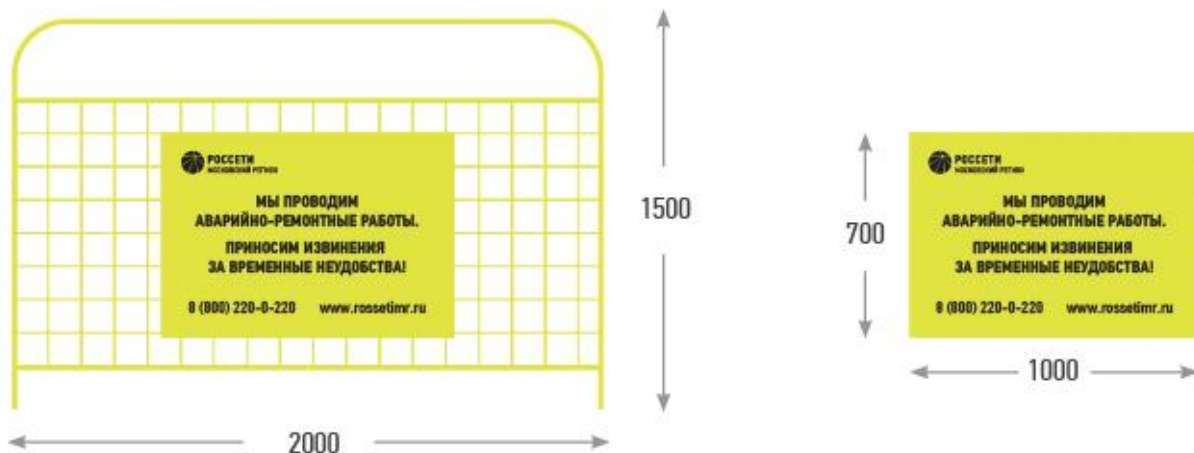

### СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям




Л.В. Душина



# МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)

## ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000x2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

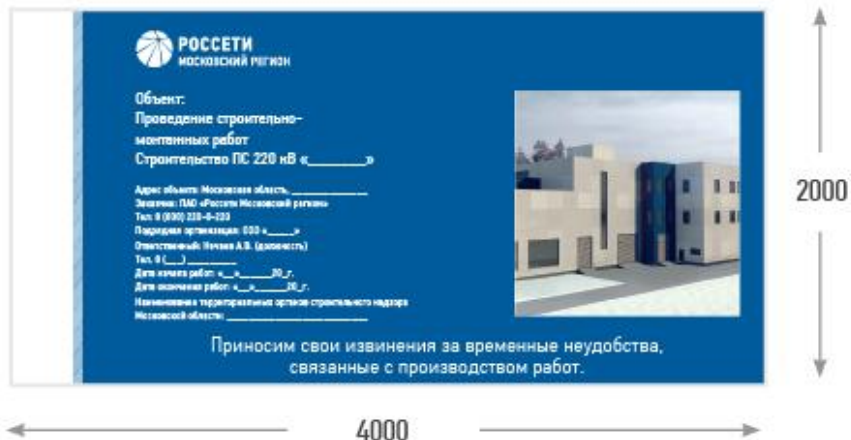

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина
