

Номер закупки: 083-0023262

УТВЕРЖДАЮ
Директор Западных электрических сетей -
филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.В. Вологин
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: 1-334040
(Код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 1715 от 05.06.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ По требованию) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Истринский д. Петровское
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (дополнительный объем)
по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, ВЛ-10 кВ от яч.9 РУ-10 кВ до проектируемой опоры №1, в т.ч. ПНР, МО, Истринский г.о., д. Петровское

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с приложением № 2

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчиком по ценам, согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 17 505 738,11 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.

СМР 17 095 617,90 руб.
Оборудование 12 015,41 руб.
ПНР 123 941,81 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 274 162,98 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости договора подряда

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: _____ 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин
Ф.И.О.

подпись

А.С. Булатова
Ф.И.О.

подпись

А.В. Дудукчян
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования

Утверждаю
Заместитель директора по
капитальному строительству -
начальник управления

" " 2026г.

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
 ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: I-334040

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ №

1715 от 05.06.2026

Наименование инвестиционного проекта:

Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, ВЛ-10 кВ от яч.9 РУ-10 кВ до проектируемой опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План Стоимость, рублей							
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-исследовательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	нд	91 635 557,38	9 683,43	99 886,86	10 232 072,60	5 986 086,18	247 717,90	нд	108 211 004,35
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Непредвиденные расходы	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 330,13	нд	3 246 330,13
Смета в текущем уровне цен	03.2026	Итого	нд	91 635 557,38	9 683,43	99 886,86	10 232 072,60	5 986 086,18	3 494 048,03	нд	111 457 334,48
Смета в текущем уровне цен	03.2026	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	24 520 613,58
Смета в текущем уровне цен	03.2026	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	135 977 948,06
Затраты на реализацию	нд	Отторговано сметн. стоимости	нд	77 857 902,61	0,00	0,00	10 232 072,60	нд	0,00	нд	88 089 975,21
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	88 089 975,21
Затраты на реализацию	нд	Заказанные объемы работ по договору подряда	нд	77 857 902,61	0,00	0,00	10 232 072,60	нд	0,00	нд	88 089 975,21
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	88 089 975,21
Затраты на реализацию	нд	Фактические объемы на начало года раскрытия	нд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00
Затраты на реализацию	нд	Незавтраженный остаток по договорам	нд	77 857 902,61	0,00	0,00	10 232 072,60	0,00	0,00	нд	88 089 975,21
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	19 379 794,55
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	107 469 769,76
Затраты на реализацию	нд	Индекс директивного снижения	нд	1,000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	23 367 359,27
Затраты на реализацию	нд	Незавтраженные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	нд	13 777 654,77	9 683,43	99 886,86	0,00	5 986 086,18	3 494 048,03	нд	23 367 359,27
Затраты на реализацию	нд	2026 год	нд	105,500000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2027 год	нд	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2028 год	нд	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2029 год	нд	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2030 год	нд	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	2031 год	нд	104,100000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (подряд) год	нд	1,01706725775500	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	индекс приведения объемов по освоению в п.п. (собственные) год	нд	1,00000000000000	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
Затраты на реализацию	нд	Не заказанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	нд	14 012 801,56	9 848,70	101 591,65	0,00	5 986 086,18	3 553 681,85	нд	23 664 009,94
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3 889 143,23
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с НДС	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	27 553 153,17
Затраты на реализацию	нд	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	нд	91 843 864,79	9 848,70	101 591,65	10 232 072,60	5 986 086,18	3 553 681,85	0,00	111 727 145,77
Затраты на реализацию	нд	кроме того НДС начисленный	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	23 263 033,12
Затраты на реализацию	нд	ВСЕГО с учетом налогов	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	134 990 178,89

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	1 кв	Не заоконтрактанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	14 012 801,56	9 848,70	101 591,65	0,00	4 017 439,28	1 968 646,90	3 301 736,08	251 945,77	23 664 009,94
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2026	-	Не заоконтрактанные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	14 012 801,56	9 848,70	101 591,65	0,00	0,00	0,00	224 723,75	0,00	14 348 965,66
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											
№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.		
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):		
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	13 777 654,77	9 683,43	99 886,86	0,00	545 767,94	297 186,62	441 905,39	0,00	15 172 085,01		
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000		
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000		
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000		
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000		
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	545 767,94	297 186,62	220 952,70	0,00	1 063 907,26		
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства	14 156 540,28	9 949,72	102 633,75	0,00	0,00	0,00	227 028,89	0,00	14 496 152,64		
	2026	14 156 540,28	9 949,72	102 633,75	0,00	0,00	0,00	227 028,89	0,00	14 496 152,64		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах									0,00		
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	14 156 540,28	9 949,72	102 633,75	0,00	0,00	0,00	227 028,89	0,00	14 496 152,64		
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,989846479594	0,989846479594	0,989846479594	0,989846479594	0,989846479594	0,989846479594	0,989846479594	0,989846479594			
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	14 012 801,56	9 848,70	101 591,65	0,00	0,00	0,00	224 723,75	0,00	14 348 965,66		
	2026	14 012 801,56	9 848,70	101 591,65	0,00	0,00	0,00	224 723,75	0,00	14 348 965,66		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС	17 095 617,90	12 015,41	123 941,81	0,00	0,00	0,00	274 162,98	0,00	17 505 738,11		

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС



Дудукян А.В.

" " 2026г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (дополнительный объем) по титулу:
Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, ВЛ-10 кВ от яч.9
РУ-10 кВ до проектируемой опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское

Лот: 083-0023262

Начальная (максимальная) цена договора	17 505 738,11	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	

"УТВЕРЖДАЮ"

Приложение № 2 к ТЗ на торги

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.В.Рогожкин
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

по объекту:

«Строительство КЛ-10 кВ от П С-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)»

(наименование стройки, объекта)

Договор № 10-33С-РМР557-2026 от 27.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

1-334040



ЗПК

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
6	ЛС № 02-01-03	Строительство КЛ-10 (методом ГНБ)	8 016,97952	4 982,27135	-	-	12 999,25087
7	ЛС № 02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ (по конструкциям)	11,55222	108,57561	-	-	120,12783
8	ЛС № 02-01-05	Строительство ВЛЗ-10кВ	55,80618	15,80080	9,68343	-	81,29041
Итого: по главе 2			8 084,33792	5 106,64776	9,68343	-	13 200,66911
Итого: по главам 1-2			8 084,33792	5 106,64776	9,68343	-	13 200,66911
Глава 8. Временные здания и сооружения							
9	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения - 2,5%	202,10845	127,66619	-	-	329,77464
Итого: по главе 8			202,10845	127,66619	-	-	329,77464
Итого: по главам 1-8			8 286,44637	5 234,31395	9,68343	-	13 530,44375
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% (КЛ, ВЛ)	157,44248	99,45197	-	-	256,89445
11	ЛС № 09-01-01	ПНР КЛ-10кВ	-	-	-	81,13842	81,13842
12	ЛС № 09-01-02	ПНР ВЛЗ-10кВ	-	-	-	18,74844	18,74844
Итого: по главе 9			157,44248	99,45197	-	99,88686	356,78131
Итого: по главам 1-9			8 443,88885	5 333,76592	9,68343	99,88686	13 887,22506
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
13	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	297,18662	297,18662
14	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	545,76794	545,76794
Итого: по главе 10			-	-	-	842,95456	842,95456
Итого: по главам 1-10			8 443,88885	5 333,76592	9,68343	942,84142	14 730,17962
Итого: по главам 1-12			8 443,88885	5 333,76592	9,68343	942,84142	14 730,17962
Непредвиденные затраты							
17	ПЦСН-2020 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	253,31667	160,01298	0,29050	28,28524	441,90539
		Итого: Непредвиденные затраты	253,31667	160,01298	0,29050	28,28524	441,90539
		Итого с непредвиденными	8 697,20552	5 493,77890	9,97393	971,12666	15 172,08501
НДС							
18	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	НДС - 22 %	1 913,38521	1 208,63136	2,19426	213,64787	3 337,85870
		Итого НДС	1 913,38521	1 208,63136	2,19426	213,64787	3 337,85870
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	10 610,59073	6 702,41026	12,16819	1 184,77453	18 509,94371

Генеральный директор ООО "АКОМ"

М.П.

И.С.Шебанов

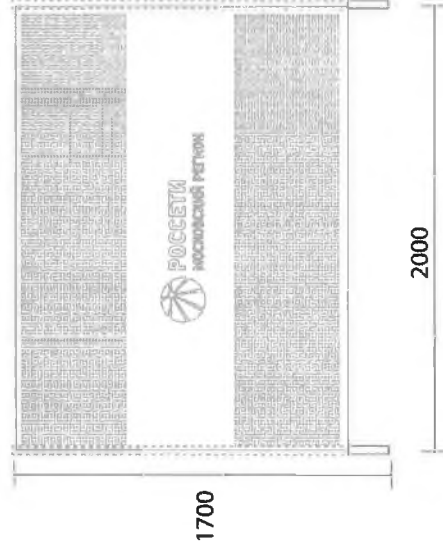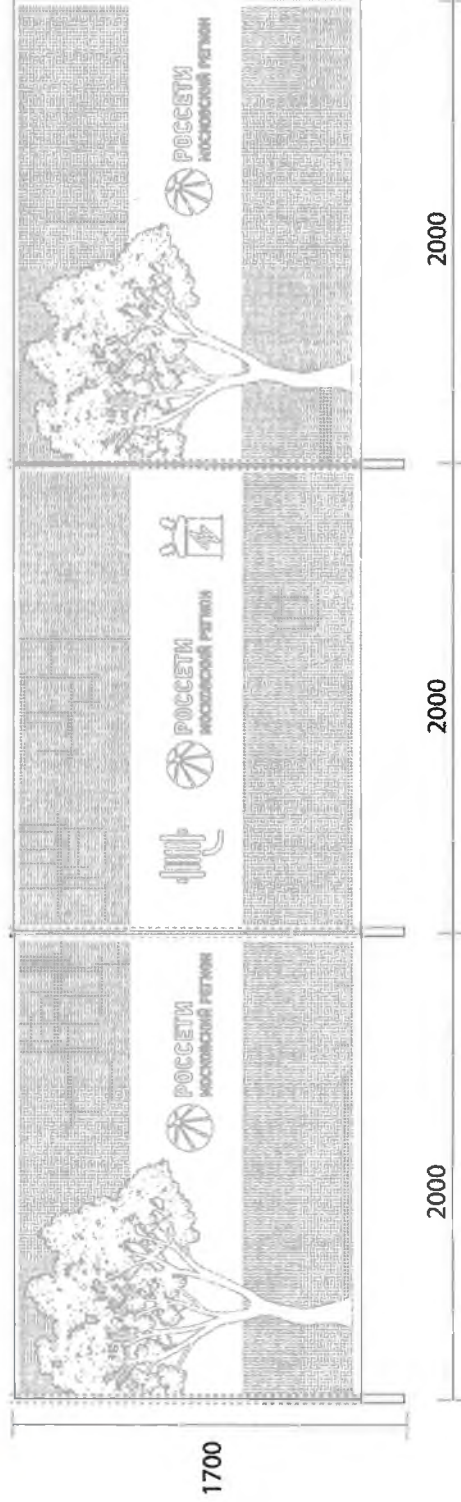

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Вариант 4



Л.В. Душеина

Директор по внешним коммуникациям

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

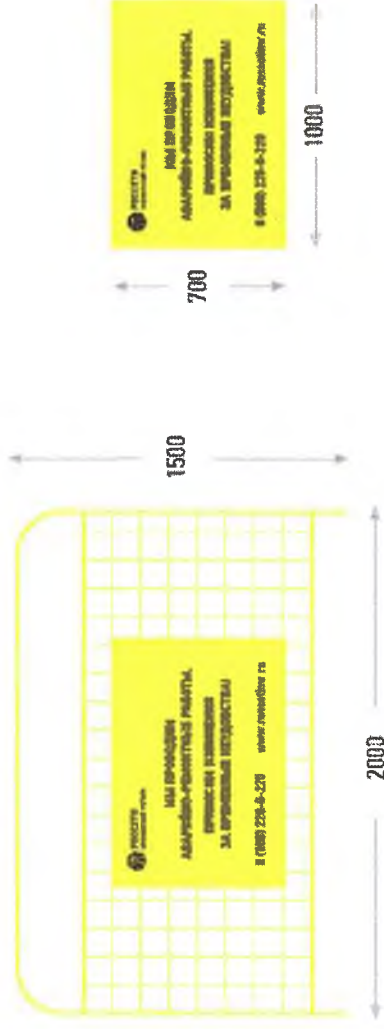

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.


2000

2000

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:

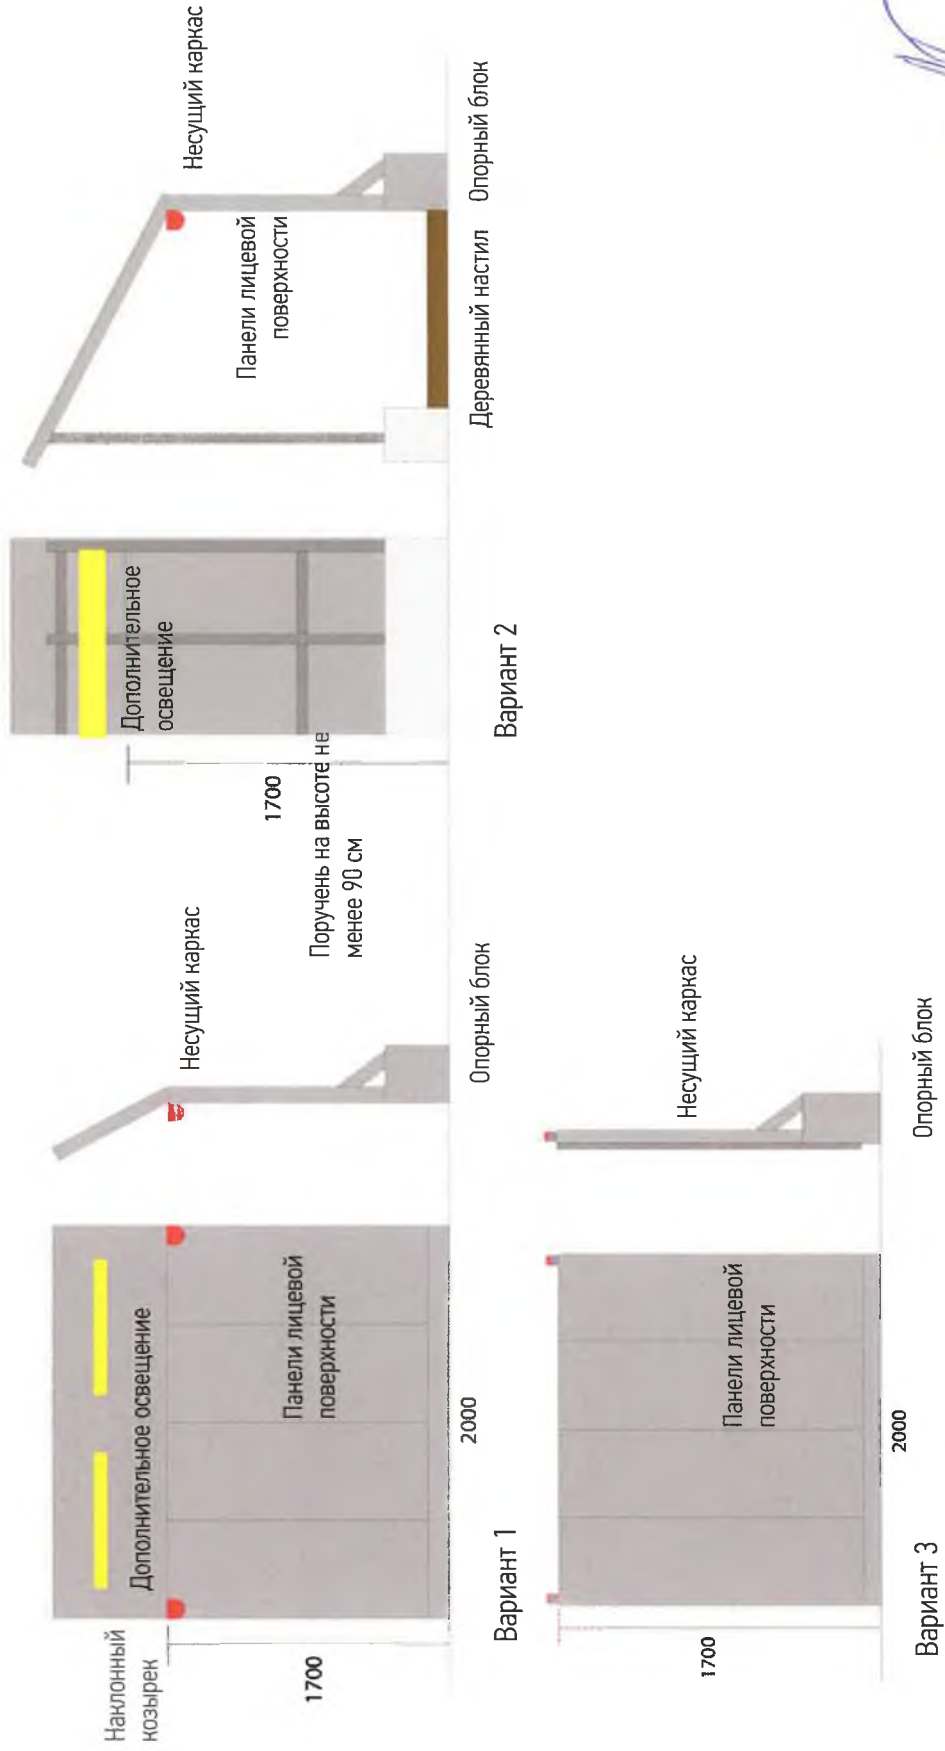

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ
(ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)**



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

ПРИКАЗ

от 05.06.2026№ 1715

Об утверждении рабочего проекта (I-334040)

В соответствии с согласованием Западных ЭС- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)», разработанную ООО «АКОМ» со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Технические показатели:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.1. Кабель АСБл-3х240 | - 8,492 км. |
| 1.2. Протяженность линии КЛ-10 кВ | - 8,300 км. |
| в том числе ГНБ | - 1,366 км. |
| 1.3. Провод СИПЗ 1х120 | - 0,033 км. |
| 1.4. Протяженность линии ВЛ-10 кВ | - 0,007 км. |
| 1.5. Стойка СВ110-5 | - 1 шт. |

2. Стоимость строительства в текущих ценах – 111457,33448 тыс. руб.,

в том числе:

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 2.1. СМР | - 94384,62410 тыс. руб. |
| 2.2. Оборудование | - 9,97393 тыс. руб. |
| 2.3. Прочие затраты | -17062,73645 тыс. руб., в том числе: |
| 2.4. ПИР | - 10232,07260 тыс. руб. |

3. Продолжительность строительства - 1 мес.

Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО «АКОМ».

Исп. О.Н. Тюкин
(495)525-73-00(23-85)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.В.Рогожин
2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

по объекту:

«Строительство КЛ-10 к В о т П С-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.)»

(наименование стройки, объекта)

Договор № 10-3ЭС-РМР557-2026 от 27.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Смета № 01-01-01	Вынос трассы				190,57504	190,57504
2	Д/с №10 от 27.04.26г. к Договору №12/03-24 от 11.03.24г.	Публичный сервитут	-	-	-	19,04762	19,04762
2	Д/с №9 от 16.04.26г. к Договору №12/03-24 от 11.03.24г.	Публичный сервитут	-	-	-	38,09524	38,09524
Итого: по главе 1			-	-	-	247,71790	247,71790
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС № 02-01-01	Строительство КЛ-10 кВ (открыто в траншее)	7 704,16585	27 004,06677			34 708,23262
3	ЛС № 02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ (в трубах открыто)	441,66916	1 181,10024			1 622,76940
4	ЛС № 02-01-03	Строительство КЛ-10 (методом ГНБ)	46 008,91781	5 201,95064			51 210,86845
5	ЛС № 02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ (по конструкциям)	11,55222	108,57561			120,12783
6	ЛС № 02-01-05	Строительство ВЛЗ-10кВ	55,80618	15,80080	9,68343		81,29041
Итого: по главе 2			54 222,11122	33 511,49406	9,68343	-	87 743,28871
Итого: по главам 1-2			54 222,11122	33 511,49406	9,68343	247,71790	87 991,00661
Глава 8. Временные здания и сооружения							
7	МОС.05.05-006.2022, табл. В1, п.2.3	Временные здания и сооружения - 2,5%	1 355,55278	837,78735	-	-	2 193,34013
Итого: по главе 8			1 355,55278	837,78735	-	-	2 193,34013
Итого: по главам 1-8			55 577,66400	34 349,28141	9,68343	247,71790	90 184,34674
Глава 9. Прочие работы и затраты							
8	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9% (КЛ, ВЛ)	1 055,97562	652,63635			1 708,61197
9	ЛС № 09-01-01	ПНР КЛ-10кВ				81,13842	81,13842
10	ЛС № 09-01-02	ПНР ВЛЗ-10кВ				18,74844	18,74844
Итого: по главе 9			1 055,97562	652,63635	-	99,88686	1 808,49883
Итого: по главам 1-9			56 633,63962	35 001,91776	9,68343	347,60476	91 992,84557
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	1 968,64690	1 968,64690
12	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	4 017,43928	4 017,43928
Итого: по главе 10			-	-	-	5 986,08618	5 986,08618
Итого: по главам 1-10			56 633,63962	35 001,91776	9,68343	6 333,69094	97 978,93175
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Сводная смета	Проектные работы	-	-	-	10 191,54510	10 191,54510
14	Сводная согласований.	Согласования				40,52750	40,52750
Итого: по главе 12			-	-	-	10 232,07260	10 232,07260
Итого: по главам 1-12			56 633,63962	35 001,91776	9,68343	16 565,76354	108 211,00435
Непредвиденные затраты							
15	ПЧСН-2020 МО, п.37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	1 699,00919	1 050,05753	0,29050	496,97291	3 246,33013
Итого: Непредвиденные затраты			1 699,00919	1 050,05753	0,29050	496,97291	3 246,33013
Итого с непредвиденными			58 332,64881	36 051,97529	9,97393	17 062,73645	111 457,33448
НДС							
16	Федеральный закон от 28.11.2025 №425-ФЗ	НДС - 22 %	12 833,18274	7 931,43456	2,19426	3 753,80202	24 520,61358
Итого НДС			12 833,18274	7 931,43456	2,19426	3 753,80202	24 520,61358
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			71 165,83155	43 983,40985	12,16819	20 816,53847	135 977,94806



Генеральный директор ООО "АКОМ"

И.С.Шебанов
