

Номер закупки: 085-00 16246

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»

С.Р. Кабиров
"04" 09 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Московские кабельные сети

Код SAP: I-355390
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3956 от 13.08.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Москва 7 ЮВАО г. Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2)
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены
ошиновки тр-ов, т.ч ПИР: г. Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2)

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	По ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Подрядчик предоставляет строительные материалы согласно проектно-сметной документации, а также обеспечивает складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☐	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик совместно с Заказчиком: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 4 897 250.80 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0.00 руб.
СМР	1 624 344.60 руб.
Оборудование	3 039 312.80 руб.
ПНР	152 634.20 руб.
Прочие	0.00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	80 959.20 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости договора. Авансовый платеж выплачивается в течение 1 рабочего дня на основании счета на оплату.

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: «17» декабря 2026г.


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству филиал
ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»



А.И. Челнаков

Начальник отдела торгово-закупочных процедур



А.В. Хмарук

Челнаков А.И.

Пир выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

13.08.2026

: 1-355390

eq. 2)

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного вклада в прогнозируемое изменение цен в соответствии с утвержденной ИПР - проектом корректировки ИПР												
Группа затрат		Месяц и год составления сметы		Наименование затрат		%		Стоимость, рублей				
								План	10	11	12	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Группа затрат	Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	мл	86 050,00	3 720,00	328 660,00	29 466,00	14 700,40	0,00	0,00	462 600,00
	Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредельные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880,00	мл	13 880,00
	Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	мл	86 050,00	3 720,00	328 660,00	29 466,00	14 700,40	13 880,00	мл	476 480,00
	Смета в текущем уровне цен	01.2000	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	104 825,60
	Смета в текущем уровне цен	01.2000	БСГО и НДС	мл	1 331 430,00	125 110,00	2 491 240,00	237 426,00	135 760,40	0,00	мл	581 386,00
	Смета в текущем уровне цен	07.2026	Непредельные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мл	0,00
	Смета в текущем уровне цен	07.2026	Итого	мл	1 331 430,00	125 110,00	2 491 240,00	237 426,00	135 760,40	0,00	мл	132 720,00
	Смета в текущем уровне цен	07.2026	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	4 656 680,00
	Смета в текущем уровне цен	07.2026	БСГО и НДС	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	1 002 460,00
	Затраты на реализацию	мл	Отсроченные сметы, стоимостный	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мл	5 559 149,60
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	337 420,00
	Затраты на реализацию	мл	БСГО и НДС	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	337 420,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	337 420,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	БСГО и НДС	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	337 420,00
	Затраты на реализацию	мл	Фактические расходы на начало года	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	БСГО и НДС	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	337 420,00
	Затраты на реализацию	мл	Непредельные расходы	мл	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	74 232,40
	Затраты на реализацию	мл	БСГО и НДС	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	411 652,40
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	132 720,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	4 219 560,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	4 219 560,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
Группа затрат	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00
	Затраты на реализацию	мл	Затраты на реализацию	мл								

Год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ТИР	Расшифровка "Проект"			Итого: руб.
						Создание здания	Структурный интерьер	Прочие в составе 1-й главы (ССТ)	
2026	3 кв	1 339 618.29	2 506 561.13	125 879.43	0.00	54 280.00	84 480.00	133 536.23	4 244 355.08
2026	-	1 339 618.29	2 506 561.13	125 879.43	0.00	0.00	0.00	66 768.11	4 038 826.96
Есть									

Матр	Наименование	Расшифровка ПНР		Расшифровка "Проект"				Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ТИР	Создание здания	Структурный интерьер	
1	Стоимость строительства по ССТ в ценах на дату составления сметной документации	1 331 430.00	2 491 240.00	125 110.00	337 420.00	0.00	54 280.00	133 750.00
2	Индикаторы Минкомразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827	106.826398641827
	2019/2018	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957	105.56185224957
	2020/2019	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000	104.93540000000
	2021/2020	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594	114.631427330594
	2022/2021	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827	109.09466260827
	2023/2022	108.14000000000	108.14000000000	108.14000000000	108.14000000000	108.14000000000	108.14000000000	108.14000000000
	2024/2023	107.40000000000	107.40000000000	107.40000000000	107.40000000000	107.40000000000	107.40000000000	107.40000000000
	2025/2024	105.50000000000	105.50000000000	105.50000000000	105.50000000000	105.50000000000	105.50000000000	105.50000000000
	2026/2025	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000
	2027/2026	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000
	2028/2027	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000
	2029/2028	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000	104.10000000000
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства	1 331 430.00	2 491 240.00	125 110.00	337 420.00	0.00	54 280.00	66 360.00
4	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2027	1 331 430.00	2 491 240.00	125 110.00	0.00	0.00	0.00	66 360.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах		0.00					
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости	1 331 430.00	2 491 240.00	125 110.00	0.00	0.00	0.00	66 360.00
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000	1.000000000000
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	1 331 430.00	2 491 240.00	125 110.00	0.00	0.00	0.00	66 360.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2027	1 331 430.00	2 491 240.00	125 110.00	0.00	0.00	0.00	66 360.00
	2028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	1 624 344.60	3 039 312.89	152 694.20	0.00	0.00	0.00	80 959.20
	Итого: руб.							

Главный специалист ОТЗ/И Бюро ПАО «Россети Московский регион» - «Московские электрические сети»

Аппен В.Т. 02.09.2026

Сводный сметный расчет

ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, т.ч ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2) для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

SAP I-355390

в ценах на III квартал 2026 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	Сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудовани	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630кВА	33,28	1 278,47	2 491,24	-	3 802,99
Итого по главе 2			33,28	1 278,47	2 491,24	-	3 802,99
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,50	19,18	-	-	19,68
Итого по главе 8			0,50	19,18	-	-	19,68
Итого по главам 1-8			33,78	1 297,65	2 491,24	-	3 822,67
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ТП	-	-	-	125,11	125,11
Итого по главе по 9			-	-	-	125,11	125,11
Итого по главам 1-9			33,78	1 297,65	2 491,24	125,11	3 947,78
Глава 10. Строительный контроль							
4	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	84,48	84,48
5	Приказ МКЭ №80 от 29.08.2014г.	Затраты на содержание службы заказчика I, 375% (I,25% с К=1,1 от гл. 1-9)	-	-	-	54,28	54,28
Итого по главе 10			-	-	-	138,76	138,76
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
6	Сводная смета на ПИР	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-
7	Сводная смета на ПИР	Согласование и услуги	-	-	-	20,35	20,35
8	Сводная смета на ПИР	Проектные работы	-	-	-	317,07	317,07
Итого по главе 12			-	-	-	337,42	337,42
Итого по главам 1-12			33,78	1 297,65	2 491,24	601,29	4 423,96
9	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%	1,01	38,93	74,74	18,04	132,72
10		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	34,79	1 336,58	2 565,98	619,33	4 556,68
11	Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ	Налог на добавленную стоимость 22%	7,65	294,05	564,52	136,25	1 002,47
12		Всего по сводной смете в ценах на III квартал 2026 г.	42,44	1 630,63	3 130,50	755,58	5 559,15

Генеральный директор
ООО "ЕВРОСТРОЙ"

Юдин М. С.



I-355390
(Табель)

"Пир" - договор

КВЛ = 6507,5 тыс.руб.

Евгений / Юдин

М.С. Юдин

Сводный сметный расчет

ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, т.ч ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.б, к.1 (уч.2) для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

SAP I-355390

в базовых ценах на 2000 г.

№ п/п	№ сметы	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	сметная ст-ть, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС №02-01-01	Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с	1,98	82,80	328,66	-	413,44
Итого по главе 2			1,98	82,80	328,66	-	413,44
Глава 8. Временные разбираемые здания и сооружения							
2	МОС.05.05-006.2022, табл. В1,п.2.3	Временные здания и сооружения 1,5 %	0,03	1,24	-	-	1,27
Итого по главе 8			0,03	1,24	-	-	1,27
Итого по главам 1-8			2,01	84,04	328,66	-	414,71
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ЛС №09-01-01	Пусконаладочные работы ТП	-	-	-	3,73	3,73
Итого по главе по 9			-	-	-	3,73	3,73
Итого по главам 1-9			2,01	84,04	328,66	3,73	418,44
Глава 10. Строительный контроль							
4	Пост. Прав. РФ № 468 от 21.06.2010 г.	Строительный контроль - 2,14%	-	-	-	8,95	8,95
5	Приказ МКСЭ №80 от 29.08.2014г.	Затраты на содержание службы заказчика 1, 375% (1,25% с К=1,1 от гл. 1-9)	-	-	-	5,75	5,75
Итого по главе 10			-	-	-	14,70	14,70
Глава 12. Проектно-изыскательные работы и авторский надзор							
6	Сводная смета на ПИР	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	-	-
7	Сводная смета на ПИР	Согласование и услуги	-	-	-	1,78	1,78
8	Сводная смета на ПИР	Проектные работы	-	-	-	27,68	27,68
Итого по главе 12			-	-	-	29,46	29,46
Итого по главам 1-12			2,01	84,04	328,66	47,89	462,60
9	ТСН-2001.12 п. 2.4.17	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	0,06	2,52	9,86	1,44	13,88
10		Всего по сводной смете с непредвиденными расходами	2,07	86,56	338,52	49,33	476,48


Генеральный директор
ООО "ЕВРОСТРОЙ"



Юдин М. С.



(Табур.)
I - 355390
"ПНР" - готово
КВЛ = 6307,51 руб/шт

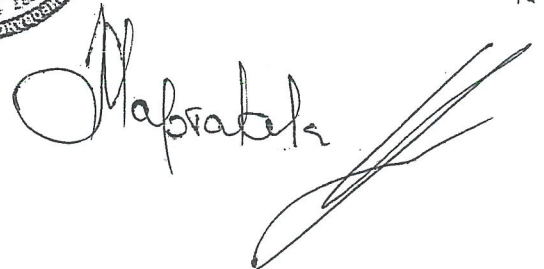


ПРИКАЗ

от 13 АВГ 2026

№ 3956

Об утверждении рабочего проекта


В соответствии с согласованием проектно-сметной документации, выполненной с соблюдением требований государственных норм, правил и стандартов, отвечающую требованиям исходных данных
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект: «Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, т.ч ПИР: г. Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2)» (SAP I-355390), со следующими технико-экономическими показателями:

Тип трансформатора	- ТМГ
Количество и мощность трансформаторов	- 2х1000кВА
Марка кабеля	- АПвВнг-LS 1х240/50- 10кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,020 км
Марка кабеля	- ВВГнг-LS 1х300 - 0,4кВ
Протяженность кабельных линий	- 0,140 км
Общая сметная стоимость в ценах 2000 года (без НДС)	
составляет:	- 476,48 тыс. руб.
В том числе: СМР	- 88,63 тыс. руб.
Оборудование	- 338,52 тыс. руб.
Прочие затраты	- 49,33 тыс. руб.
Из них ПИР	- 29,46 тыс. руб.

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству Челнакова А.И.

Директор департамента
капитального строительства



Д.С. Силаев

Рассылается: Маслиховой М.В., Челнакову А.И., Прохоровой О.Н., Гусеву С.В., Похлебкиной И.В., Хмаруку А.В.; Демаковой Е.Г., Ракитиной Т.С.

О.Б. Мартакова
(495) 668-22-28 (56-86)



По лоту № 085-00 **16246**

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по
капитальному строительству

филиала ПАО «Россети Московский регион»-Московские кабельные сети

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text of the official position.

А.И. Челнаков
