Номер закупки: 082-0039722

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"
Южные электрические сети
_____ И.А. Пиналов
"___"_____20____г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-357255
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2910 от 25.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) | (район) | г.о. Раменский (округ) | (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)

Объем работ (услуг) по лоту: ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

	Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
	☐	Оформление земельно-правовых отношений	
	☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектной документации		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной эспертизы		
☐	Строительство на условиях "под ключ"		
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами а также с учетом соблюдения любых соглашений,«Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ».
	☑	Выполнение монтажных работ	
	☑	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "Используемым" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☑	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "Используемыми" по ценам, согласованным с заказчиком.
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Подрядчик:- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта приемочной комиссии, сдает заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиПами, пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☑	**да**
	☐	**нет**

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:


Начальная цена лота: **1 109 497,99 руб.** **с НДС, в том числе НДС 22%**

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	983 687,13 руб.
Оборудование	46 345,08 руб.
ПНР	79 465,77 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.


Условия финансирования:

☑	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течен **30** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП	
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	**30*** дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	**%** от стоимости…….


Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31.03.2027



Заместитель директора по КС - начальник управления подпись **С.А. Дмитренко**



Начальник сметно-договорного отдела УКС подпись **О.В. Кучаева**



Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики подпись **О.В. Демушкина**

Приложение № 3 к методическим указаниям по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства ПАО "Россети Московский регион".
Пример расчета предельной стоимости лота "СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком",
в т.ч.распредсеть (ПСД разработана), ПИР выполнены по отдельному договору.



Заместитель директора по капитальному строительству ЮЭС - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже) .
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного п I-357255 **Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:** Приказ ПСД №2910 от 25.09.2026

нование инвестиционного проекта: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)

СПРАВОЧНО: расчет оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответсвии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				**Итого: руб.**
								Содержание заказчика	**Строительный контроль**	**Резерв средств на непредвиденные работы и затраты**	**прочие (в составе 1,9 главы ССР)**	**(без НДС):**
	2026	1 кв	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	806 300,93	37 987,77	65 135,88	0,00	35 740,39	19 461,69	28 938,79	0,00	993 565,45
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС **(без учета затрат Заказчика)**	806 300,93	37 987,77	65 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 424,58
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											

№п/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Расшифровка ПИР		Расшифровка "прочих"						**Итого: руб.**
					ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на	Подготовка документации по планировке территории	**(без НДС):**
1	**Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации**	806 300,93	37 987,77	65 135,88	0,00	0,00	35 740,39	19 461,69	28 938,79	0,00	0,00	0,00	993 565,45
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в												
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00		35 740,39	19 461,69	28 938,79	0,00	0,00	0,00	**84 140,87**
4	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства**	**868 085,75**	**40 898,68**	**70 127,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979 111,51**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	868 085,75	40 898,68	70 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**979 111,51**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах												**0,00**
6	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости**	868 085,75	40 898,68	70 127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**979 111,51**
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	0,92882636	

8	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат**	806 300,93	37 987,77	65 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**909 424,58**
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2027	806 300,93	37 987,77	65 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**909 424,58**
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
9	**Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС**	**983 687,13**	**46 345,08**	**79 465,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 109 497,99**

*Если уровень текущих цен определен в ценах на какую-либо дату после 1 квартала соответствующего года (например, в ценах II, III, IV квартала), индекс-дефлятор на данный год не учитывается.

**Сравнение стоимости лота выполняется с незаконтрактованным остатком в прогнозном уровне цен

***В случае, если суммарная стоимость всех объемов закупок ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$), с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному титулу, превышает оценку полной стоимости инвестиционного проекта (ПСТ ИП) без учета затрат Заказчика ($C_{ЗАК}$) без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат может осуществляться по лоту в целом или по статьям затрат ($C_{ПИР}$, $C_{СМР}$, $C_{ОБОРУД}$). Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат не применяется на этапах формирования договорной цены и стоимости выполненных работ.

Начальник СДО УКС Кучаева О В  29.10.2026

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Южные электрические сети

ПРИКАЗ

от 25.09.2026 № 2910

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)» (I-357255) по договору № 11-357255 от 18.03.2026 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО ТД "Техностройторг"
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	-	0,530 км (по сущ. опорам)
Марка провода	-	СИП-2 3х95+1х95
Количество опор	-	5 шт. (в т.ч. сложных – 3 шт.)
Стойки	-	СВ 95-3
Автоматический выключатель	-	ВА 57-39 320А
Общая сметная стоимость в ценах 06.2026	-	1 449,887 тыс. руб.
В том числе:		
СМР	-	1 234,354 тыс. руб.
Оборудование	-	39,127 тыс. руб.
Прочие затраты	-	176,406 тыс. руб.
из них:		
ПИР	-	26,886 тыс. руб.
Содержание службы заказчика застройки	-	82,429 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный специалист отдела проектно-изыскательских работ управления капитального строительства
(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ) А.Д. Баёв

0 614068 131141 Рассылается: в дело, УКС, РРЭС, СРС, ОИП

0 614068 131141

Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»

С.А.Дмитренко

202_ г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 11-357255 от 18.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на **2026.03** **I-357255**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**368,84549**	**6,55940**	**-**		375,40489
		Итого: по главе 2	*368,84549*	*6,55940*	-	-	*375,40489*
		Итого: по главам 1-2	***368,84549***	***6,55940***	**-**	**-**	***375,40489***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**9,22114**	**0,16399**			9,38513
		Итого: по главе 8	*9,22114*	*0,16399*	-	-	*9,38513*
		Итого: по главам 1-8	***378,06663***	***6,72339***	**-**	**-**	***384,79002***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**7,18327**	**0,12774**			7,31101
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**-**	-
		Итого: по главе 9	*7,18327*	*0,12774*	-	-	*7,31101*
		Итого: по главам 1-9	***385,24990***	***6,85113***	**-**	**-**	***392,10103***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**8,39096**	8,39096
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**16,43545**	16,43545
		Итого: по главе 10	-	-	-	*24,82641*	*24,82641*
		Итого: по главам 1-10	***385,24990***	***6,85113***	**-**	***24,82641***	***416,92744***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 11-357255 от 18.03.2026	Проектные работы				**26,10380**	26,10380
		Итого: по главе 12	-	-	-	*26,10380*	*26,10380*
		Итого: по главам 1-12	***385,24990***	***6,85113***	**-**	***50,93021***	***443,03124***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**11,55750**	**0,20553**	**-**	**1,52791**	13,29094
		Итого: Непредвиденные затраты	11,55750	0,20553	-	1,52791	13,29094
		Итого с непредвиденными	***396,80740***	***7,05666***	**-**	***52,45812***	***456,32218***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**87,29763**	**1,55247**	**-**	**11,54079**	***100,39089***
		Итого НДС	***87,29763***	***1,55247***	**-**	***11,54079***	***100,39089***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***484,10503***	***8,60913***	**-**	***63,99891***	**556,71307**

М.П.

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"

С.В. Дрожжкина

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»
_____ С.А.Дмитренко
_____ 202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 11-357255 от 18.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на **2026.03** **I-357255**

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**632,55144**	**139,41622**	**37,98777**		809,95543
		Итого: по главе 2	*632,55144*	*139,41622*	*37,98777*	-	*809,95543*
		Итого: по главам 1-2	***632,55144***	***139,41622***	***37,98777***	**-**	***809,95543***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**15,81379**	**3,48541**			19,29920
		Итого: по главе 8	*15,81379*	*3,48541*	-	-	*19,29920*
		Итого: по главам 1-8	***648,36523***	***142,90163***	***37,98777***	**-**	***829,25463***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**12,31894**	**2,71513**			15,03407
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**65,13588**	65,13588
		Итого: по главе 9	*12,31894*	*2,71513*	-	*65,13588*	*80,16995*
		Итого: по главам 1-9	***660,68417***	***145,61676***	***37,98777***	***65,13588***	***909,42458***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**19,46169**	19,46169
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**35,74039**	35,74039
		Итого: по главе 10	-	-	-	*55,20208*	*55,20208*
		Итого: по главам 1-10	***660,68417***	***145,61676***	***37,98777***	***120,33796***	***964,62666***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 11-357255 от 18.03.2026	Проектные работы				**-**	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	***660,68417***	***145,61676***	***37,98777***	***120,33796***	***964,62666***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**19,82052**	**4,36850**	**1,13963**	**3,61014**	28,93879
		Итого: Непредвиденные затраты	19,82052	4,36850	1,13963	3,61014	28,93879
		Итого с непредвиденными	***680,50469***	***149,98526***	***39,12740***	***123,94810***	***993,56545***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**149,71102**	**32,99676**	**8,60803**	**27,26858**	***218,58439***
		Итого НДС	***149,71102***	***32,99676***	***8,60803***	***27,26858***	***218,58439***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***830,21571***	***182,98202***	***47,73543***	***151,21668***	**1 212,14984**

М.П.
Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" _____ С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский

_____ С.А. Дмитренко

"___" _____ 2026

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2360, ПС №119 "Алешино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-287050(103691)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 11-357255 от 18.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на **2026.06** **I-357255**


№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Глава 1. Подготовка территории строительства						
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
	Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	**1 001,39693**	**145,97562**	**37,98777**		1 185,36032
		Итого: по главе 2	*1 001,39693*	*145,97562*	*37,98777*	-	*1 185,36032*
		Итого: по главам 1-2	***1 001,39693***	***145,97562***	***37,98777***	-	***1 185,36032***
	Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	**25,03492**	**3,64939**			28,68431
		Итого: по главе 8	*25,03492*	*3,64939*	-	-	*28,68431*
		Итого: по главам 1-8	***1 026,43185***	***149,62501***	***37,98777***	-	***1 214,04463***
	Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	**19,50221**	**2,84288**			22,34509
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				**65,13588**	65,13588
		Итого: по главе 9	*19,50221*	*2,84288*	-	*65,13588*	*87,48097*
		Итого: по главам 1-9	***1 045,93406***	***152,46789***	***37,98777***	***65,13588***	***1 301,52560***
	Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия						
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				**27,85265**	27,85265
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				**52,17584**	52,17584
		Итого: по главе 10	-	-	-	*80,02849*	*80,02849*
		Итого: по главам 1-10	***1 045,93406***	***152,46789***	***37,98777***	***145,16437***	***1 381,55409***
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Договор № 11-357255 от 18.03.2026	Проектные работы				**26,10380**	26,10380
		Итого: по главе 12	-	-	-	*26,10380*	*26,10380*
		Итого: по главам 1-12	***1 045,93406***	***152,46789***	***37,98777***	***171,26817***	***1 407,65789***
	Непредвиденные затраты						
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	**31,37802**	**4,57404**	**1,13963**	**5,13805**	42,22974
		Итого: Непредвиденные затраты	31,37802	4,57404	1,13963	5,13805	42,22974
		Итого с непредвиденными	***1 077,31208***	***157,04193***	***39,12740***	***176,40622***	***1 449,88763***
	НДС						
9		НДС - 22 %	**237,00866**	**34,54922**	**8,60803**	**38,80937**	***318,97528***
		Итого НДС	***237,00866***	***34,54922***	***8,60803***	***38,80937***	***318,97528***
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	***1 314,32074***	***191,59115***	***47,73543***	***215,21559***	**1 768,86291**

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг" _____ С.В. Дрожжина

М.П.

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

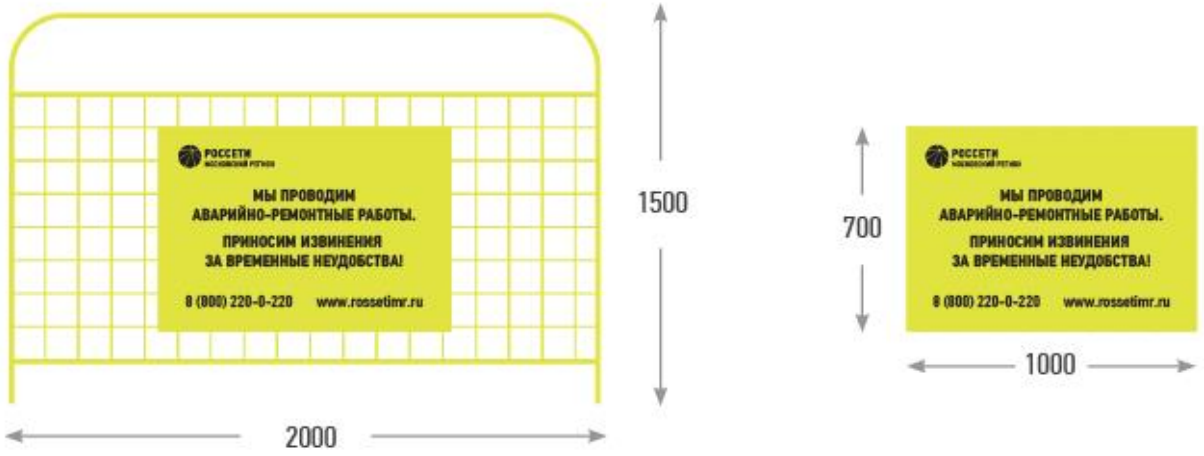

СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное заграждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина

РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)





ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).

Директор по внешним коммуникациям Л.В. Душеина
